目录

1 工程概述 1
1.1 隧道概况 1
1.2 隧道运营概况 2
1.3 隧址区近 10 年降雨、气温气候环境的变化规律 2
1.4 设计施工风险排查 3
1.4.1 隧道风险区段 3
1.4.2 隧道水害风险 4
1.5 系统监测指标 5
1.6 测点布设参考示意图 7
1.7 参考依据 10
2 监测数据总结 11
2.1 数据总结 11
2.1.1 变形监测 11
2.1.2 受力监测 11
2.1.3 环境监测 12
2.2 总体评价 12
3 变形监测 14
3.1 GNSS 数据 14
3.2 机器视觉数据 17
3.3 激光测距仪 26
4 受力监测 92
4.1 应变 92
4.2 水压力 128
5 环境监测 130
5.1 气象 130
5.2 温湿度 133

5.3 水流量 137
5.4 pH 139

1 工程概述

1.1 隧道概况

隧道为一座上下行分离的单向双车道分离式隧道，位于莆炎高速井睦段，于2013 年 10 月通车运营，设计时速 80km/h。隧道断面采用曲墙式三心圆拱，复合及明洞衬砌结构，进口洞门为削竹式，出口洞门为削竹式，隧道内设沥青混凝土路面。左洞起讫位置为 ZK658+501~ZK665+342，长 6841.0 米，右洞起讫位置为YK658+480~YK665+339，长 6859.0 米，属特长隧道。

图 1.1-1 隧道

技术标准及有关技术参数：

(1)设计荷载：公路-I 级；

(2)隧道净宽 10.25m:0.75（检修道）+0.50（侧向宽度）+2×3.75（车道宽度）+0.75（侧向宽度）+0.75（检修道）；

(3)隧道净高：5.0m；

(4)设计速度：80km/h；

(5)检修道净高 2.5 米，步道高 0.4 米。

1.2 隧道运营概况

隧道于 2013 年开通运营，距今为止已开通运营 11 年。隧道左洞运营桩号为ZK658+501~ZK665+342，长度 6841m，右洞运营桩号为 YK658+480~YK665+339，长度 6859m。自隧道贯通以来，管养单位按照相关要求定期对隧道开展定期检测工作，近 3 次隧道定期检测结果如下：

（1）《2019 年江西省井冈山至睦村高速公路隧道定期检测报告》：该隧道左洞土建结构技术状况评分 JGCI=73.25，土建结构评定为 2 类；右洞土建结构技术状况评分 JGCI=74.0，土建结构评定为 2 类；故隧道土建结构总体评定等级为2 类。其他工程设施结构技术状况评分 QTCI=93，等级评为 1 类。

（2）《2022 年江西省井冈山至睦村高速公路隧道定期检测报告》：该隧道左洞土建结构技术状况评分 JGCI=72.0，土建结构评定为 2 类；右洞土建结构技术状况评分 JGCI=73.5，土建结构评定为 2 类；故隧道土建结构总体评定等级为2 类。其他工程设施结构技术状况评分 QTCI=93.50，等级评为 1 类。

（3）《2024 年江西省井冈山至睦村高速公路隧道定期检测报告》：该隧道左洞土建结构评定为 2 类；右洞土建结构评定为 2 类；故隧道土建结构总体评定等级为 2 类。其他工程设施结构技术状况评分 QTCI=92.8，等级评为 1 类。

1.3 隧址区近 10 年降雨、气温气候环境的变化规律

井冈山市地处江西省西南部，位于赣湘两省交界的罗霄山脉中段。井冈山属中亚热带季风湿润型气候，受东亚季风环流控制，四季分明，雨量充沛，雨热同季等特点。冬天因四周茂密森林阻击寒流，虽冷但少严寒；盛夏山高气温低，虽热而无酷暑。偏南风频率随海拔升高而升高，偏北风频率随海拔升高而减小。地势西南高、东北低，对西北冷风有阻滞作用。年平均气温为 14.2℃左右，各月平均气温中 1 月份最冷，平均温度 3.2℃；7 月份最热，平均气温仅为 23.9℃，极端最高温度 34.8℃。四季气温春秋季长，夏冬季短。采用候平均温度低于 10℃作为冬季开始，高于 22℃时为夏季，10℃-22℃为春、秋季的划分方法，井冈山春季和秋季时间比其他地区均长，而夏季和冬季比他地区短。年平均降雨量约为 1856.3 毫米，年平均降雨日 213 天。雨量春夏相

对多于秋冬，地势越高降雨量越大、越均衡，海拔越高越不容易发生水旱灾害。该地区近 10 年逐月降雨量和温度变化情况如下图所示。

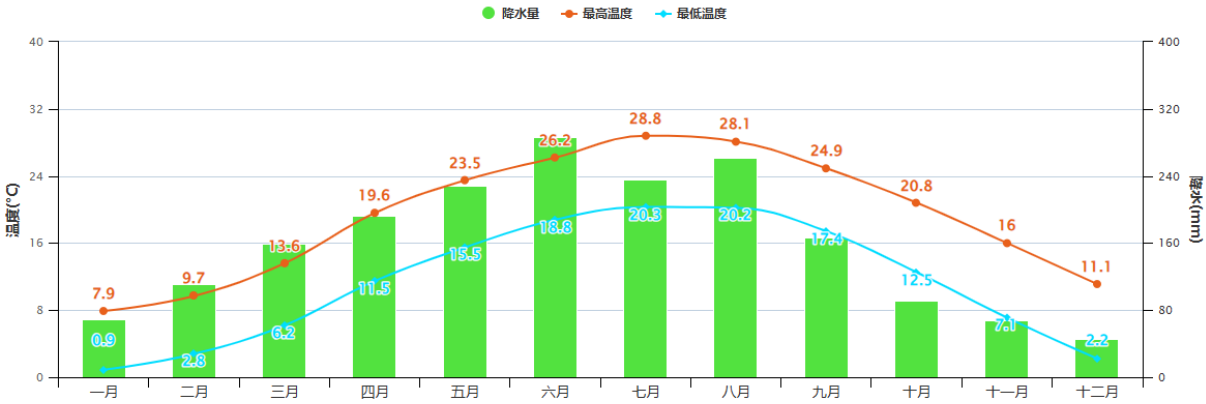

图 1.3-1 井冈山市最近 10 年逐月温度、降雨变化情况

1.4 设计施工风险排查

1.4.1 隧道风险区段

（1）隧道围岩工程地质稳定性评价

1）隧道东入口段（K658+467~K658+667）

本段围岩组成主要为浅灰色强风化砂岩，厚度在 20 米以上，岩体风化呈胶结土状，强风化为碎裂结构，岩性软，透水性好，抗冲刷能力差，围岩分级综合为 V 级。里程 K658+572~K658+607 为一冲沟，冲沟呈南北向，与隧道轴线相交约呈 90 度，冲沟最低处高程与隧道洞身相距约 10m，开挖时易坍塌且出现明洞现象，沟内常年有水，边沟水位随季节变化较大。

2）隧道洞身段（K658+767~K665+197）

隧道洞身的稳定性主要与其围岩级别有关，不同级别的围岩对洞身稳定性的影响程度不一样，同时一些断层构造破碎带、裂隙带以及地下水发育程度均会对其产生影响。由于受地质构造的影响，区内发育有钻孔 9 构造破碎带 2 条，钻孔 10 构造破碎带 2 条、钻孔 11 构造破碎带 1 条、钻孔 12 构造破碎带 2 条、钻孔 13 构造破碎带 4 条、钻孔 15 构造破碎带 1 条，构造破碎带中其岩体极破碎，呈裂散体结构，围级别为 IV-V，其洞室稳定性极差，隧道洞身区地下水非常丰富。

3）隧道西出口段（K665+197~K665+417）

隧道出口段 K665+197~K665+417 位于花岗岩丘陵山体，山势较缓，山体自然斜

坡为25~35°左右，岩体风化呈土状，为散体结构，透水性好，抗冲刷能力差，围岩分级综合为V级。

根据专项调查结果，隧道存在多个风险区段。构造破碎带：ZK659+446~ZK659+546、ZK659+896~ZK660+046、ZK662+471~ZK662+571、ZK662+971~ZK663+146、ZK663+746~ZK663+996、YK659+442~YK659+542、YK659+892~YK660+017、YK662+467~YK662+567、YK662+967~YK663+142、YK663+767~YK663+992等区段，岩体极为破碎，呈碎块状，施工中易坍塌。强风化区段：ZK658+471~ZK658+671、YK658+460~YK658+667、ZK665+236~ZK665+571、YK665+242~YK665+367等强风化花岗岩、砂岩区段，裂隙发育，岩体破碎，稳定性差。这些部位由于地质条件复杂、施工难度大等因素，容易出现病害和安全隐患。因此，需要加强对这些部位的监测工作，确保其结构安全和运营稳定性。

（2）施工期异常部位与薄弱部位信息

1）由于围岩突变造成出口右洞YK663+467-YK663+485段出现大塌方，YK663+467-YK663+524段原设计为Ⅲ级围岩，2012年9月29日发生塌方进行变更，按V级围岩参数进行支护。根据塌方处理方案第一条，YK663+524-YK663+443采用钢筋混凝土，衬砌钢筋参照S5设计参数，二衬厚度不小于35cm。

2）左洞ZK659+210~ZK659+222.5段围岩为中风化砂岩，裂除较发育，基岩裂隙水量较丰富，设计图施工过程中发现坍方，塌方工程量一共1549.38m^3，断面最大塌方面积为193.63m^2，位于ZK5+898断面。经过多方现场考察，决定变更，二衬厚度为50cm。

1.4.2 隧道水害风险

隧道主要为基岩裂隙水，水量大多较贫乏，呈点滴状。但有少量区段基岩水量较丰富，以淋雨状出水。对于后期监测工作，重点关注破碎带、节理裂隙张开区域以及水量丰富区段，注意这些地方的渗漏水、水压变化等情况，同时对强风化、中风化等不同风化程度围岩与水害的关联进行持续观察。

1）地下水方面

隧址区域内地下水受地貌、地层岩性与地质构造等条件制约，依地下水的赋存条

件、水力特征划分有松散岩类孔隙水、构造裂隙水和基岩裂隙水三大类。大气降水入渗为主要补给方式，排泄方式以河水排泄、地下水径流及人工开采排泄为主。隧道区内气候温暖，湿润多雨，年平均降雨量充足，即区域地下水补给来源充沛。基岩山区地下水主要靠降水补给，水动力条件受地层岩性、地质构造、地貌等诸因素所左右。同时根据对隧道区内的工程地质调查和访问，在隧道区内，山间冲沟的沟底和山间洼地地下水露头，一般四季均有涌水，水量较大。

2）地表水方面

桩号为 K665+327m 处横跨一废弃鱼塘，面积约达 12m^2，鱼塘内覆盖淤泥，层厚不均，0.50~0.90m。K665+347 米处有一水溪由北向南蜿蜒流经路线区内，水量较大，水流较急，河水主要来源于山间地下水。线路以南为山间沟谷，地表季节性积水，为主要水稻种植区，地势由北向南倾斜。以南约 150m 处为一水溪，水溪流向由东向西平行线路，常年流水，水流量随季节变化较大。

1.5 系统监测指标

G1517 莆炎高速井冈山隧结构道监测项目监测内容主要包括：隧址区气候环境、隧道洞口段地表水平位移、隧道衬砌结构、隧道洞内环境及其它等。

表 1.5-1 隧道监测项

序号	监测对象	监测内容	监测设备	设备数量	监测断面
1	隧址区气候环境	气象观测	气象站	2	ZK658+005、YK665+855
2	隧道洞口段	边（仰）坡地表水平位移与竖向位移	GNSS	4（含基点）	隧道进口左右洞口边坡
		视频监控	高清摄像机	4	隧道进出口
3	隧道衬砌结构（渗漏水、裂缝、厚度不足及背后空洞）	变形监测（净空收敛、拱顶下沉）、受力监测（衬砌外水压力、衬砌表面应力）	激光测距仪	144	ZK659+010、ZK659+036、ZK659+180、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK659+266、ZK659+290、ZK659+370、ZK659+390、ZK659+410、ZK660+600、ZK660+620、ZK660+540、ZK661+565、ZK661+640、ZK661+670、ZK661+690、ZK661+710、ZK663+380、ZK663+400、ZK663+420、ZK663+450、ZK663+860、ZK663+880、ZK663+900、

序号	监测对象	监测内容	监测设备	设备数量	监测断面
					ZK663+920、ZK663+940、ZK663+960、ZK663+980、ZK664+220、ZK664+240、ZK664+330、ZK664+915、ZK664+935、ZK664+960、YK658+740、YK658+765、YK658+830、YK658+850、YK658+960、YK658+980、YK659+000、YK659+020、YK659+040、YK659+060、YK659+080、YK659+100、YK659+150、YK659+250、YK659+270、YK659+290、YK659+310、YK659+550、YK659+570、YK659+620、YK659+680、YK661+640、YK661+680、YK661+710、YK661+730、YK661+810、YK661+840、YK662+450、YK662+500、YK662+550、YK662+730、YK662+750、YK662+770、YK664+710、YK664+730、YK664+750 沉降、收敛监测
			机器视觉测量仪	2	ZK663+720、ZK663+740、ZK663+760、ZK663+780、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、沉降、收敛监测
			靶标	24	
			微波雷达	12	ZK659+465、ZK659+485、ZK659+505、ZK659+525、ZK659+545、ZK659+565 沉降、收敛监测
			振弦式应变计	75	ZK659+180、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK661+640、ZK661+670、ZK661+690、ZK661+565、ZK663+450、ZK663+720、ZK663+740、ZK663+760、ZK663+780、YK659+040、YK659+060、YK659+080、YK659+100、YK659+150、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、YK661+680、YK661+710、YK661+730 应变监测
			渗压计	8	ZK659+206、ZK659+266、ZK661+665、YK659+020、YK659+165、YK659+210、YK659+270、YK661+707 水压力监测

序号	监测对象	监测内容	监测设备	设备数量	监测断面
4	隧道洞内环境	隧道内温湿度、排水量、视频监控、PH 值	温湿度传感器	6	ZK659+250、ZK661+670、ZK663+880、YK659+040、YK661+750、YK664+730 温湿度监测
			高清摄像机	4	ZK659+190、ZK663+780、YK658+970、YK659+320 视频监测
			PH 值传感器	8	ZK659+206、ZK659+266、ZK661+665、YK659+020、YK659+165、YK659+210、YK659+270、YK661+707 PH 值监测
			流量计	4	ZK658+501、ZK665+342、YK658+480、YK665+339 水流量监测

1.6 测点布设参考示意图

（1）衬砌应变

实时监测二衬结构受力变化状况，为判断二衬稳定性提供数据资料。在隧道的边墙、拱腰、拱顶、中隔墙与拱部交接处布置测点进行衬砌内表面应变监测，单洞每个布设 3 个测点位于拱顶及拱腰，横断面测点布设方式如下图所示。

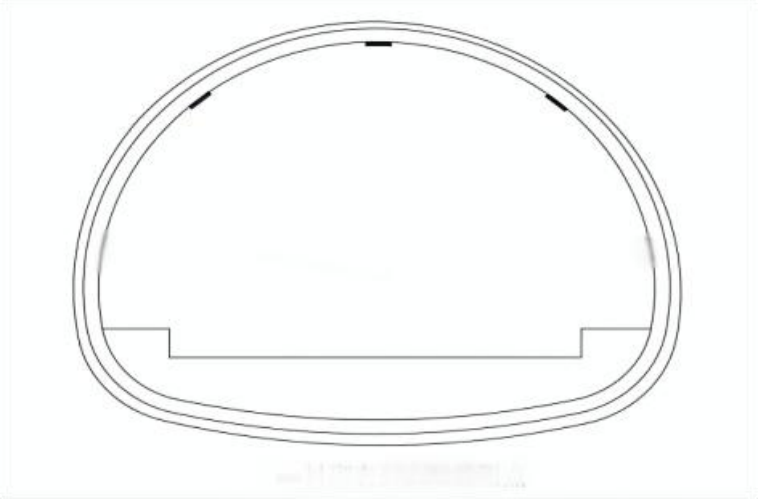

图 1.6-1 隧道衬砌横断面应变测点布置

（2）净空收敛及拱顶下沉

实时监测富水段、断层段结构的线形变化状况，为判断二衬稳定性提供数据资料。在隧道的拱腰、拱顶处布置测点进行衬砌内周边收敛及拱顶下沉监测，使用激光测距

仪在一个监测断面布设 2 个测点、2 块反光板；使用机器视觉测量仪监测在隧道断面布设拱顶和拱腰 3 个横断面测点。同时，项目创新性地采用机器视觉设备，进行隧道全天候变形监测。

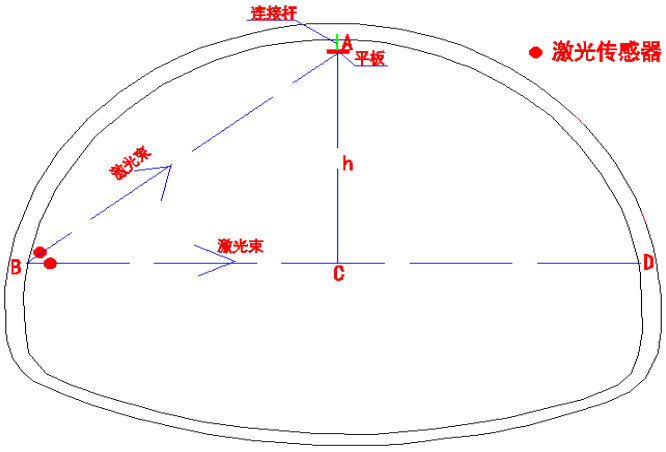

图 1.6-2 隧道衬砌横断面周边收敛及拱顶下激光测距仪点布置

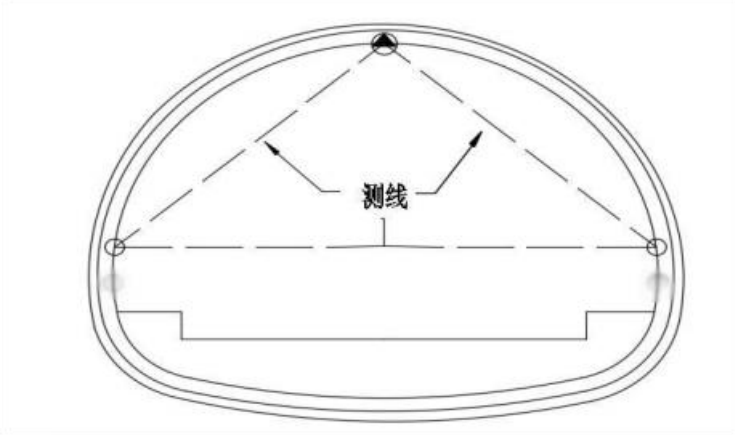

图 1.6-3 隧道衬砌横断面周边收敛及拱顶下沉靶标布置

（3）衬砌背后水压

隧道隐蔽工程多，建设中难免存在衬砌背后空洞，衬砌厚度不足等缺陷，衬砌背后空洞与高透水压力的共同作用，改变了衬砌的受力状态，导致结构原本良好的受力状况恶化，进而可能造成衬砌的开裂破损。每渗漏水严重处布设 1 个测点。

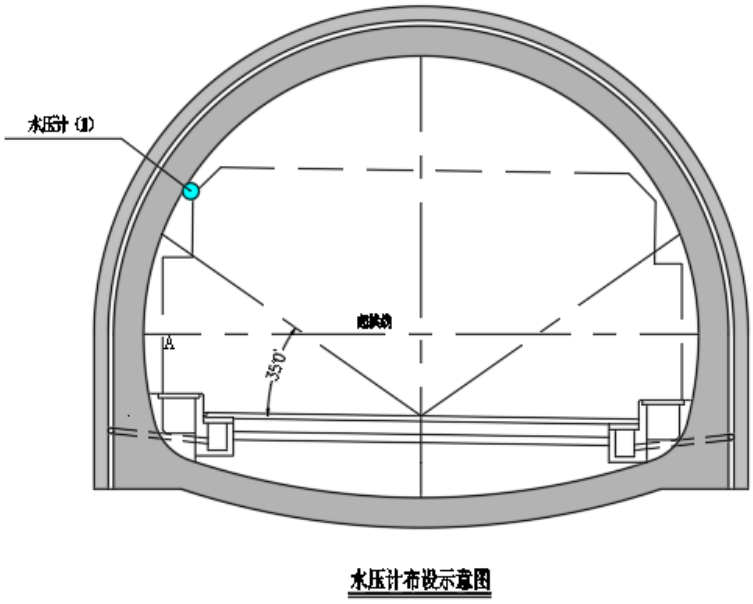

图 1.6-4 衬砌背后水压测点布置

（4）边沟水位

对于年代久且渗漏水问题较为突出的隧道，除衬砌背后水压监测背后水位和衬砌受力状态，还需对整座隧道的洞内排水系统的运行情况进行监测和评估，同时起到隧道内水位监测目的。出水洞口两侧边沟各布设 1 个测点。

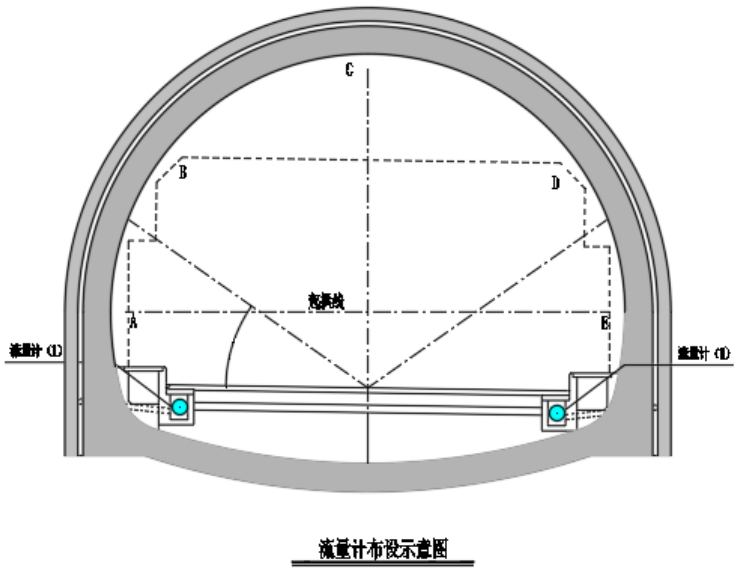

图 1.6-5 洞口边沟水位测点布置

1.7 参考依据

（1）《交通运输部办公厅关于印发〈进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作实施方案（2024-2030 年）〉的通知》（交办公路[2024]26 号）；

（2）《交通运输部公路局关于印发在役公路桥梁隧道结构监测系统 2024-2025 年建设清单的函》（交公便字[2024]271 号）；

（3）《公路长大隧道结构监测系统建设技术指南》；

（4）《在役公路隧道长期监测技术指南》（T/CHTS10021-2020）；

（5）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

（6）《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；

（7）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

（8）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

（9）《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》（JTG 3370.1-2018）；

（10）《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70/2-2014）；

（11）《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（12）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（13）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（14）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（15）《公路数据库编目编码规则》（JT/T 132-2014）

（16）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）；

（17）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

（18）隧道历年定期检查报告；

（19）隧道相关施工图、竣工图纸、运营养护资料等；

2 监测数据总结

隧道结构健康监测系统试运行期间（2025 年 11 月至 2026 年 1 月），各项监测指标运行稳定，数据采集连续、有效。通过对各监测项数据的整理与分析，得出以下结论：

2.1 数据总结 2.1.1 变形监测

GNSS 地表位移监测：隧道洞口边坡各监测点水平位移（X、Y 方向）变化幅度较小，极差均在 6mm 以内，表明洞口边坡在试运行期间整体稳定性良好。竖向位移（Z方向）变化相对显著，左洞洞口边坡（SPB-ZK658+515-DK-01）最大抬升达 11.4mm，但变化过程平稳，未发现突变或持续单向发展趋势。

机器视觉位移监测：左洞 ZK663+760 与 ZK663+780 断面拱顶及拱腰位移变化幅度较大，部分测点 X 方向极差超过 60mm，Y 方向极差接近 50mm，该区域（左洞 ZK663+760～ZK663+780）测点极差显著高于其他断面，需持续关注其长期发展。其余各监测断面位移变化幅度相对较小，整体处于可控范围。

激光测距仪（净空收敛与拱顶下沉）：各监测断面拱顶沉降及拱腰收敛变化值总体较小，多数断面极差在 10mm 以内。部分断面（如 ZBW-ZK663+900-YGY-01、ZBW-ZK664+960-YGY-01 等）距离-温度相关系数较高（大于 0.8），表明变形受温度影响显著，结构处于弹性工作状态。

2.1.2 受力监测

衬砌结构应变：各测点应变值整体处于稳定波动状态，未出现急剧增大或减小的趋势。大部分测点应变-温度相关系数绝对值较高，表明应变响应主要受温度变化影响。其中，右洞 YK659+100 左拱腰结构（BML-YK659+100-ZGY-01）、左洞 ZK663+740 左拱腰结构（BML-ZK663+740-ZGY-01）应变极差较大，分别为 226.71με、190.17με，且应变-温度呈强负相关（相关系数分别为-0.9441、-0.807），表明该部位受温度影响显著，其余断面应变极差值均小于 120με，结构受力状态稳定。

衬砌背后水压力：各渗压计测值稳定，水压力均值维持在 16～27kPa 之间，各测

点变化幅度较小，极差普遍在 1～5kPa 之间。监测期间未见水压力异常波动或持续升高现象，表明衬砌背后地下水渗流状态基本稳定，排水系统工作正常。

2.1.3 环境监测

气象：试运行期间，隧址区气温在-3.1℃至 25.8℃之间波动，整体气候条件平稳。降雨以零星小雨和小雨为主，累计小雨次数分别为 166 次（YK665+835）和 135 次（ZK658+005），未出现中雨及以上强度降雨。洞内水流量数据与降雨事件呈现良好响应关系，2025 年 11 月 8 日降雨峰值后，各洞口流量均出现小幅上升，表明洞内排水系统对降雨补给反应敏感。

温湿度：隧道内温度变化幅度小于洞外，且受洞外气温影响存在一定滞后性。洞内湿度均值在 44.86%～67.25%之间，温湿度相关系数普遍较低，表明湿度变化受温度直接影响有限。

水流量：各洞口边沟水流量变化平稳，与降雨事件关联性较强。左洞 ZK658+501 洞口流量均值约 2.29 L/s，显著高于其他洞口，可能与上游汇水面积较大或地下水补给更为充沛有关。流量-温度相关系数在 0.30～0.52 之间，表明流量变化受温度影响的间接作用有限，主要受降雨补给控制。

pH 值：监测断面地下水 pH 值大部分在 7～10 之间，呈弱碱性至碱性。其中左洞 ZK659+266 断面 pH 值波动极大（极差 3.49），且最大值达 12.03，呈强碱性；该断面水压力也表现出相对较大的波动（极差 2.7kPa），需关注该区段地下水化学性质对衬砌结构的潜在侵蚀风险。其余断面 pH 值较为稳定。

2.2 总体评价

试运行期间，隧道结构健康监测系统运行稳定，数据有效。隧道各监测断面的变形、受力及环境指标均未出现异常突变或超限情况，结构整体处于安全、可控状态。

监测数据显示，隧道结构的响应与环境因素（尤其是温度、降雨）密切相关。左洞 ZK663+700～ZK663+800 区段的位移与应变变化幅度相对较大，但主要呈现周期性波动特征，未见不利发展趋势。右洞 YK659+100 断面应变值相对较高，但同样以温度主导的弹性响应为主。

后续应持续关注以下重点：

1. 左洞 ZK663+760～ZK663+780 区段的变形发展；

2. 右洞 YK659+100 及左洞 ZK663+740 断面应变变化趋势；

3. 左洞 ZK659+266 断面地下水 pH 值变化；

4. 结合降雨事件，持续分析洞内水流量与降雨的响应规律，评估排水系统的长期有效性。

3 变形监测

3.1 GNSS 数据

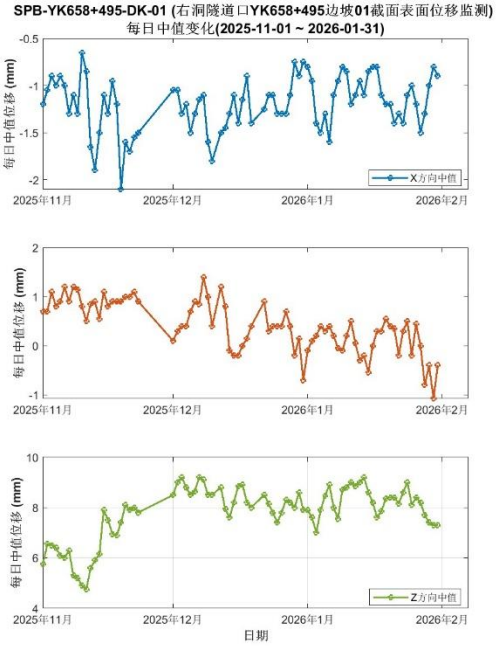

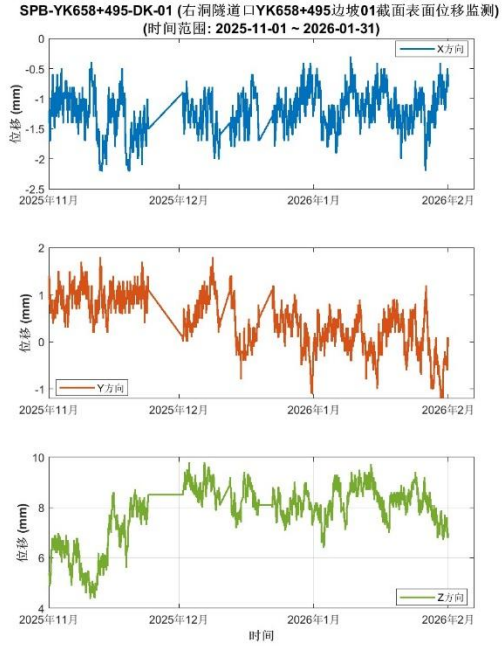

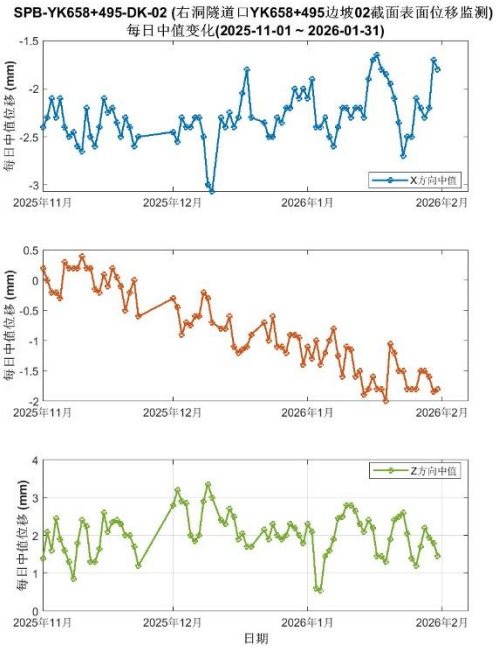

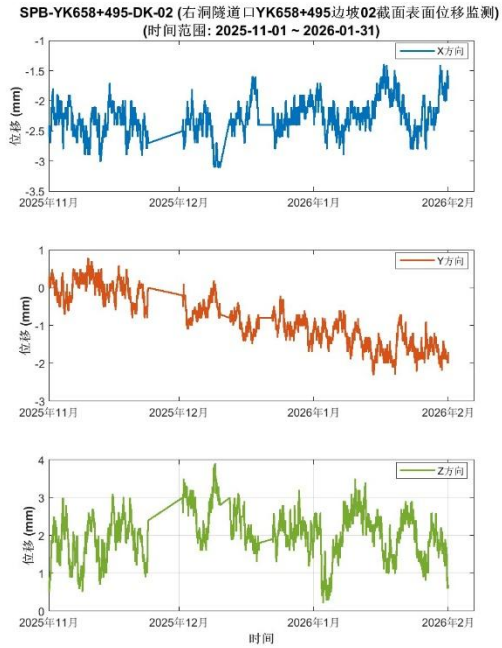

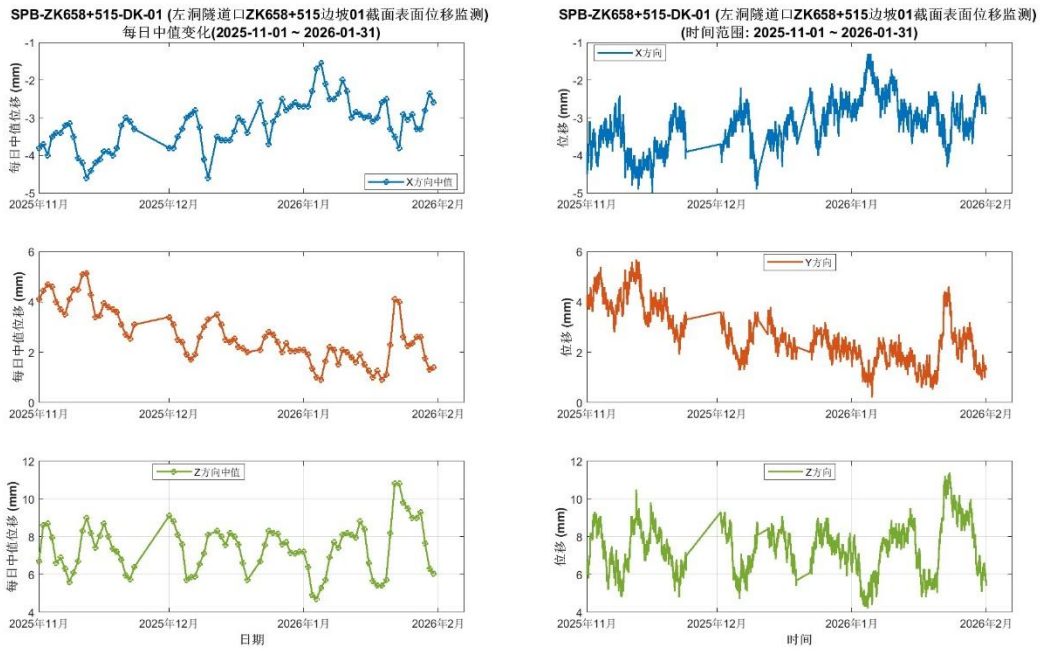

图 3.1-1 边坡截面表面位移时程曲线图

表 3.1-1 边坡截面表面位移数据统计表

测点编号	SPB-YK658+495-DK-01	SPB-YK658+495-DK-02	SPB-ZK658+515-DK-01
测点名称	右洞隧道口 YK658+495 边坡 01 截面表面位移监测	右洞隧道口 YK658+495 边坡 02 截面表面位移监测	左洞隧道口 ZK658+515 边坡 01 截面表面位移监测
X 最大值/mm	-0.3	-1.4	-1.3
X 最小值/mm	-2.2	-3.1	-5
X 极差/mm	1.9	1.7	3.7
X 最大值时间	2026-01-09 13:00:00	2026-01-17 04:00:00	2026-01-04 19:00:00
X 最小值时间	2025-11-12 17:00:00	2025-12-09 00:00:00	2025-11-16 02:00:00
X 中位数/mm	-1.2	-2.27	-3.16
Y 最大值/mm	1.8	0.8	5.7
Y 最小值/mm	-1.2	-2.3	0.2
Y 极差/mm	3	3.1	5.5

测点编号	SPB-YK658+495-DK-01	SPB-YK658+495-DK-02	SPB-ZK658+515-DK-01
测点名称	右洞隧道口 YK658+495 边坡 01 截面表面位移监测	右洞隧道口 YK658+495 边坡 02 截面表面位移监测	左洞隧道口 ZK658+515 边坡 01 截面表面位移监测
Y 最大值时间	2025-11-12 20:00:00	2025-11-10 01:00:00	2025-11-12 09:00:00
Y 最小值时间	2026-01-30 07:00:00	2026-01-14 17:00:00	2026-01-05 17:00:00
Y 中位数/mm	0.42	-0.85	2.63
Z 最大值/mm	9.8	3.9	11.4
Z 最小值/mm	4.4	0.2	4.2
Z 极差/mm	5.4	3.7	7.2
Z 最大值时间	2025-12-03 08:00:00	2025-12-09 06:00:00	2026-01-23 14:00:00
Z 最小值时间	2025-11-10 12:00:00	2026-01-03 05:00:00	2026-01-04 18:00:00
Z 中位数/mm	7.78	2.01	7.36

3.2 机器视觉数据

CDC-YK659+170-GD-01 (右洞YK659+170拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

CDC-YK659+190-GD-01 (右洞YK659+190拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

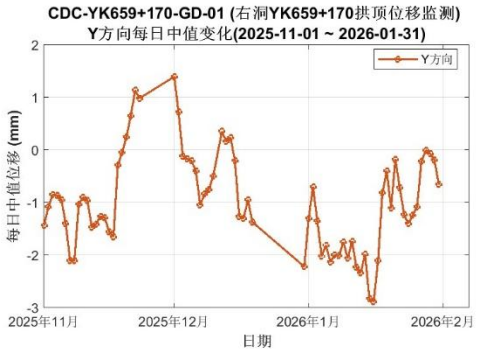
CDC-YK659+170-GD-01 (右洞YK659+170拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

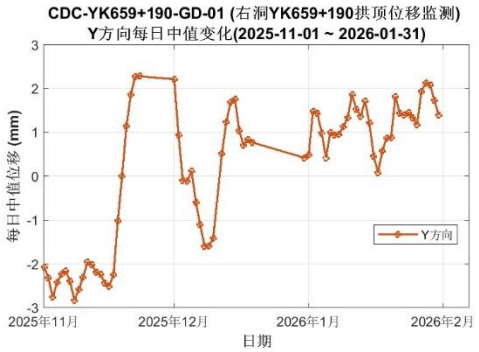
CDC-YK659+190-GD-01 (右洞YK659+190拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

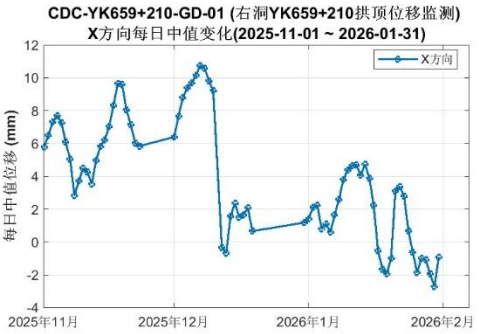
CDC-YK659+210-GD-01 (右洞YK659+210拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

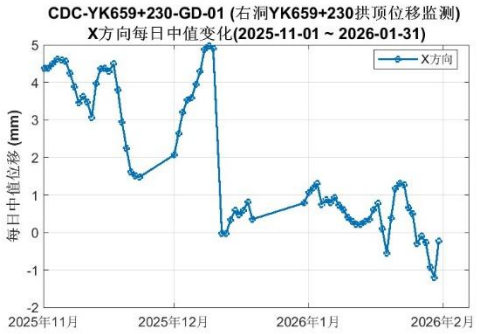
CDC-YK659+230-GD-01 (右洞YK659+230拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

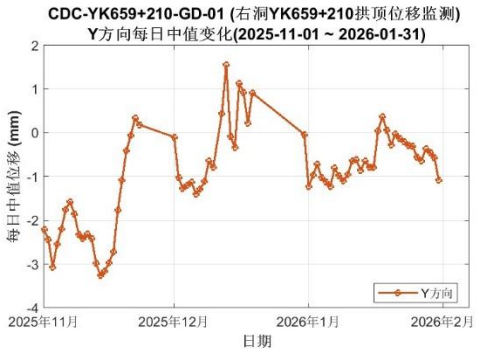
CDC-YK659+210-GD-01 (右洞YK659+210拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

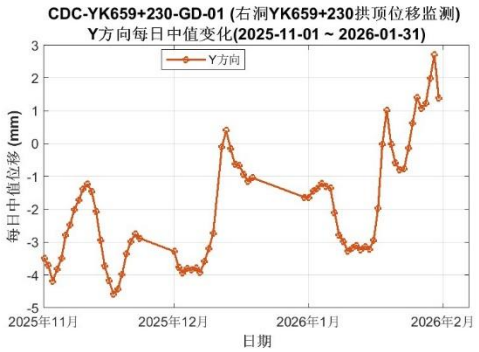
CDC-YK659+230-GD-01 (右洞YK659+230拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

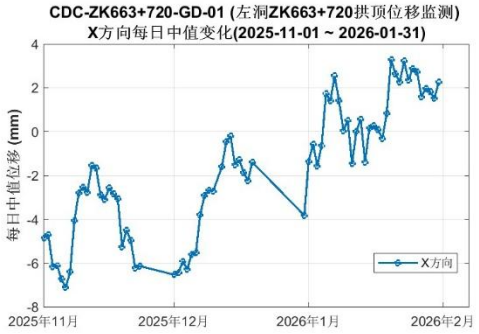
CDC-ZK663+720-GD-01 (左洞ZK663+720拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

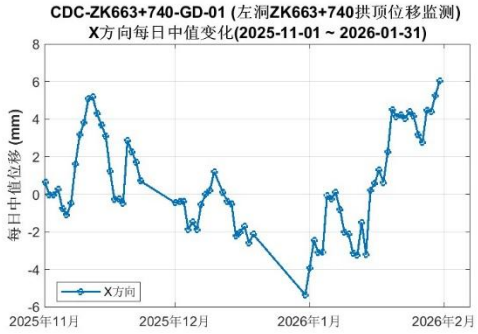
CDC-ZK663+740-GD-01 (左洞ZK663+740拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

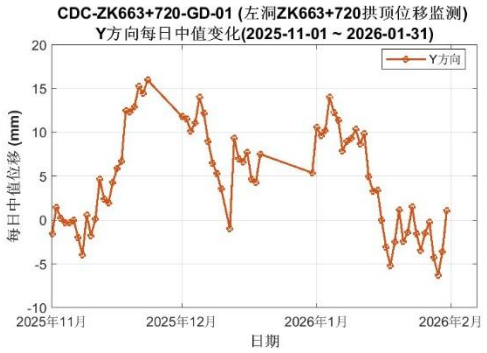
CDC-ZK663+720-GD-01 (左洞ZK663+720拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

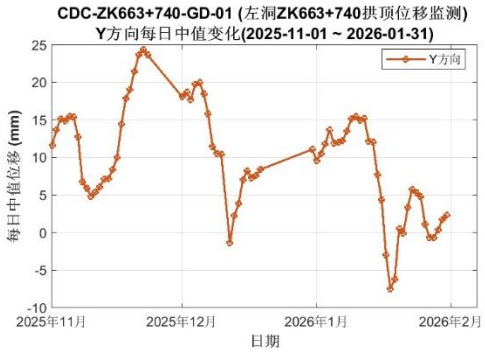
CDC-ZK663+740-GD-01 (左洞ZK663+740拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

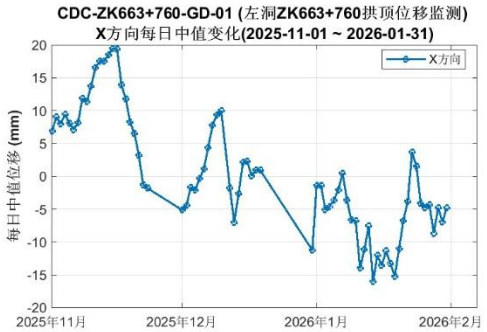
CDC-ZK663+760-GD-01 (左洞ZK663+760拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

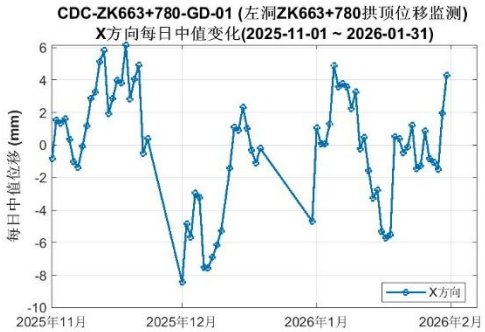
CDC-ZK663+780-GD-01 (左洞ZK663+780拱顶位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

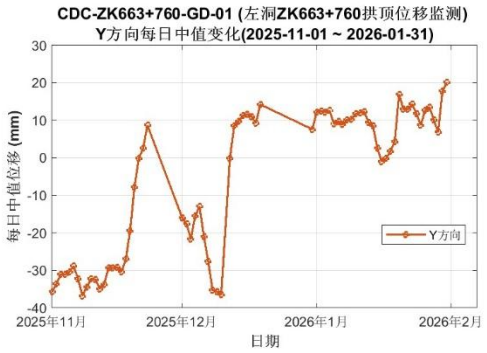
CDC-ZK663+760-GD-01 (左洞ZK663+760拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

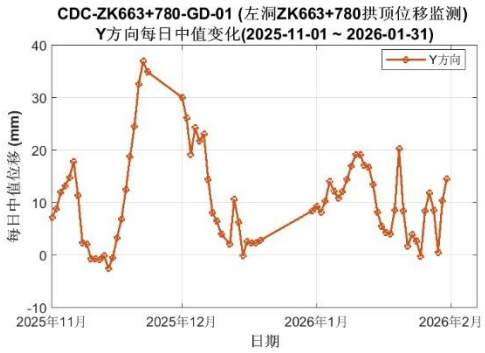
CDC-ZK663+780-GD-01 (左洞ZK663+780拱顶位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

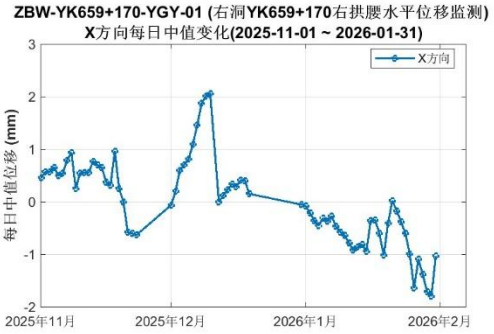
ZBW-YK659+170-YGY-01 (右洞YK659+170右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

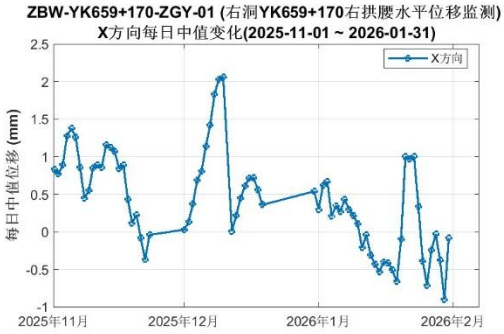
ZBW-YK659+170-ZGY-01 (右洞YK659+170右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

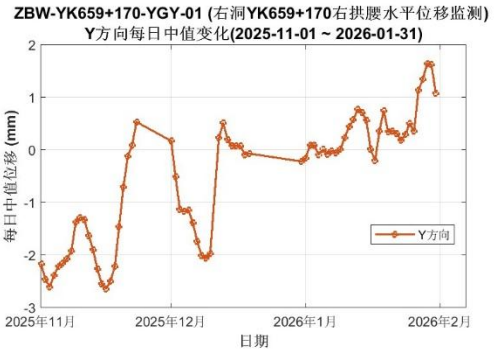
ZBW-YK659+170-YGY-01 (右洞YK659+170右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

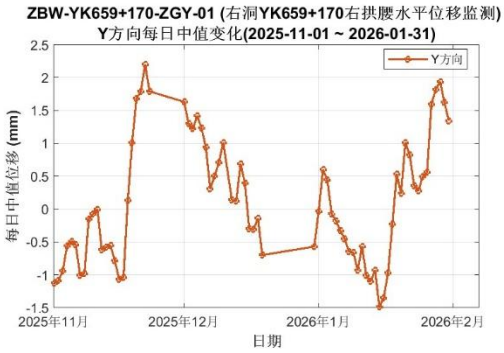
ZBW-YK659+170-ZGY-01 (右洞YK659+170右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

ZBW-YK659+190-YGY-01 (右洞YK659+190右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

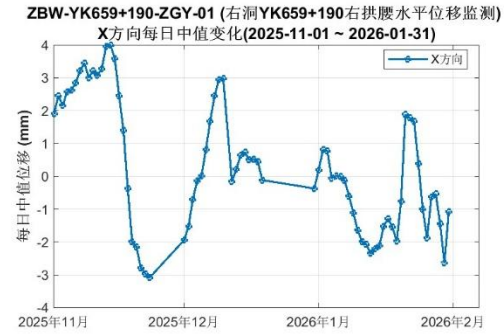
ZBW-YK659+190-ZGY-01 (右洞YK659+190右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
X方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

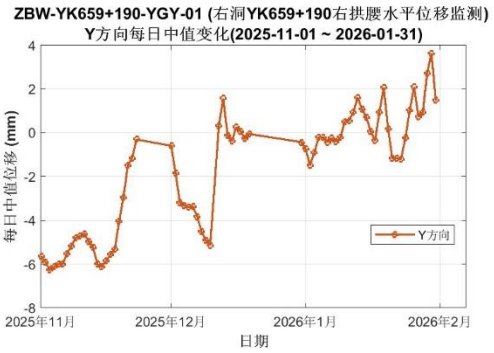
ZBW-YK659+190-YGY-01 (右洞YK659+190右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

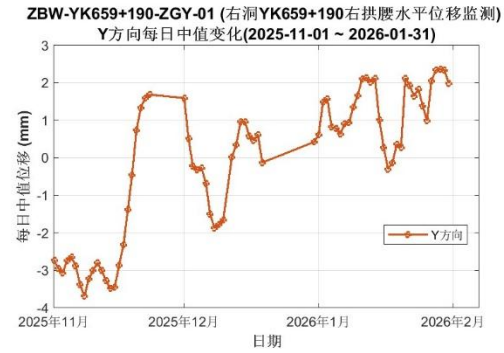
ZBW-YK659+190-ZGY-01 (右洞YK659+190右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
Y方向
每日中值位移 (mm)
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

ZBW-YK659+210-YGY-01 (右洞YK659+210右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

ZBW-YK659+210-ZGY-01 (右洞YK659+210右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

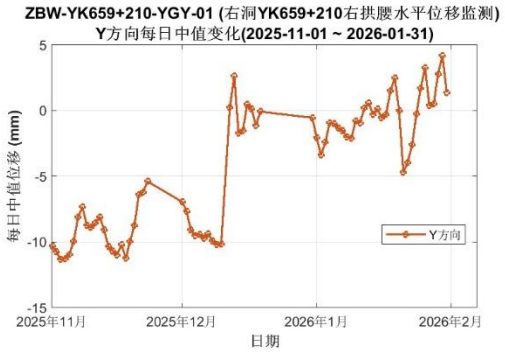
ZBW-YK659+210-YGY-01 (右洞YK659+210右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

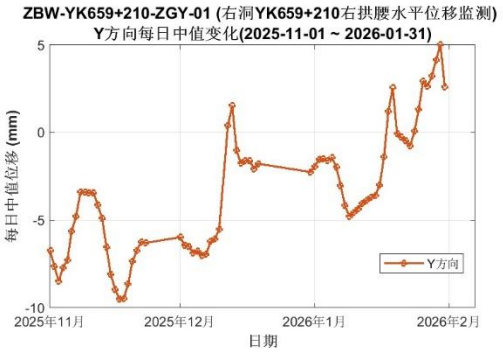
ZBW-YK659+210-ZGY-01 (右洞YK659+210右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

ZBW-YK659+230-YGY-01 (右洞YK659+230右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

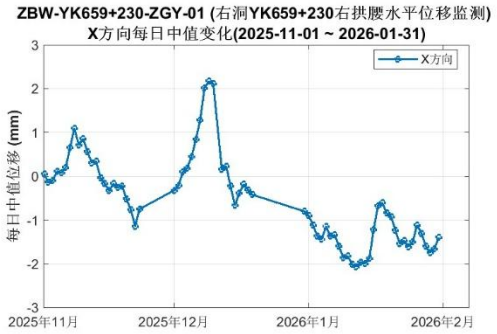
ZBW-YK659+230-ZGY-01 (右洞YK659+230右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

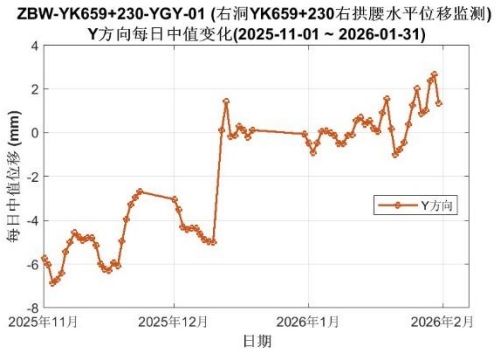
ZBW-YK659+230-YGY-01 (右洞YK659+230右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

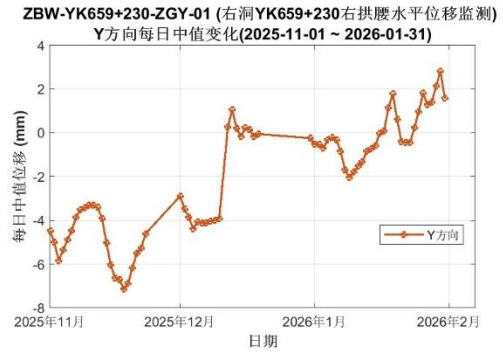
ZBW-YK659+230-ZGY-01 (右洞YK659+230右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

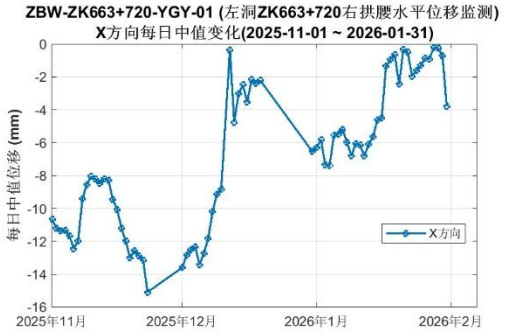
ZBW-ZK663+720-YGY-01 (左洞ZK663+720右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

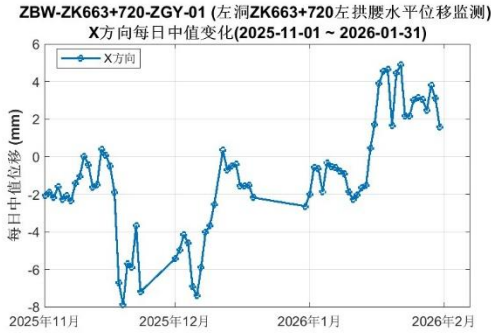
ZBW-ZK663+720-ZGY-01 (左洞ZK663+720左拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

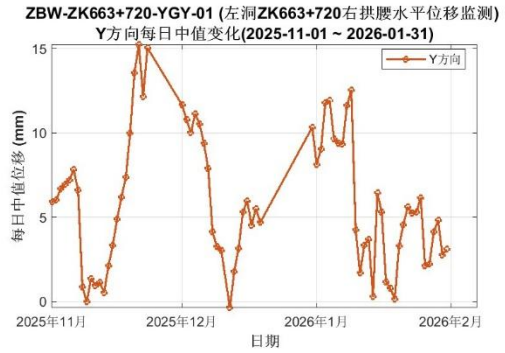
ZBW-ZK663+720-YGY-01 (左洞ZK663+720右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

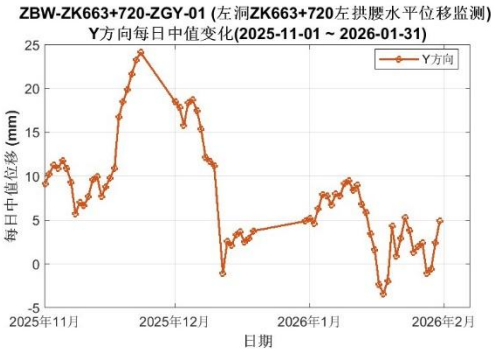
ZBW-ZK663+720-ZGY-01 (左洞ZK663+720左拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

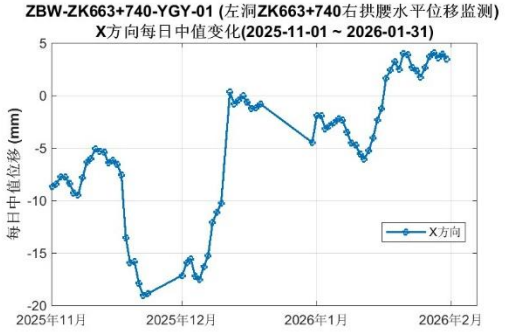
ZBW-ZK663+740-YGY-01 (左洞ZK663+740右拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

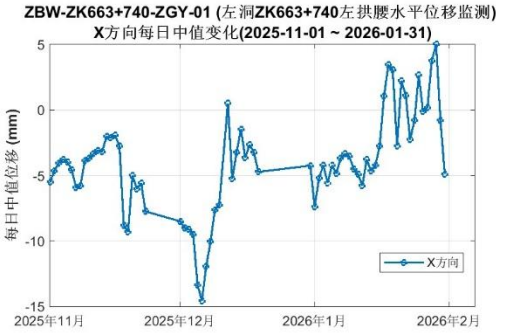
ZBW-ZK663+740-ZGY-01 (左洞ZK663+740左拱腰水平位移监测)
X方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
X方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月

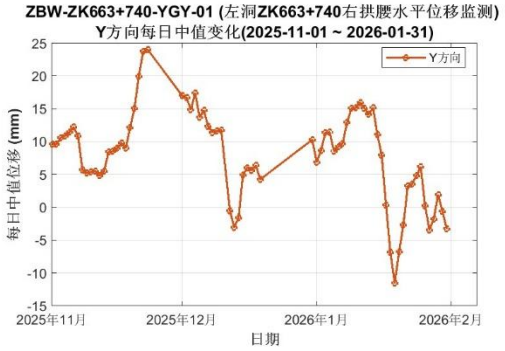
ZBW-ZK663+740-YGY-01 (左洞ZK663+740右拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

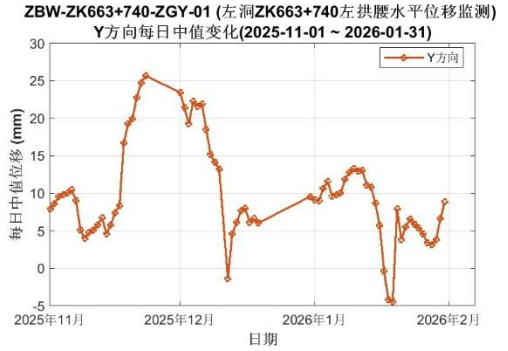
ZBW-ZK663+740-ZGY-01 (左洞ZK663+740左拱腰水平位移监测)
Y方向每日中值变化(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
每日中值位移 (mm)
Y方向
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
日期

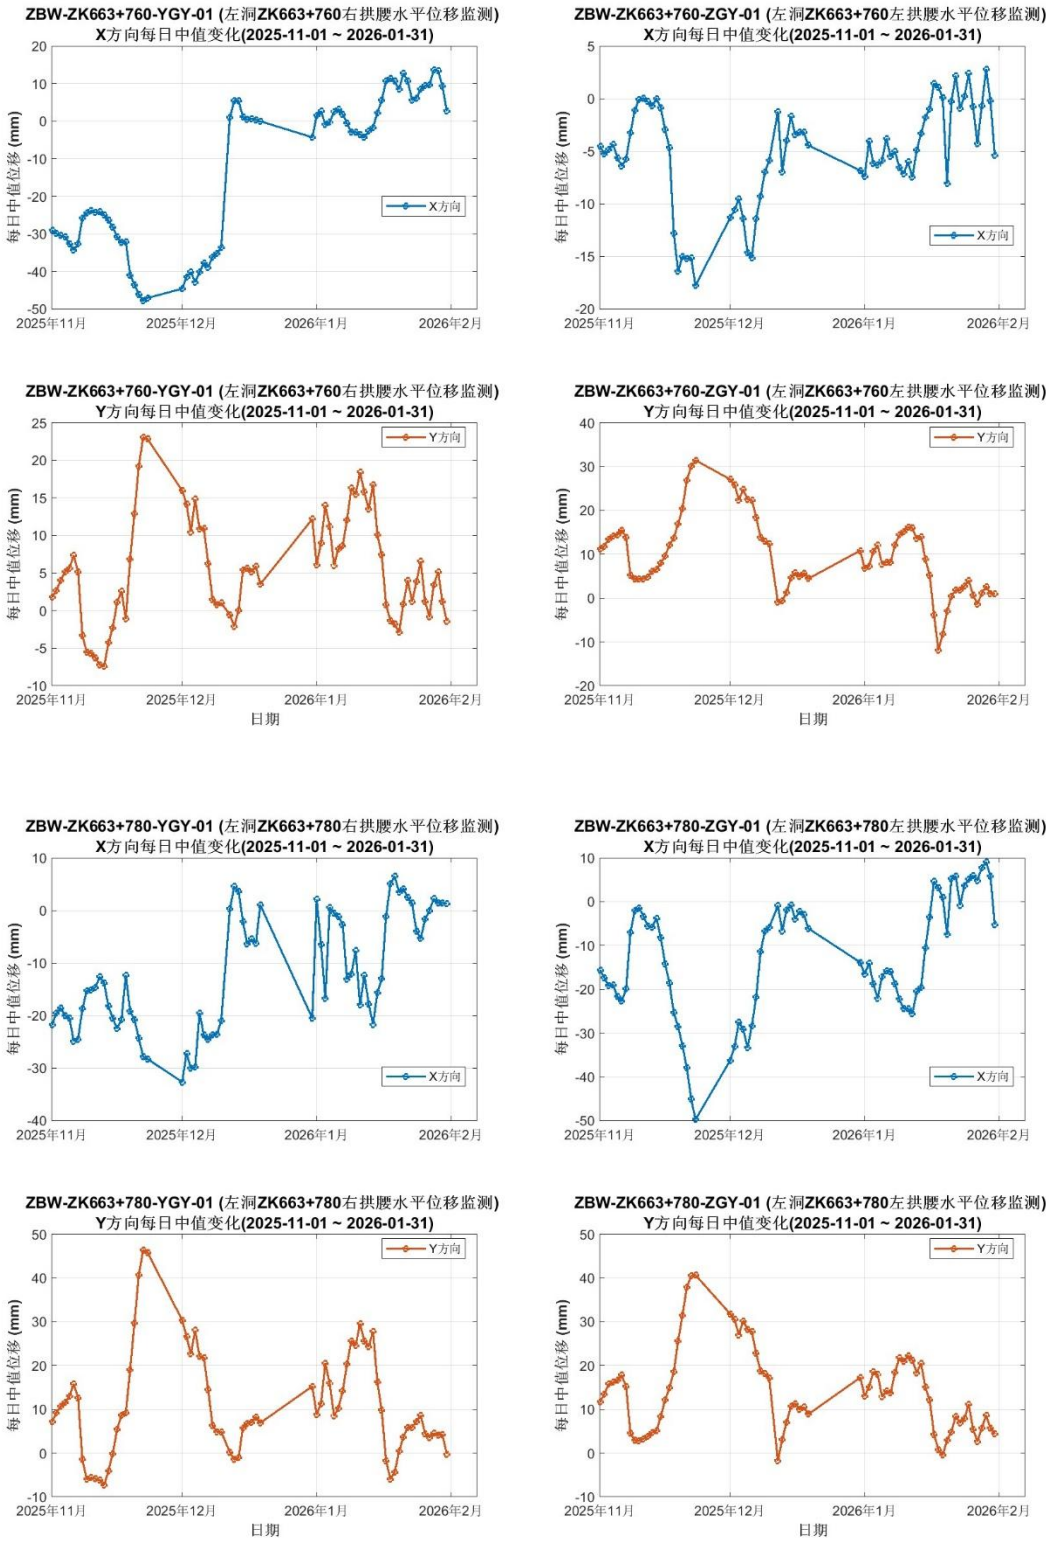

图 3.2-1 拱顶、拱腰位移时程曲线图

表 3.2-1 拱顶、拱腰位移数据统计表

测点编号	测点名称	X 最大值/mm	X 最小值/mm	X 极差/mm	X 最大值时间	X 最小值时间	X 中位数/mm	Y 最大值/mm	Y 最小值/mm	Y 极差/mm	Y 最大值时间	Y 最小值时间	Y 中位数/mm
CDC-YK659+170-GD-01	右洞 YK659+170 拱顶位移监测	4.29	-1.29	5.58	2025-12-09 14:56:53	2026-01-30 16:32:23	1.7	1.98	-3.77	5.75	2025-11-23 03:16:11	2026-01-15 15:17:22	-1.03
CDC-YK659+190-GD-01	右洞 YK659+190 拱顶位移监测	5.59	-4.35	9.94	2025-12-09 10:52:42	2026-01-30 02:01:25	1.23	4.27	-4.45	8.72	2025-11-23 03:00:54	2025-11-15 18:59:55	0.12
CDC-YK659+210-GD-01	右洞 YK659+210 拱顶位移监测	12.13	-4.14	16.27	2025-12-07 16:31:37	2026-01-30 03:46:17	3.89	2.36	-3.93	6.29	2025-12-13 00:20:57	2025-11-13 18:25:14	-0.99
CDC-YK659+230-GD-01	右洞 YK659+230 拱顶位移监测	5.32	-2.14	7.46	2025-12-08 16:02:30	2026-01-30 16:32:23	1.89	3.36	-5.07	8.43	2026-01-30 01:47:18	2025-11-19 06:05:22	-1.97
CDC-ZK663+720-GD-01	左洞 ZK663+720 拱顶位移监测	5.73	-9.07	14.8	2026-01-22 14:23:18	2025-11-06 15:39:24	-1.76	19.31	-9.52	28.83	2025-11-23 10:13:43	2026-01-29 23:40:32	4.69
CDC-ZK663+740-GD-01	左洞 ZK663+740 拱顶位移监测	7.62	-7.41	15.03	2026-01-31 11:32:44	2026-01-12 05:08:21	0.62	27.17	-10.26	37.43	2025-11-21 17:37:28	2026-01-19 09:02:11	9.79
CDC-ZK663+760-GD-01	左洞 ZK663+760 拱顶位移监测	26.93	-21.62	48.55	2025-11-16 09:50:50	2026-01-12 01:39:57	0.66	24.63	-40.62	65.25	2026-01-31 04:22:44	2025-12-10 07:21:37	-5.9
CDC-ZK663+780-GD-01	左洞 ZK663+780 拱顶位移监测	10.15	-11.81	21.96	2026-01-08 04:31:01	2025-12-01 23:03:21	-0.07	37.88	-7.49	45.37	2025-11-21 19:04:19	2025-11-14 21:27:05	10.71

测点编号	测点名称	X 最大值/mm	X 最小值/mm	X 极差/mm	X 最大值时间	X 最小值时间	X 中位数/mm	Y 最大值/mm	Y 最小值/mm	Y 极差/mm	Y 最大值时间	Y 最小值时间	Y 中位数/mm
ZBW-YK659+170-YGY-01	右洞 YK659+170 右拱腰位移监测	2.47	-2.5	4.97	2025-12-09 15:49:19	2026-01-30 02:20:35	-0.01	2.14	-2.96	5.1	2026-01-30 09:18:45	2025-11-16 03:35:46	-0.53
ZBW-YK659+170-ZGY-01	右洞 YK659+170 右拱腰位移监测	2.42	-1.32	3.74	2025-12-09 15:13:01	2026-01-30 16:31:22	0.43	3.01	-2.24	5.25	2025-11-22 06:10:54	2025-11-16 16:08:50	0.09
ZBW-YK659+190-YGY-01	右洞 YK659+190 右拱腰位移监测	5.31	-7.36	12.67	2025-11-08 04:57:33	2025-12-19 03:54:05	0.1	5.06	-6.81	11.87	2026-01-30 16:22:19	2025-11-15 19:07:59	-1.83
ZBW-YK659+190-ZGY-01	右洞 YK659+190 右拱腰位移监测	4.41	-3.89	8.3	2025-11-14 07:54:28	2025-11-23 05:00:04	0.33	3.32	-4.36	7.68	2026-01-30 16:21:19	2025-11-08 05:40:03	-0.12
ZBW-YK659+210-YGY-01	右洞 YK659+210 右拱腰位移监测	10	-6.02	16.02	2025-11-08 04:59:35	2026-01-30 04:12:30	2.59	6.18	-12.74	18.92	2026-01-30 04:21:33	2025-11-18 12:55:28	-4.41
ZBW-YK659+210-ZGY-01	右洞 YK659+210 右拱腰位移监测	5.01	-3.92	8.93	2025-12-08 16:18:38	2026-01-30 02:25:38	0.73	6.5	-10.88	17.38	2026-01-30 04:04:26	2025-11-18 07:36:04	-3.45
ZBW-YK659+230-YGY-01	右洞 YK659+230 右拱腰位移监测	6.62	-3.97	10.59	2025-12-10 06:13:46	2026-01-18 15:34:49	2.08	3.55	-7.37	10.92	2026-01-30 04:22:34	2025-11-03 17:53:03	-2.06
ZBW-YK659+230-ZGY-01	右洞 YK659+230 右拱腰位移监测	2.53	-2.98	5.51	2025-12-08 16:03:31	2026-01-12 05:56:08	-0.54	3.83	-8.3	12.13	2026-01-30 04:21:33	2025-11-19 05:37:20	-2.01

测点编号	测点名称	X 最大值/mm	X 最小值/mm	X 极差/mm	X 最大值时间	X 最小值时间	X 中位数/mm	Y 最大值/mm	Y 最小值/mm	Y 极差/mm	Y 最大值时间	Y 最小值时间	Y 中位数/mm
ZBW-ZK663+720-YGY-01	左洞 ZK663+720 右拱腰位移监测	1.29	-16.4	17.69	2026-01-28 08:56:41	2025-11-23 16:40:52	-6.93	18.84	-7.44	26.28	2025-11-23 13:53:07	2026-01-09 22:26:07	5.73
ZBW-ZK663+720-ZGY-01	左洞 ZK663+720 左拱腰位移监测	6.62	-9.38	16	2026-01-22 06:34:18	2025-11-23 10:47:03	-1.11	26.4	-4.45	30.85	2025-11-23 16:46:55	2026-01-18 04:45:27	8.1
ZBW-ZK663+740-YGY-01	左洞 ZK663+740 右拱腰位移监测	6.64	-24.18	30.82	2026-01-21 23:29:23	2025-11-23 16:18:39	-5.24	28.07	-13.28	41.35	2025-11-23 21:56:05	2026-01-19 05:48:54	8.09
ZBW-ZK663+740-ZGY-01	左洞 ZK663+740 左拱腰位移监测	7.3	-15.82	23.12	2026-01-28 07:00:24	2025-12-05 18:16:43	-4.06	29.04	-8.19	37.23	2025-11-23 10:37:59	2026-01-19 07:32:38	9.84
ZBW-ZK663+760-YGY-01	左洞 ZK663+760 右拱腰位移监测	18.19	-51.77	69.96	2026-01-21 01:13:29	2025-11-23 16:19:39	-13.07	27.03	-8.97	36	2025-11-23 21:56:05	2025-11-12 23:48:15	5.43
ZBW-ZK663+760-ZGY-01	左洞 ZK663+760 左拱腰位移监测	7.6	-20.27	27.87	2026-01-22 06:01:02	2025-11-23 01:51:46	-5.11	35.71	-15.02	50.73	2025-11-23 22:13:14	2026-01-18 23:44:23	9.48
ZBW-ZK663+780-YGY-01	左洞 ZK663+780 右拱腰位移监测	21.62	-39.8	61.42	2026-01-19 11:20:09	2025-11-21 11:22:52	-11.55	47.88	-11.99	59.87	2025-11-22 05:37:37	2026-01-18 17:03:13	10.94
ZBW-ZK663+780-ZGY-01	左洞 ZK663+780 左拱腰位移监测	11.56	-52.58	64.14	2026-01-22 05:50:57	2025-11-23 16:51:57	-12.8	43.17	-4.52	47.69	2025-11-23 10:54:09	2025-12-12 23:30:34	14.24

3.3 激光测距仪

ZBW-YK658+740-YGY-01 (右洞YK658+740截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+740-YGY-02 (右洞YK658+740截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+740-YGY-01 (右洞YK658+740截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+740-YGY-02 (右洞YK658+740截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+765-YGY-01 (右洞YK658+765截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+765-YGY-02 (右洞YK658+765截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK658+765-YGY-01 (右洞YK658+765截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+765-YGY-02 (右洞YK658+765截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK658+830-YGY-01 (右洞YK658+830截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+830-YGY-02 (右洞YK658+830截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

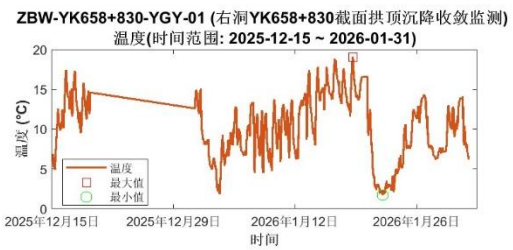
ZBW-YK658+830-YGY-01 (右洞YK658+830截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

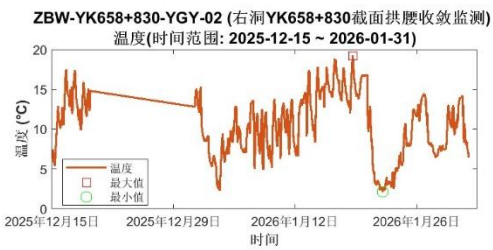
ZBW-YK658+830-YGY-02 (右洞YK658+830截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+850-YGY-01 (右洞YK658+850截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK658+850-YGY-02 (右洞YK658+850截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+850-YGY-01 (右洞YK658+850截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK658+850-YGY-02 (右洞YK658+850截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+960-YGY-01 (右洞YK658+960截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+960-YGY-02 (右洞YK658+960截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+960-YGY-01 (右洞YK658+960截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK658+960-YGY-02 (右洞YK658+960截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+980-YGY-01 (右洞YK658+980截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK658+980-YGY-02 (右洞YK658+980截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK658+980-YGY-01 (右洞YK658+980截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK658+980-YGY-02 (右洞YK658+980截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+000-YGY-01 (右洞YK659+000截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+000-YGY-02 (右洞YK659+000截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+000-YGY-01 (右洞YK659+000截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+000-YGY-02 (右洞YK659+000截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+020-YGY-01 (右洞YK659+020截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK659+020-YGY-02 (右洞YK659+020截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+020-YGY-01 (右洞YK659+020截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+020-YGY-02 (右洞YK659+020截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+040-YGY-01 (右洞YK659+040截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+040-YGY-02 (右洞YK659+040截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+040-YGY-01 (右洞YK659+040截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+040-YGY-02 (右洞YK659+040截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+060-YGY-01 (右洞YK659+060截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+060-YGY-02 (右洞YK659+060截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+060-YGY-01 (右洞YK659+060截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+060-YGY-02 (右洞YK659+060截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+080-YGY-01 (右洞YK659+080截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK659+080-YGY-02 (右洞YK659+080截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+080-YGY-01 (右洞YK659+080截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+080-YGY-02 (右洞YK659+080截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+100-YGY-01 (右洞YK659+100截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+100-YGY-02 (右洞YK659+100截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+100-YGY-01 (右洞YK659+100截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+100-YGY-02 (右洞YK659+100截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+150-YGY-01 (右洞YK659+150截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+150-YGY-02 (右洞YK659+150截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+150-YGY-01 (右洞YK659+150截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+150-YGY-02 (右洞YK659+150截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+250-YGY-01 (右洞YK659+250截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK659+250-YGY-02 (右洞YK659+250截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+250-YGY-01 (右洞YK659+250截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+250-YGY-02 (右洞YK659+250截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+270-YGY-01 (右洞YK659+270截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+270-YGY-02 (右洞YK659+270截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+270-YGY-01 (右洞YK659+270截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+270-YGY-02 (右洞YK659+270截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+290-YGY-01 (右洞YK659+290截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+290-YGY-02 (右洞YK659+290截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+290-YGY-01 (右洞YK659+290截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+290-YGY-02 (右洞YK659+290截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+310-YGY-01 (右洞YK659+310截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+310-YGY-02 (右洞YK659+310截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK659+310-YGY-01 (右洞YK659+310截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+310-YGY-02 (右洞YK659+310截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+550-YGY-01 (右洞YK659+550截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK659+550-YGY-02 (右洞YK659+550截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+550-YGY-01 (右洞YK659+550截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+550-YGY-02 (右洞YK659+550截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+570-YGY-01 (右洞YK659+570截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+570-YGY-02 (右洞YK659+570截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+570-YGY-01 (右洞YK659+570截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+570-YGY-02 (右洞YK659+570截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK659+620-YGY-01 (右洞YK659+620截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+620-YGY-02 (右洞YK659+620截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月16日
2025年12月30日
2026年1月13日
2026年1月27日

ZBW-YK659+620-YGY-01 (右洞YK659+620截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+620-YGY-02 (右洞YK659+620截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月16日
2025年12月30日
2026年1月13日
2026年1月27日
时间

ZBW-YK659+680-YGY-01 (右洞YK659+680截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK659+680-YGY-02 (右洞YK659+680截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK659+680-YGY-01 (右洞YK659+680截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK659+680-YGY-02 (右洞YK659+680截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+640-YGY-01 (右洞YK661+640截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK661+640-YGY-02 (右洞YK661+640截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+640-YGY-01 (右洞YK661+640截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK661+640-YGY-02 (右洞YK661+640截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+680-YGY-01 (右洞YK661+680截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK661+680-YGY-02 (右洞YK661+680截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+680-YGY-01 (右洞YK661+680截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+680-YGY-02 (右洞YK661+680截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+710-YGY-01 (右洞YK661+710截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK661+710-YGY-02 (右洞YK661+710截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK661+710-YGY-01 (右洞YK661+710截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+710-YGY-02 (右洞YK661+710截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+730-YGY-01 (右洞YK661+730截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+730-YGY-02 (右洞YK661+730截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+730-YGY-01 (右洞YK661+730截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK661+730-YGY-02 (右洞YK661+730截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+810-YGY-01 (右洞YK661+810截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+810-YGY-02 (右洞YK661+810截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+810-YGY-01 (右洞YK661+810截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK661+810-YGY-02 (右洞YK661+810截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+840-YGY-01 (右洞YK661+840截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+840-YGY-02 (右洞YK661+840截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK661+840-YGY-01 (右洞YK661+840截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK661+840-YGY-02 (右洞YK661+840截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+450-YGY-01 (右洞YK662+450截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+450-YGY-02 (右洞YK662+450截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+450-YGY-01 (右洞YK662+450截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK662+450-YGY-02 (右洞YK662+450截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK662+500-YGY-01 (右洞YK662+500截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+500-YGY-02 (右洞YK662+500截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+500-YGY-01 (右洞YK662+500截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK662+500-YGY-02 (右洞YK662+500截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK662+550-YGY-01 (右洞YK662+550截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+550-YGY-02 (右洞YK662+550截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+550-YGY-01 (右洞YK662+550截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+550-YGY-02 (右洞YK662+550截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+730-YGY-01 (右洞YK662+730截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+730-YGY-02 (右洞YK662+730截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+730-YGY-01 (右洞YK662+730截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+730-YGY-02 (右洞YK662+730截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+750-YGY-01 (右洞YK662+750截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+750-YGY-02 (右洞YK662+750截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+750-YGY-01 (右洞YK662+750截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK662+750-YGY-02 (右洞YK662+750截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+770-YGY-01 (右洞YK662+770截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK662+770-YGY-02 (右洞YK662+770截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK662+770-YGY-01 (右洞YK662+770截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK662+770-YGY-02 (右洞YK662+770截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK664+710-YGY-01 (右洞YK664+710截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK664+710-YGY-02 (右洞YK664+710截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK664+710-YGY-01 (右洞YK664+710截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK664+710-YGY-02 (右洞YK664+710截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK664+730-YGY-01 (右洞YK664+730截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK664+730-YGY-02 (右洞YK664+730截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK664+730-YGY-01 (右洞YK664+730截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK664+730-YGY-02 (右洞YK664+730截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-YK664+750-YGY-01 (右洞YK664+750截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-YK664+750-YGY-02 (右洞YK664+750截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-YK664+750-YGY-01 (右洞YK664+750截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-YK664+750-YGY-02 (右洞YK664+750截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+010-YGY-01 (左洞ZK659+010截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK659+010-YGY-02 (左洞ZK659+010截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+010-YGY-01 (左洞ZK659+010截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+010-YGY-02 (左洞ZK659+010截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+036-YGY-01 (左洞ZK659+036截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+036-YGY-02 (左洞ZK659+036截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+036-YGY-01 (左洞ZK659+036截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+036-YGY-02 (左洞ZK659+036截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+180-YGY-01 (左洞ZK659+180截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK659+180-YGY-02 (左洞ZK659+180截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+180-YGY-01 (左洞ZK659+180截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+180-YGY-02 (左洞ZK659+180截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+206-YGY-01 (左洞ZK659+206截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+206-YGY-02 (左洞ZK659+206截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+206-YGY-01 (左洞ZK659+206截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+206-YGY-02 (左洞ZK659+206截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+226-YGY-01 (左洞ZK659+226截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+226-YGY-02 (左洞ZK659+226截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+226-YGY-01 (左洞ZK659+226截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+226-YGY-02 (左洞ZK659+226截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+246-YGY-01 (左洞ZK659+246截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+246-YGY-02 (左洞ZK659+246截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+246-YGY-01 (左洞ZK659+246截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+246-YGY-02 (左洞ZK659+246截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+266-YGY-01 (左洞ZK659+266截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK659+266-YGY-02 (左洞ZK659+266截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+266-YGY-01 (左洞ZK659+266截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+266-YGY-02 (左洞ZK659+266截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+290-YGY-01 (左洞ZK659+290截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+290-YGY-02 (左洞ZK659+290截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+290-YGY-01 (左洞ZK659+290截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+290-YGY-02 (左洞ZK659+290截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+370-YGY-01 (左洞ZK659+370截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+370-YGY-02 (左洞ZK659+370截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+370-YGY-01 (左洞ZK659+370截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+370-YGY-02 (左洞ZK659+370截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK659+390-YGY-01 (左洞ZK659+390截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+390-YGY-02 (左洞ZK659+390截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+390-YGY-01 (左洞ZK659+390截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+390-YGY-02 (左洞ZK659+390截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+410-YGY-01 (左洞ZK659+410截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK659+410-YGY-02 (左洞ZK659+410截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK659+410-YGY-01 (左洞ZK659+410截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK659+410-YGY-02 (左洞ZK659+410截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK660+600-YGY-01 (左洞ZK660+600截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK660+600-YGY-02 (左洞ZK660+600截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK660+600-YGY-01 (左洞ZK660+600截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK660+600-YGY-02 (左洞ZK660+600截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK660+620-YGY-01 (左洞ZK660+620截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK660+620-YGY-02 (左洞ZK660+620截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK660+620-YGY-01 (左洞ZK660+620截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK660+620-YGY-02 (左洞ZK660+620截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK660+640-YGY-01 (左洞ZK660+640截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK660+640-YGY-02 (左洞ZK660+640截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK660+640-YGY-01 (左洞ZK660+640截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK660+640-YGY-02 (左洞ZK660+640截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+565-YGY-01 (左洞ZK661+565截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+565-YGY-02 (左洞ZK661+565截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+565-YGY-01 (左洞ZK661+565截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK661+565-YGY-02 (左洞ZK661+565截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+640-YGY-01 (左洞ZK661+640截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK661+640-YGY-02 (左洞ZK661+640截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+640-YGY-01 (左洞ZK661+640截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+640-YGY-02 (左洞ZK661+640截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+670-YGY-01 (左洞ZK661+670截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+670-YGY-02 (左洞ZK661+670截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+670-YGY-01 (左洞ZK661+670截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+670-YGY-02 (左洞ZK661+670截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+690-YGY-01 (左洞ZK661+690截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK661+690-YGY-02 (左洞ZK661+690截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+690-YGY-01 (左洞ZK661+690截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK661+690-YGY-02 (左洞ZK661+690截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+710-YGY-01 (左洞ZK661+710截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK661+710-YGY-02 (左洞ZK661+710截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK661+710-YGY-01 (左洞ZK661+710截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK661+710-YGY-02 (左洞ZK661+710截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+380-YGY-01 (左洞ZK663+380截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+380-YGY-02 (左洞ZK663+380截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+380-YGY-01 (左洞ZK663+380截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+380-YGY-02 (左洞ZK663+380截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+400-YGY-01 (左洞ZK663+400截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+400-YGY-02 (左洞ZK663+400截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+400-YGY-01 (左洞ZK663+400截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+400-YGY-02 (左洞ZK663+400截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+420-YGY-01 (左洞ZK663+420截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+420-YGY-02 (左洞ZK663+420截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+420-YGY-01 (左洞ZK663+420截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+420-YGY-02 (左洞ZK663+420截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+450-YGY-01 (左洞ZK663+450截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+450-YGY-02 (左洞ZK663+450截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+450-YGY-01 (左洞ZK663+450截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+450-YGY-02 (左洞ZK663+450截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+860-YGY-01 (左洞ZK663+860截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+860-YGY-02 (左洞ZK663+860截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+860-YGY-01 (左洞ZK663+860截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+860-YGY-02 (左洞ZK663+860截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+880-YGY-02 (左洞ZK663+880截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+900-YGY-01 (左洞ZK663+900截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+880-YGY-02 (左洞ZK663+880截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+900-YGY-01 (左洞ZK663+900截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+900-YGY-02 (左洞ZK663+900截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+920-YGY-01 (左洞ZK663+920截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+900-YGY-02 (左洞ZK663+900截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+920-YGY-01 (左洞ZK663+920截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+920-YGY-02 (左洞ZK663+920截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+940-YGY-01 (左洞ZK663+940截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+920-YGY-02 (左洞ZK663+920截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+940-YGY-01 (左洞ZK663+940截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+940-YGY-02 (左洞ZK663+940截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+960-YGY-01 (左洞ZK663+960截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+940-YGY-02 (左洞ZK663+940截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+960-YGY-01 (左洞ZK663+960截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK663+960-YGY-02 (左洞ZK663+960截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK663+980-YGY-01 (左洞ZK663+980截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+960-YGY-02 (左洞ZK663+960截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+980-YGY-01 (左洞ZK663+980截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK663+980-YGY-02 (左洞ZK663+980截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK664+220-YGY-01 (左洞ZK664+220截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离
最大值
最小值
距离 (mm)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK663+980-YGY-02 (左洞ZK663+980截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK664+220-YGY-01 (左洞ZK664+220截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度
最大值
最小值
温度 (°C)
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK664+220-YGY-02 (左洞ZK664+220截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK664+240-YGY-01 (左洞ZK664+240截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK664+220-YGY-02 (左洞ZK664+220截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK664+240-YGY-01 (左洞ZK664+240截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK664+240-YGY-02 (左洞ZK664+240截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK664+330-YGY-01 (左洞ZK664+330截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK664+240-YGY-02 (左洞ZK664+240截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+330-YGY-01 (左洞ZK664+330截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+330-YGY-02 (左洞ZK664+330截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK664+915-YGY-01 (左洞ZK664+915截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK664+330-YGY-02 (左洞ZK664+330截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+915-YGY-01 (左洞ZK664+915截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+915-YGY-02 (左洞ZK664+915截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK664+935-YGY-01 (左洞ZK664+935截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK664+915-YGY-02 (左洞ZK664+915截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+935-YGY-01 (左洞ZK664+935截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

ZBW-ZK664+935-YGY-02 (左洞ZK664+935截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日

ZBW-ZK664+960-YGY-01 (左洞ZK664+960截面拱顶沉降收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK664+935-YGY-02 (左洞ZK664+935截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+960-YGY-01 (左洞ZK664+960截面拱顶沉降收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间


ZBW-ZK664+960-YGY-02 (左洞ZK664+960截面拱腰收敛监测)
(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
距离 (mm)
距离
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日


ZBW-ZK664+960-YGY-02 (左洞ZK664+960截面拱腰收敛监测)
温度(时间范围: 2025-12-15 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月15日
2025年12月29日
2026年1月12日
2026年1月26日
时间

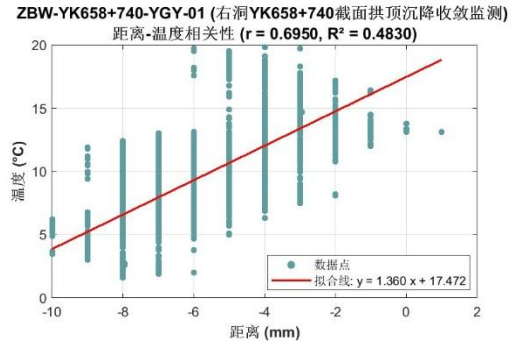
ZBW-YK658+740-YGY-01 (右洞YK658+740截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6950, R² = 0.4830)
温度 (°C)
数据点
拟合线: y = 1.360 x + 17.472
距离 (mm)

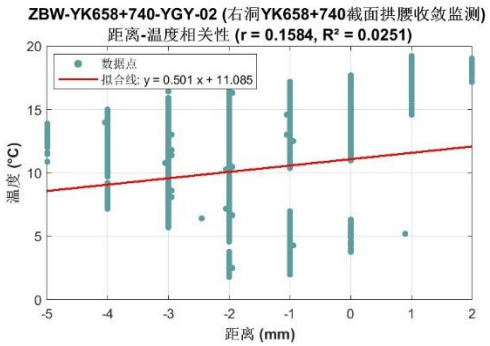
ZBW-YK658+740-YGY-02 (右洞YK658+740截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1584, R² = 0.0251)
数据点
拟合线: y = 0.501 x + 11.085
温度 (°C)
距离 (mm)

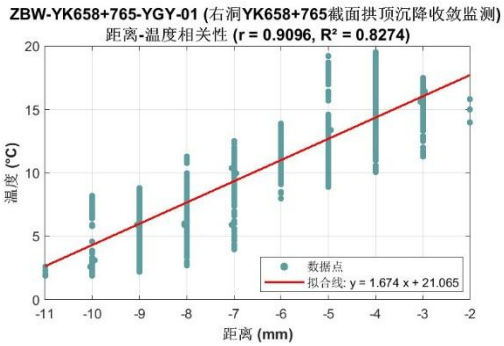
ZBW-YK658+765-YGY-01 (右洞YK658+765截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.9096, R² = 0.8274)
数据点
拟合线: y = 1.674 x + 21.065
温度 (°C)
距离 (mm)

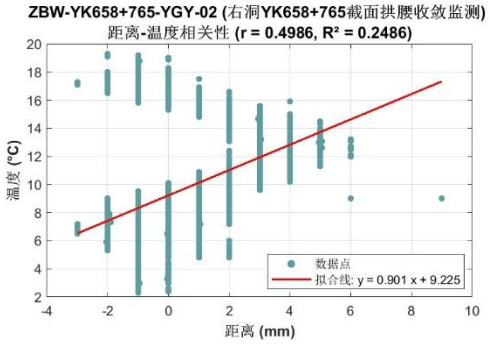
ZBW-YK658+765-YGY-02 (右洞YK658+765截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4986, R² = 0.2486)
数据点
拟合线: y = 0.901 x + 9.225
温度 (°C)
距离 (mm)

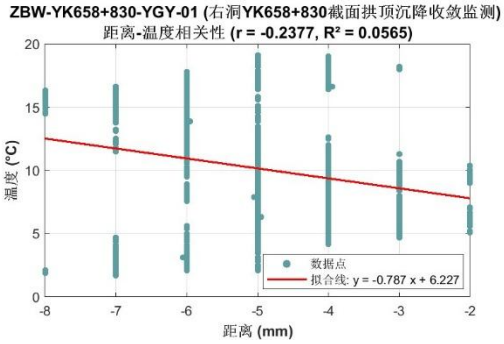
ZBW-YK658+830-YGY-01 (右洞YK658+830截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2377, R² = 0.0565)
数据点
拟合线: y = -0.787 x + 6.227
温度 (°C)
距离 (mm)

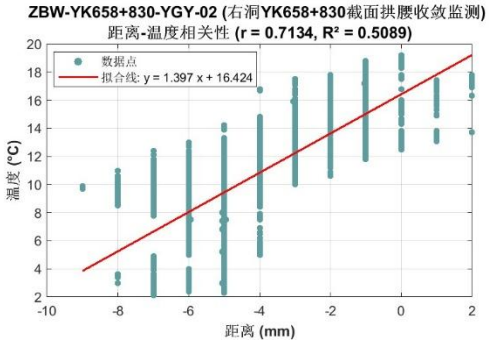
ZBW-YK658+830-YGY-02 (右洞YK658+830截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7134, R² = 0.5089)
数据点
拟合线: y = 1.397 x + 16.424
温度 (°C)
距离 (mm)

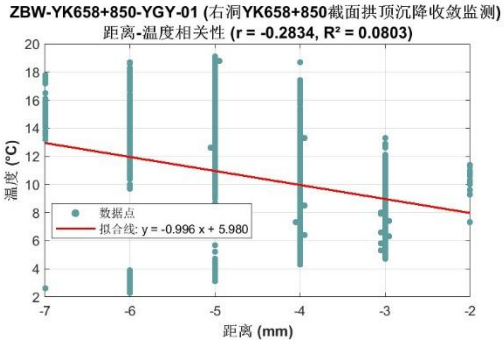
ZBW-YK658+850-YGY-01 (右洞YK658+850截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2834, R² = 0.0803)
数据点
拟合线: y = -0.996 x + 5.980
温度 (°C)
距离 (mm)

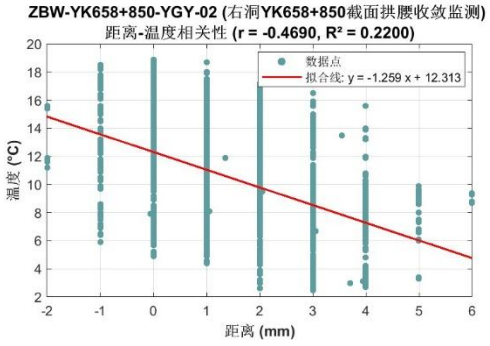
ZBW-YK658+850-YGY-02 (右洞YK658+850截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.4690, R² = 0.2200)
数据点
拟合线: y = -1.259 x + 12.313
温度 (°C)
距离 (mm)

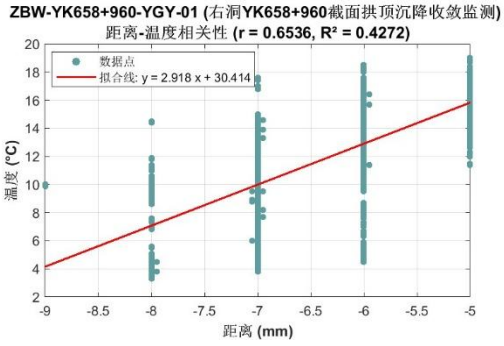
ZBW-YK658+960-YGY-01 (右洞YK658+960截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6536, R² = 0.4272)
数据点
拟合线: y = 2.918 x + 30.414
温度 (°C)
距离 (mm)

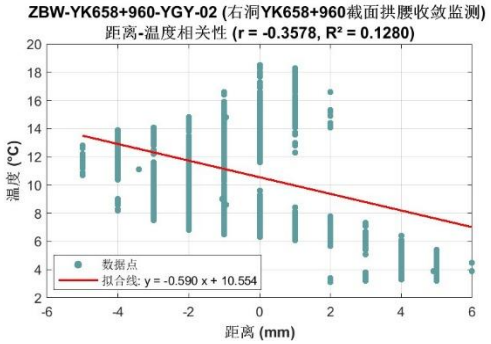
ZBW-YK658+960-YGY-02 (右洞YK658+960截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.3578, R² = 0.1280)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.590 x + 10.554

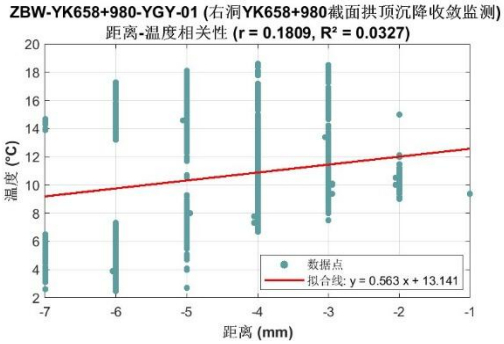
ZBW-YK658+980-YGY-01 (右洞YK658+980截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1809, R² = 0.0327)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.563 x + 13.141

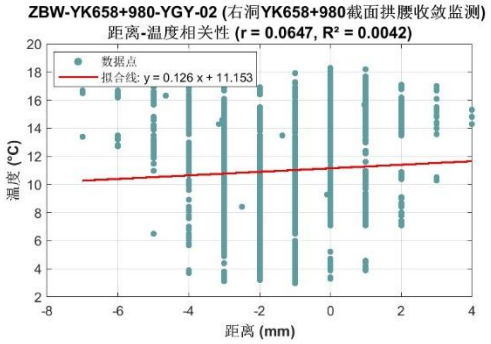
ZBW-YK658+980-YGY-02 (右洞YK658+980截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.0647, R² = 0.0042)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.126 x + 11.153

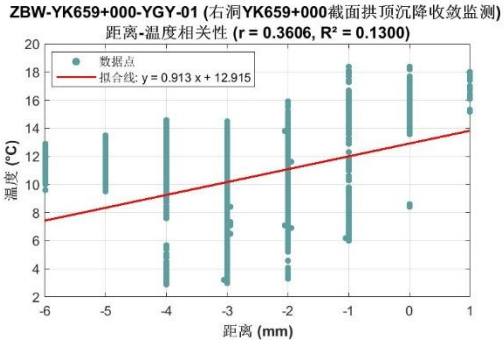
ZBW-YK659+000-YGY-01 (右洞YK659+000截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3606, R² = 0.1300)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.913 x + 12.915

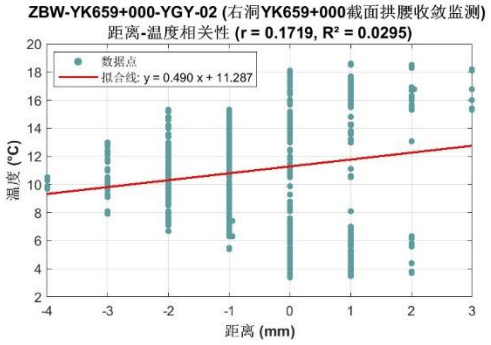
ZBW-YK659+000-YGY-02 (右洞YK659+000截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1719, R² = 0.0295)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.490 x + 11.287

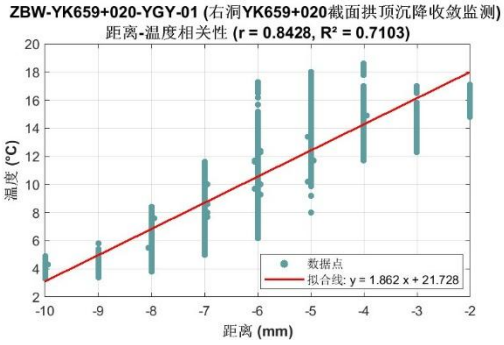
ZBW-YK659+020-YGY-01 (右洞YK659+020截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8428, R² = 0.7103)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.862 x + 21.728

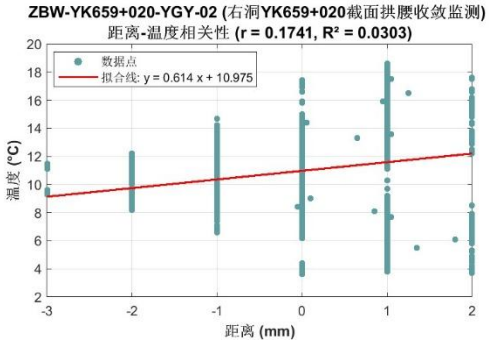
ZBW-YK659+020-YGY-02 (右洞YK659+020截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1741, R² = 0.0303)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.614 x + 10.975

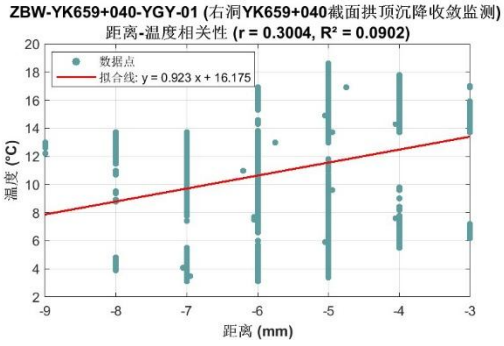
ZBW-YK659+040-YGY-01 (右洞YK659+040截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3004, R² = 0.0902)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.923 x + 16.175

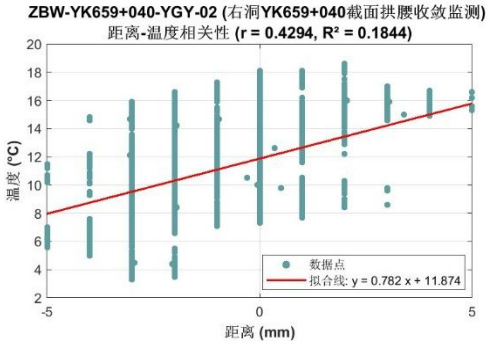
ZBW-YK659+040-YGY-02 (右洞YK659+040截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4294, R² = 0.1844)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.782 x + 11.874

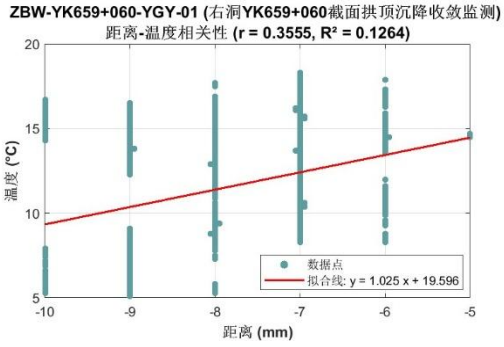
ZBW-YK659+060-YGY-01 (右洞YK659+060截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3555, R² = 0.1264)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.025 x + 19.596

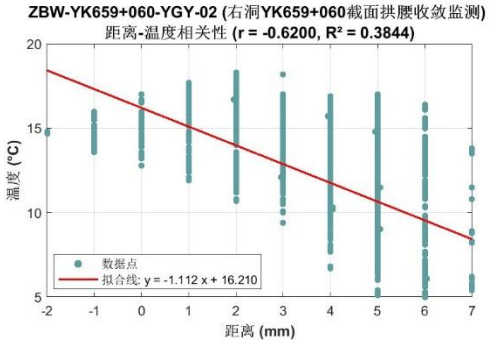
ZBW-YK659+060-YGY-02 (右洞YK659+060截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.6200, R² = 0.3844)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -1.112 x + 16.210

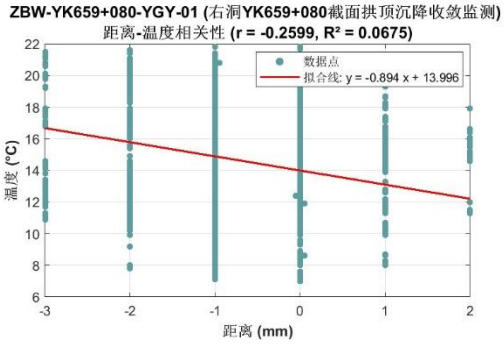
ZBW-YK659+080-YGY-01 (右洞YK659+080截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2599, R² = 0.0675)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.894 x + 13.996

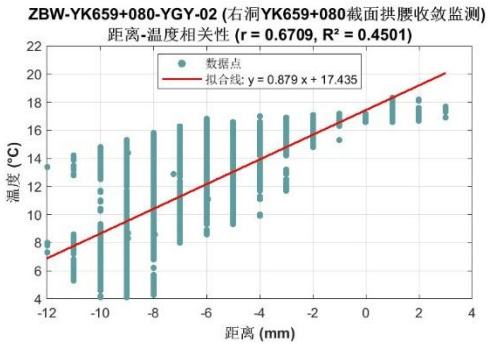
ZBW-YK659+080-YGY-02 (右洞YK659+080截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6709, R² = 0.4501)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.879 x + 17.435

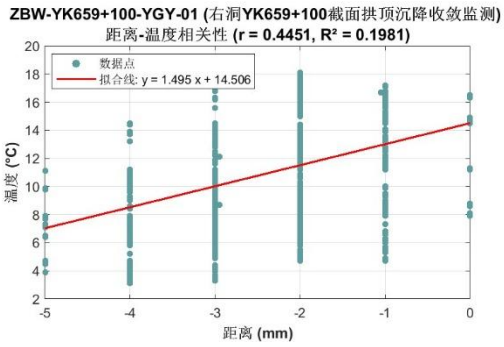
ZBW-YK659+100-YGY-01 (右洞YK659+100截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4451, R² = 0.1981)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.495 x + 14.506

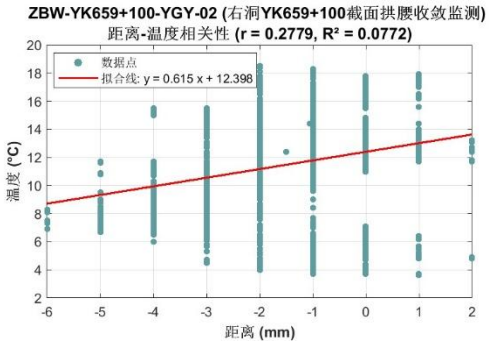
ZBW-YK659+100-YGY-02 (右洞YK659+100截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.2779, R² = 0.0772)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.615 x + 12.398

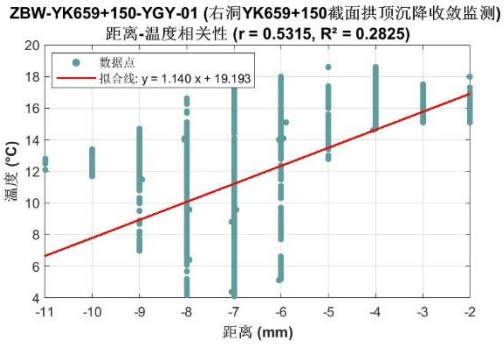
ZBW-YK659+150-YGY-01 (右洞YK659+150截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5315, R² = 0.2825)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.140 x + 19.193

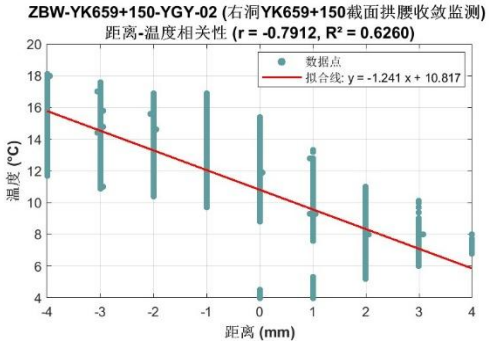
ZBW-YK659+150-YGY-02 (右洞YK659+150截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.7912, R² = 0.6260)
数据点
拟合线: y = -1.241 x + 10.817
温度 (°C)
距离 (mm)

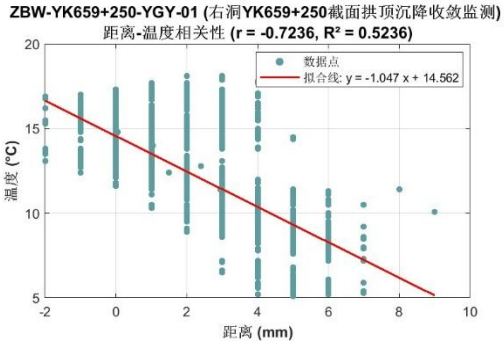
ZBW-YK659+250-YGY-01 (右洞YK659+250截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.7236, R² = 0.5236)
数据点
拟合线: y = -1.047 x + 14.562
温度 (°C)
距离 (mm)

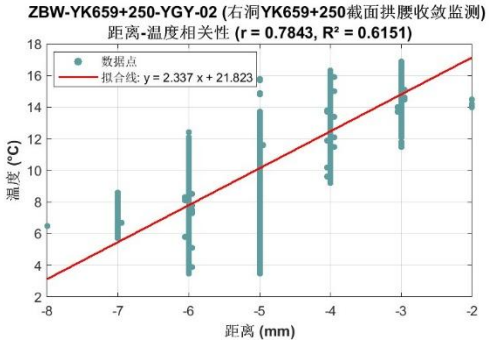
ZBW-YK659+250-YGY-02 (右洞YK659+250截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7843, R² = 0.6151)
数据点
拟合线: y = 2.337 x + 21.823
温度 (°C)
距离 (mm)

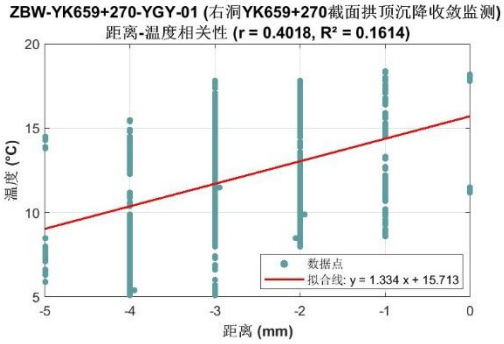
ZBW-YK659+270-YGY-01 (右洞YK659+270截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4018, R² = 0.1614)
数据点
拟合线: y = 1.334 x + 15.713
温度 (°C)
距离 (mm)

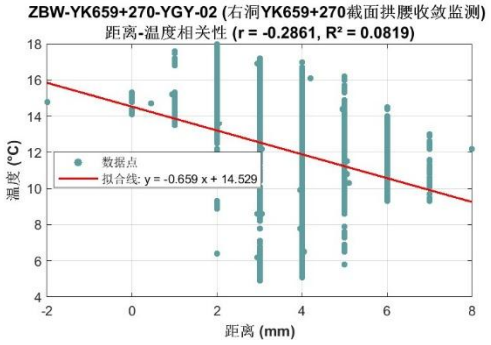
ZBW-YK659+270-YGY-02 (右洞YK659+270截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2861, R² = 0.0819)
数据点
拟合线: y = -0.659 x + 14.529
温度 (°C)
距离 (mm)

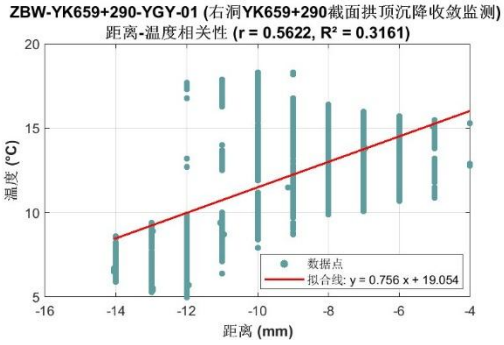
ZBW-YK659+290-YGY-01 (右洞YK659+290截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5622, R² = 0.3161)
数据点
拟合线: y = 0.756 x + 19.054
温度 (°C)
距离 (mm)

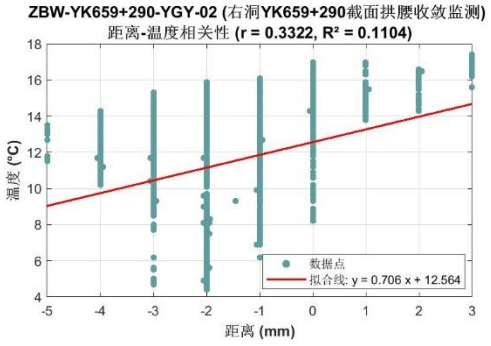
ZBW-YK659+290-YGY-02 (右洞YK659+290截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3322, R² = 0.1104)
数据点
拟合线: y = 0.706 x + 12.564
温度 (°C)
距离 (mm)

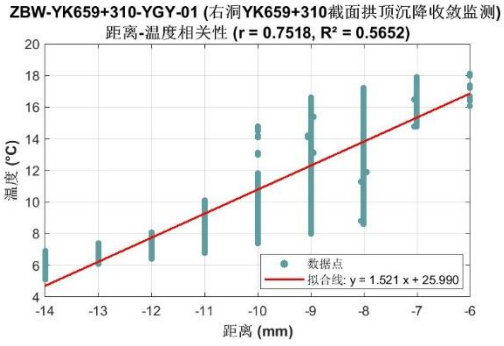
ZBW-YK659+310-YGY-01 (右洞YK659+310截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7518, R² = 0.5652)
数据点
拟合线: y = 1.521 x + 25.990
温度 (°C)
距离 (mm)

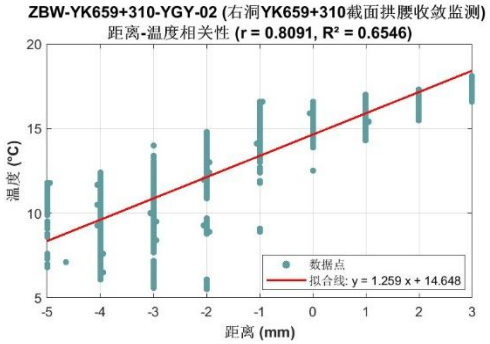
ZBW-YK659+310-YGY-02 (右洞YK659+310截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8091, R² = 0.6546)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.259 x + 14.648

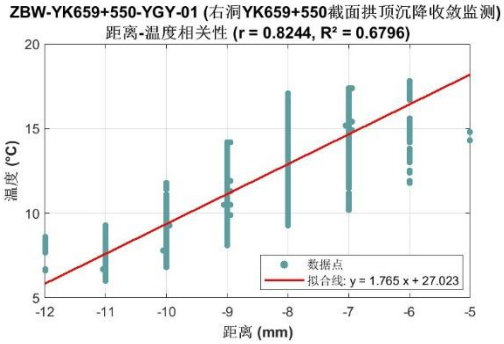
ZBW-YK659+550-YGY-01 (右洞YK659+550截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8244, R² = 0.6796)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.765 x + 27.023

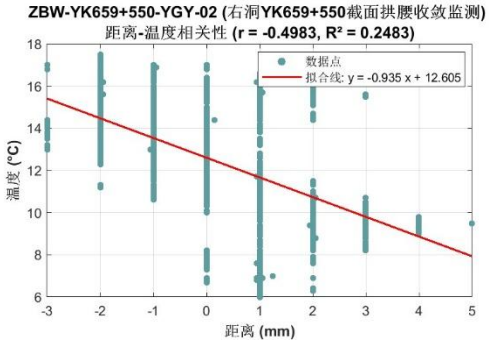
ZBW-YK659+550-YGY-02 (右洞YK659+550截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.4983, R² = 0.2483)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.935 x + 12.605

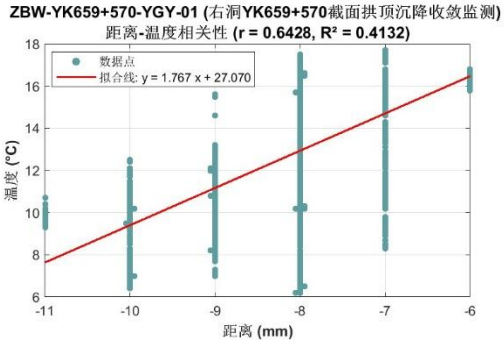
ZBW-YK659+570-YGY-01 (右洞YK659+570截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6428, R² = 0.4132)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.767 x + 27.070

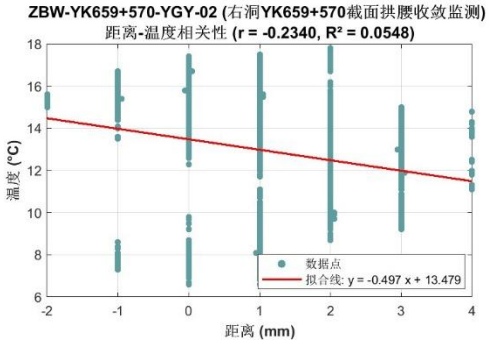
ZBW-YK659+570-YGY-02 (右洞YK659+570截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2340, R² = 0.0548)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.497 x + 13.479

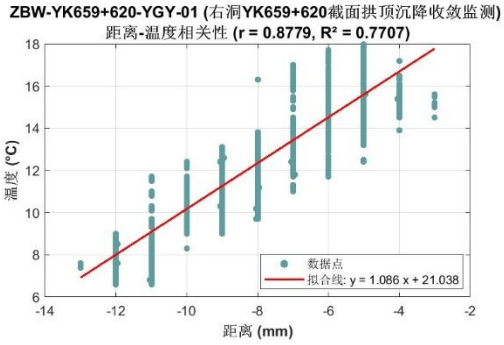
ZBW-YK659+620-YGY-01 (右洞YK659+620截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8779, R² = 0.7707)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.086 x + 21.038

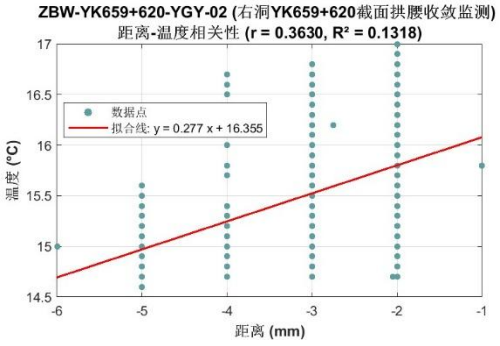
ZBW-YK659+620-YGY-02 (右洞YK659+620截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3630, R² = 0.1318)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.277 x + 16.355

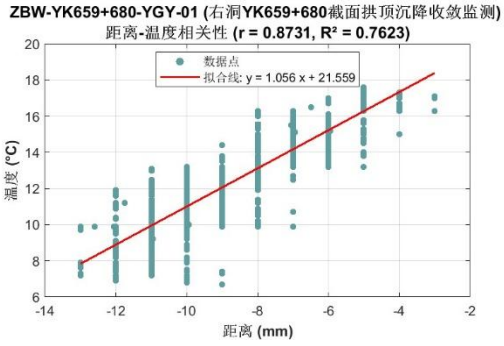
ZBW-YK659+680-YGY-01 (右洞YK659+680截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8731, R² = 0.7623)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.056 x + 21.559

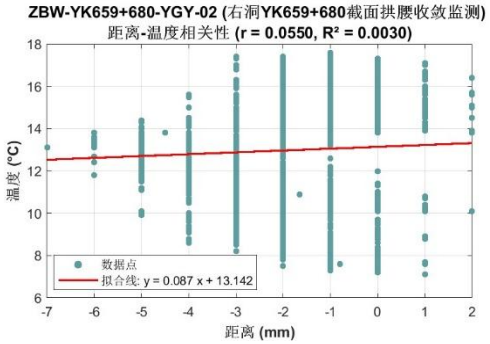
ZBW-YK659+680-YGY-02 (右洞YK659+680截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.0550, R² = 0.0030)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.087 x + 13.142

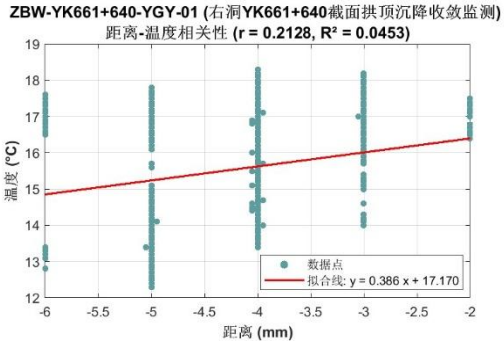
ZBW-YK661+640-YGY-01 (右洞YK661+640截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.2128, R² = 0.0453)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.386 x + 17.170

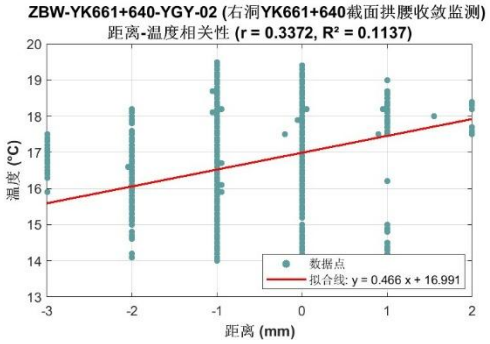
ZBW-YK661+640-YGY-02 (右洞YK661+640截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3372, R² = 0.1137)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.466 x + 16.991

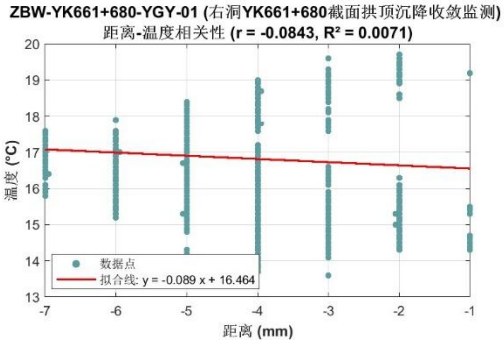
ZBW-YK661+680-YGY-01 (右洞YK661+680截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.0843, R² = 0.0071)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.089 x + 16.464

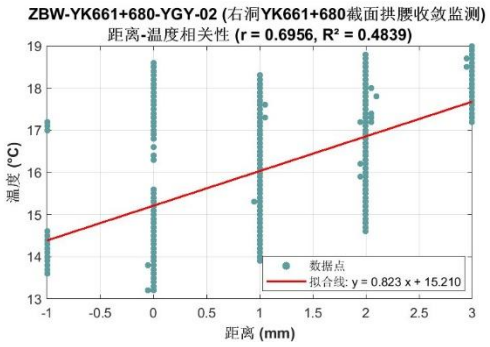
ZBW-YK661+680-YGY-02 (右洞YK661+680截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6956, R² = 0.4839)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.823 x + 15.210

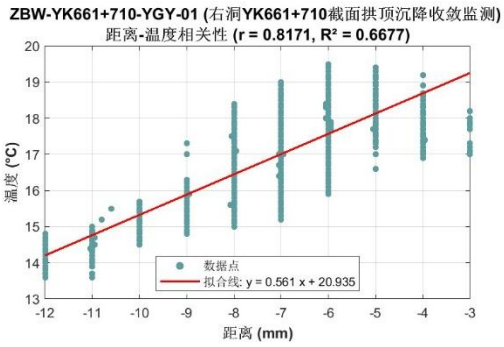
ZBW-YK661+710-YGY-01 (右洞YK661+710截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8171, R² = 0.6677)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.561 x + 20.935

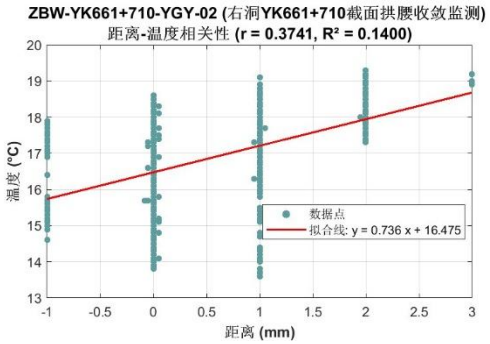
ZBW-YK661+710-YGY-02 (右洞YK661+710截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3741, R² = 0.1400)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.736 x + 16.475

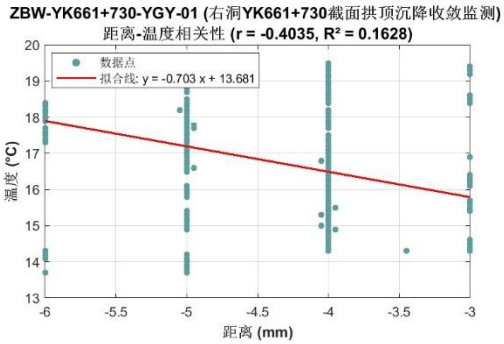
ZBW-YK661+730-YGY-01 (右洞YK661+730截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.4035, R² = 0.1628)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.703 x + 13.681

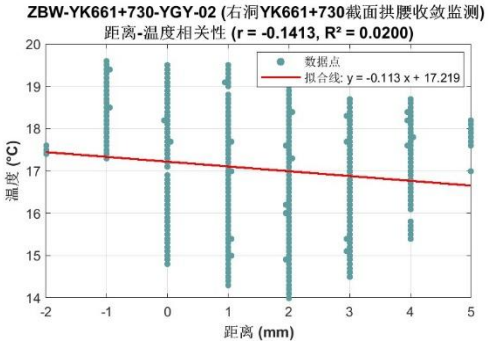
ZBW-YK661+730-YGY-02 (右洞YK661+730截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.1413, R² = 0.0200)
数据点
拟合线: y = -0.113 x + 17.219
温度 (°C)
距离 (mm)

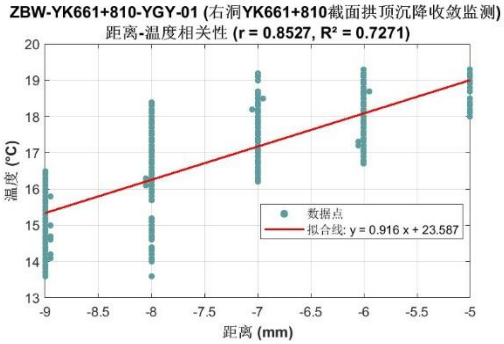
ZBW-YK661+810-YGY-01 (右洞YK661+810截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8527, R² = 0.7271)
数据点
拟合线: y = 0.916 x + 23.587
温度 (°C)
距离 (mm)

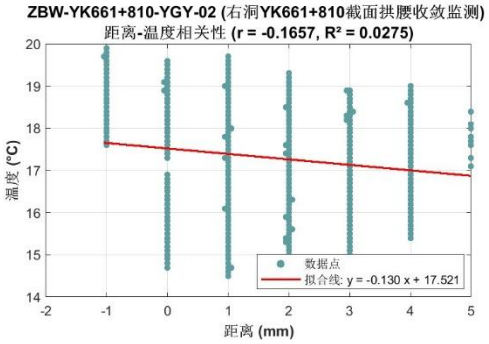
ZBW-YK661+810-YGY-02 (右洞YK661+810截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.1657, R² = 0.0275)
数据点
拟合线: y = -0.130 x + 17.521
温度 (°C)
距离 (mm)

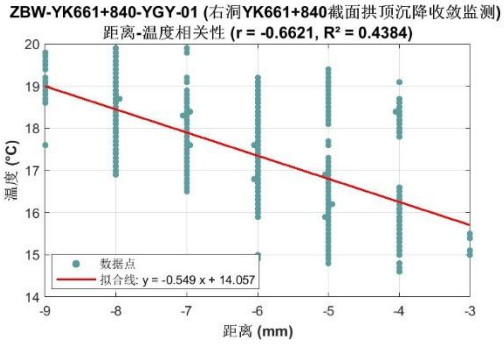
ZBW-YK661+840-YGY-01 (右洞YK661+840截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.6621, R² = 0.4384)
数据点
拟合线: y = -0.549 x + 14.057
温度 (°C)
距离 (mm)

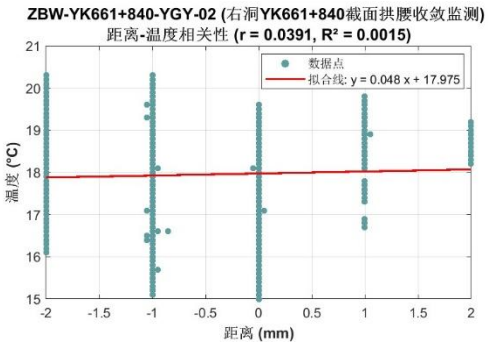
ZBW-YK661+840-YGY-02 (右洞YK661+840截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.0391, R² = 0.0015)
数据点
拟合线: y = 0.048 x + 17.975
温度 (°C)
距离 (mm)

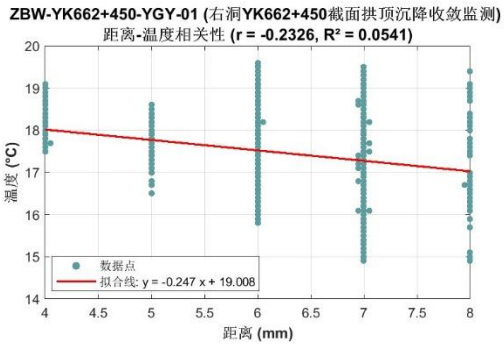
ZBW-YK662+450-YGY-01 (右洞YK662+450截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2326, R² = 0.0541)
数据点
拟合线: y = -0.247 x + 19.008
温度 (°C)
距离 (mm)

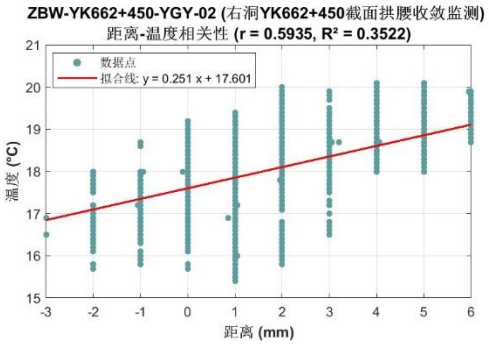
ZBW-YK662+450-YGY-02 (右洞YK662+450截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5935, R² = 0.3522)
数据点
拟合线: y = 0.251 x + 17.601
温度 (°C)
距离 (mm)

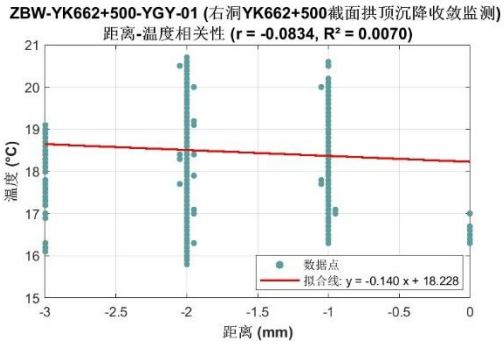
ZBW-YK662+500-YGY-01 (右洞YK662+500截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.0834, R² = 0.0070)
数据点
拟合线: y = -0.140 x + 18.228
温度 (°C)
距离 (mm)

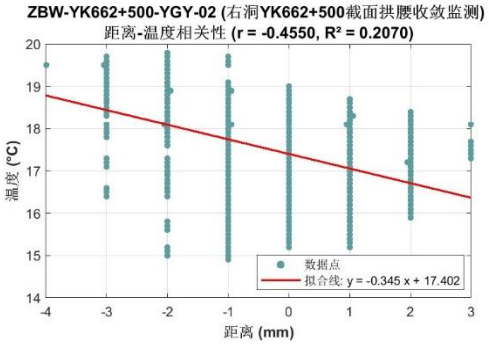
ZBW-YK662+500-YGY-02 (右洞YK662+500截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.4550, R² = 0.2070)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.345 x + 17.402

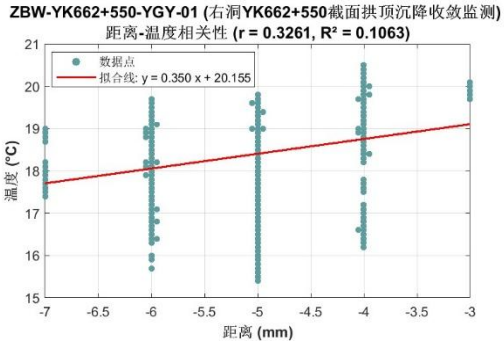
ZBW-YK662+550-YGY-01 (右洞YK662+550截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3261, R² = 0.1063)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.350 x + 20.155

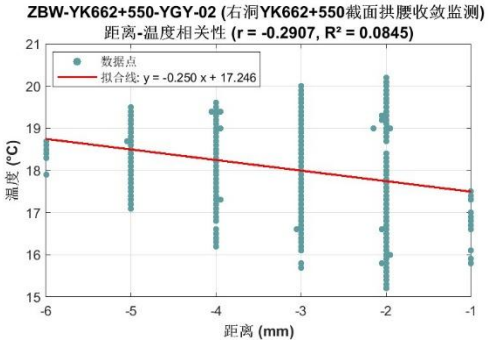
ZBW-YK662+550-YGY-02 (右洞YK662+550截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2907, R² = 0.0845)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.250 x + 17.246

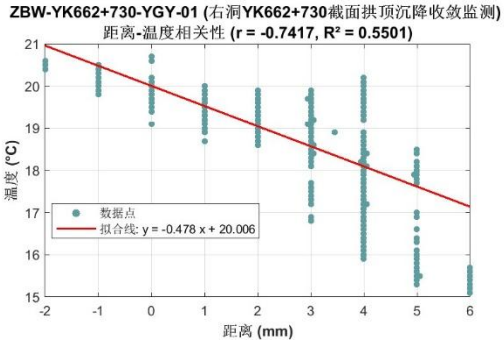
ZBW-YK662+730-YGY-01 (右洞YK662+730截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.7417, R² = 0.5501)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.478 x + 20.006

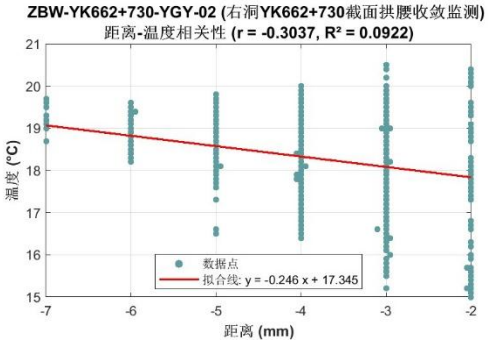
ZBW-YK662+730-YGY-02 (右洞YK662+730截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.3037, R² = 0.0922)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.246 x + 17.345

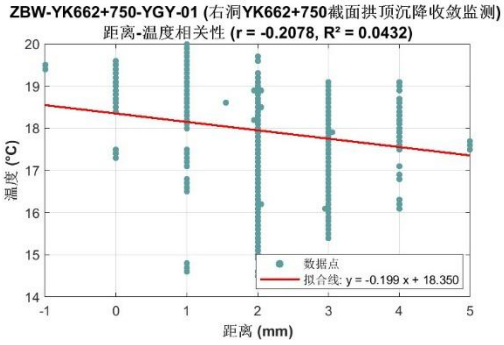
ZBW-YK662+750-YGY-01 (右洞YK662+750截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2078, R² = 0.0432)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.199 x + 18.350

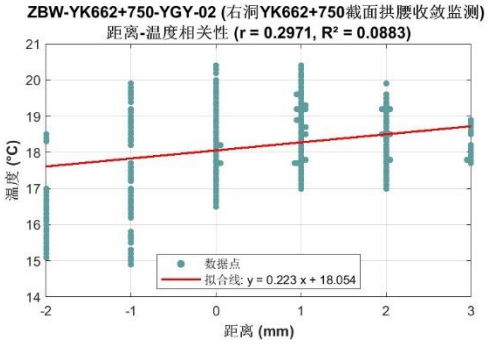
ZBW-YK662+750-YGY-02 (右洞YK662+750截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.2971, R² = 0.0883)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.223 x + 18.054

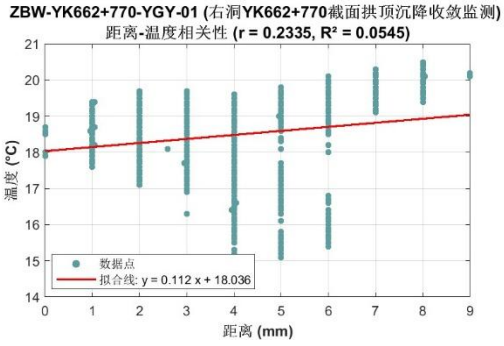
ZBW-YK662+770-YGY-01 (右洞YK662+770截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.2335, R² = 0.0545)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.112 x + 18.036

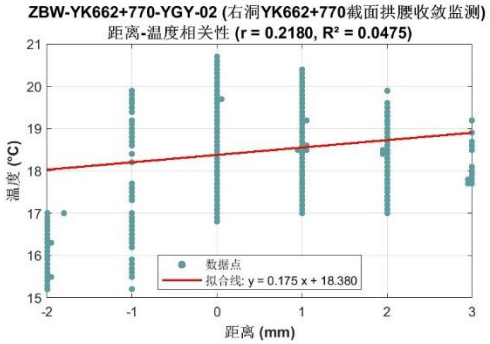
ZBW-YK662+770-YGY-02 (右洞YK662+770截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.2180, R² = 0.0475)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.175 x + 18.380

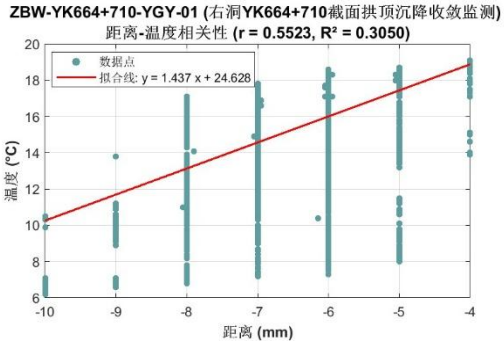
ZBW-YK664+710-YGY-01 (右洞YK664+710截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5523, R² = 0.3050)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.437 x + 24.628

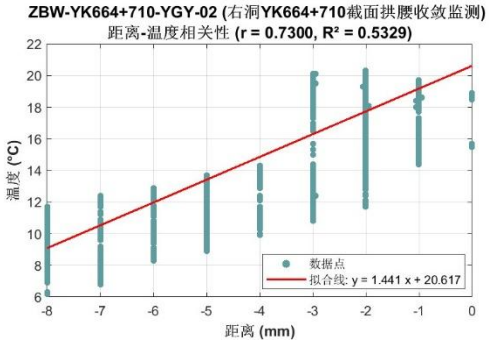
ZBW-YK664+710-YGY-02 (右洞YK664+710截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7300, R² = 0.5329)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.441 x + 20.617

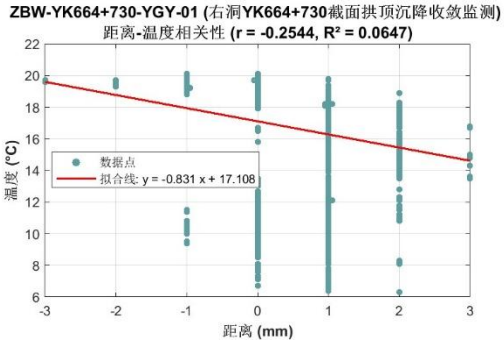
ZBW-YK664+730-YGY-01 (右洞YK664+730截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2544, R² = 0.0647)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.831 x + 17.108

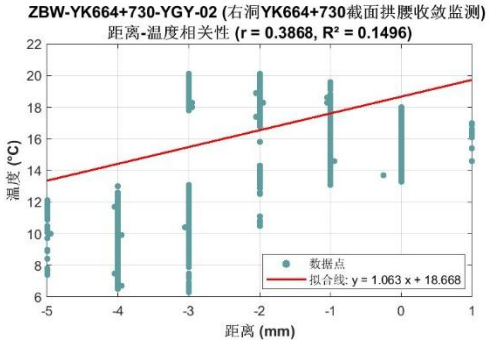
ZBW-YK664+730-YGY-02 (右洞YK664+730截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3868, R² = 0.1496)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.063 x + 18.668

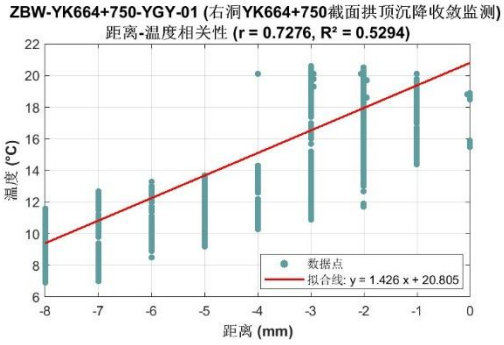
ZBW-YK664+750-YGY-01 (右洞YK664+750截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7276, R² = 0.5294)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.426 x + 20.805

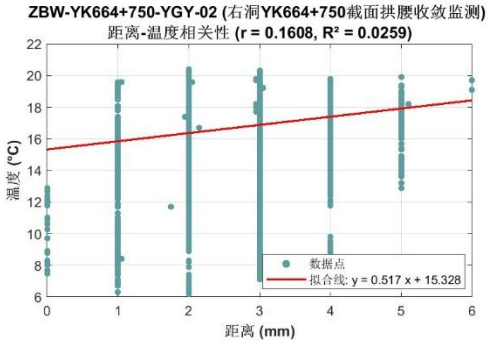
ZBW-YK664+750-YGY-02 (右洞YK664+750截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1608, R² = 0.0259)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.517 x + 15.328

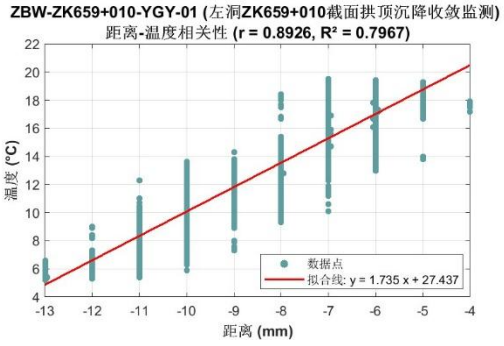
ZBW-ZK659+010-YGY-01 (左洞ZK659+010截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8926, R² = 0.7967)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.735 x + 27.437

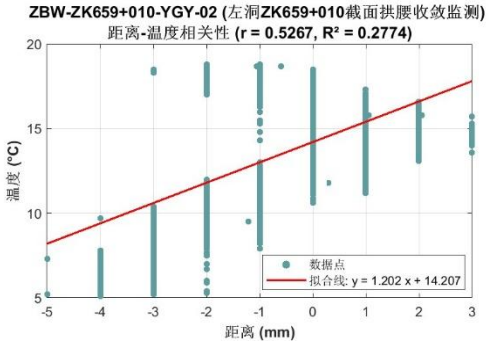
ZBW-ZK659+010-YGY-02 (左洞ZK659+010截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5267, R² = 0.2774)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.202 x + 14.207

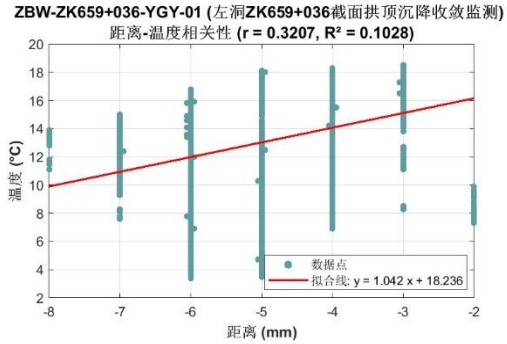
ZBW-ZK659+036-YGY-01 (左洞ZK659+036截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3207, R² = 0.1028)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.042 x + 18.236

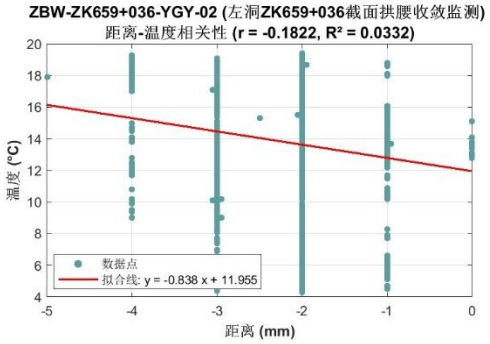
ZBW-ZK659+036-YGY-02 (左洞ZK659+036截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.1822, R² = 0.0332)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.838 x + 11.955

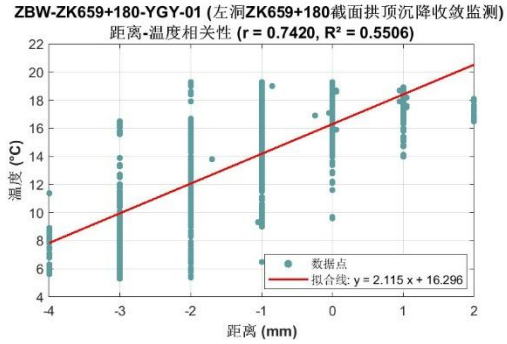
ZBW-ZK659+180-YGY-01 (左洞ZK659+180截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7420, R² = 0.5506)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 2.115 x + 16.296

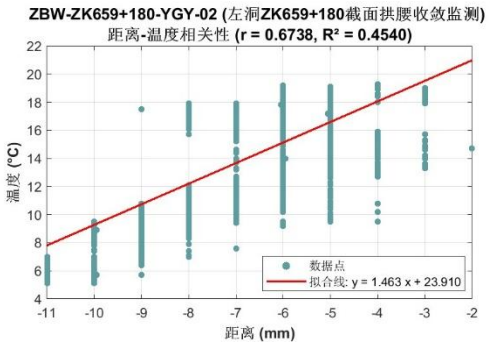
ZBW-ZK659+180-YGY-02 (左洞ZK659+180截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6738, R² = 0.4540)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.463 x + 23.910

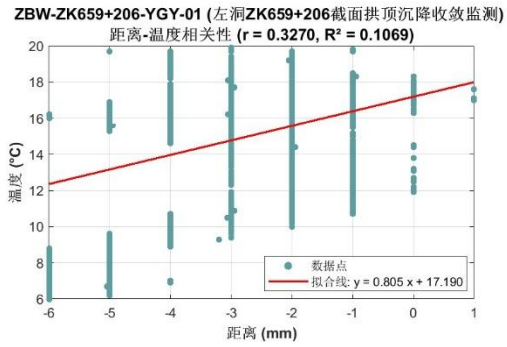
ZBW-ZK659+206-YGY-01 (左洞ZK659+206截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3270, R² = 0.1069)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.805 x + 17.190

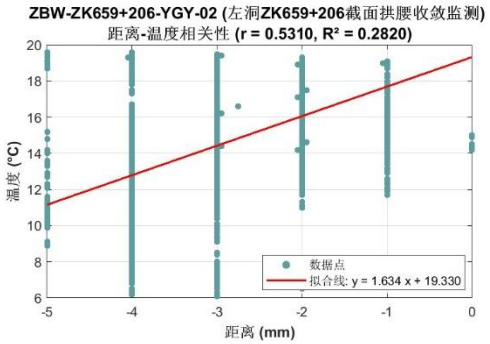
ZBW-ZK659+206-YGY-02 (左洞ZK659+206截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5310, R² = 0.2820)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.634 x + 19.330

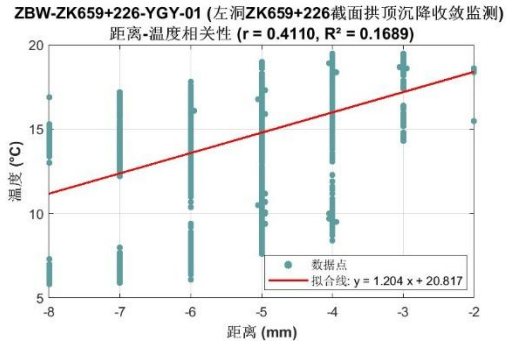
ZBW-ZK659+226-YGY-01 (左洞ZK659+226截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4110, R² = 0.1689)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.204 x + 20.817

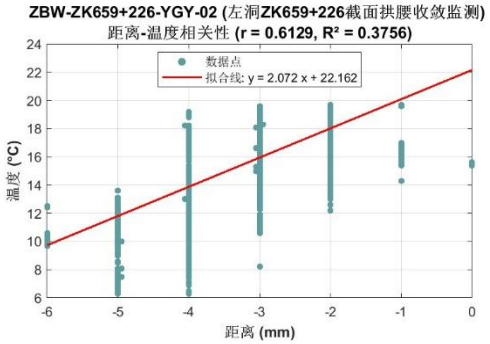
ZBW-ZK659+226-YGY-02 (左洞ZK659+226截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6129, R² = 0.3756)
数据点
拟合线: y = 2.072 x + 22.162
温度 (°C)
距离 (mm)

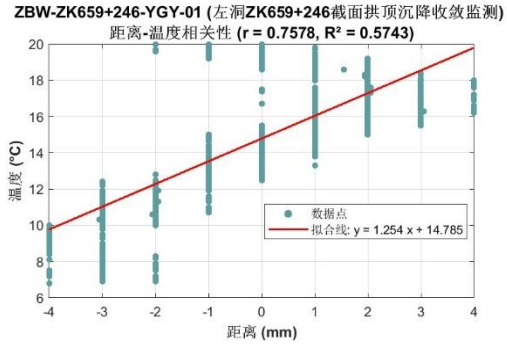
ZBW-ZK659+246-YGY-01 (左洞ZK659+246截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7578, R² = 0.5743)
数据点
拟合线: y = 1.254 x + 14.785
温度 (°C)
距离 (mm)

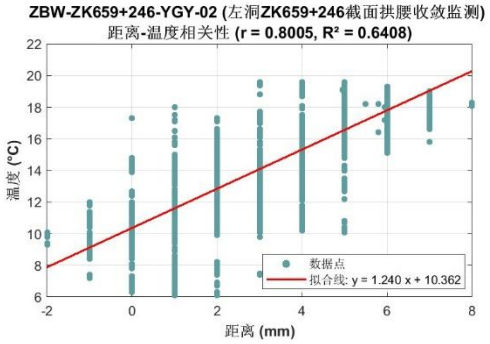
ZBW-ZK659+246-YGY-02 (左洞ZK659+246截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8005, R² = 0.6408)
数据点
拟合线: y = 1.240 x + 10.362
温度 (°C)
距离 (mm)

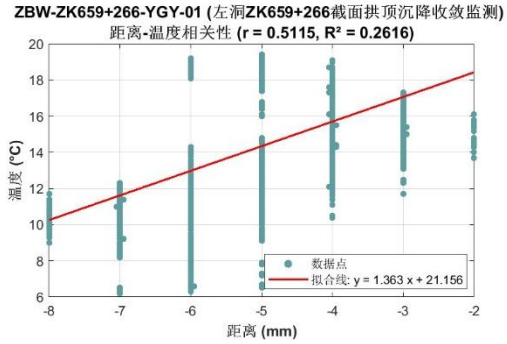
ZBW-ZK659+266-YGY-01 (左洞ZK659+266截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5115, R² = 0.2616)
数据点
拟合线: y = 1.363 x + 21.156
温度 (°C)
距离 (mm)

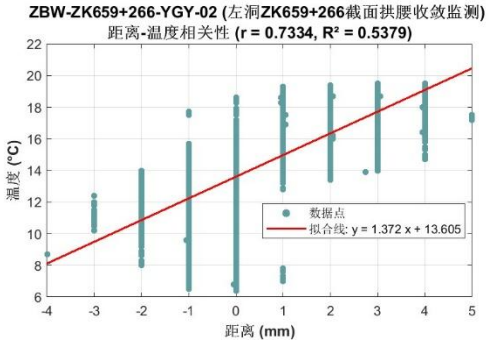
ZBW-ZK659+266-YGY-02 (左洞ZK659+266截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7334, R² = 0.5379)
数据点
拟合线: y = 1.372 x + 13.605
温度 (°C)
距离 (mm)

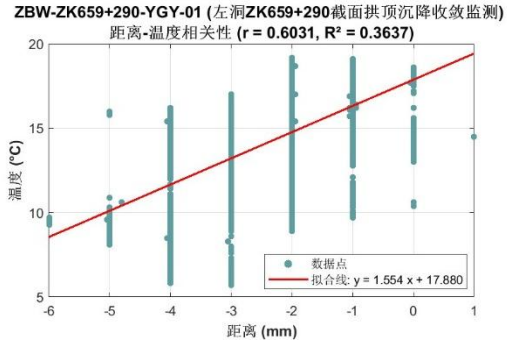
ZBW-ZK659+290-YGY-01 (左洞ZK659+290截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6031, R² = 0.3637)
数据点
拟合线: y = 1.554 x + 17.880
温度 (°C)
距离 (mm)

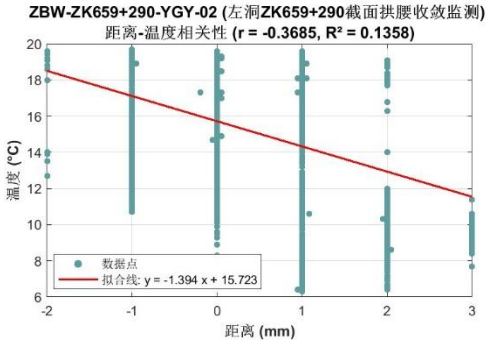
ZBW-ZK659+290-YGY-02 (左洞ZK659+290截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.3685, R² = 0.1358)
数据点
拟合线: y = -1.394 x + 15.723
温度 (°C)
距离 (mm)

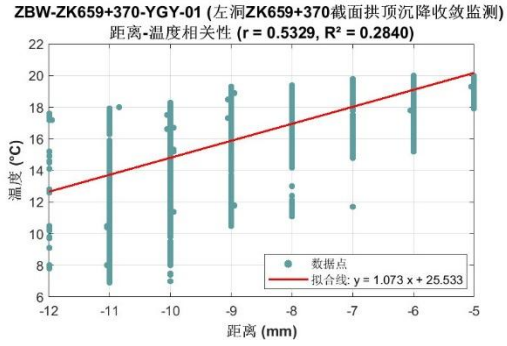
ZBW-ZK659+370-YGY-01 (左洞ZK659+370截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5329, R² = 0.2840)
数据点
拟合线: y = 1.073 x + 25.533
温度 (°C)
距离 (mm)

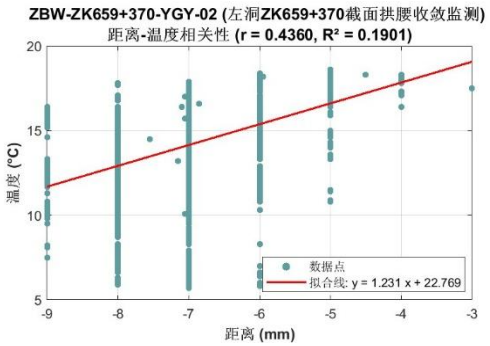
ZBW-ZK659+370-YGY-02 (左洞ZK659+370截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4360, R² = 0.1901)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.231 x + 22.769

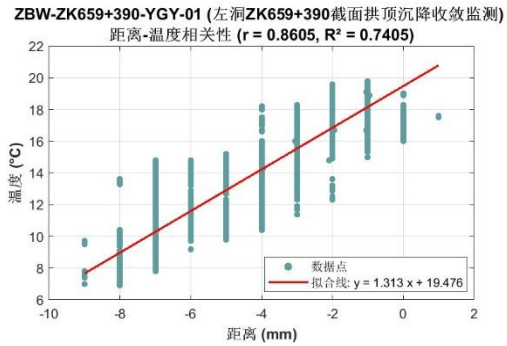
ZBW-ZK659+390-YGY-01 (左洞ZK659+390截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8605, R² = 0.7405)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.313 x + 19.476

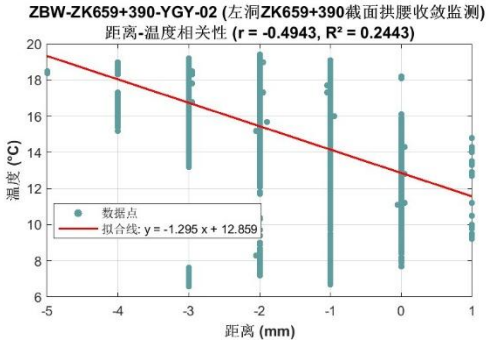
ZBW-ZK659+390-YGY-02 (左洞ZK659+390截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.4943, R² = 0.2443)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -1.295 x + 12.859

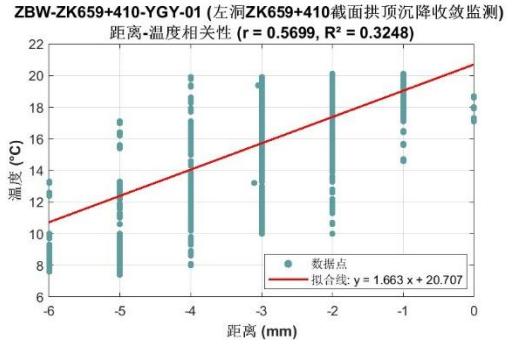
ZBW-ZK659+410-YGY-01 (左洞ZK659+410截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5699, R² = 0.3248)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.663 x + 20.707

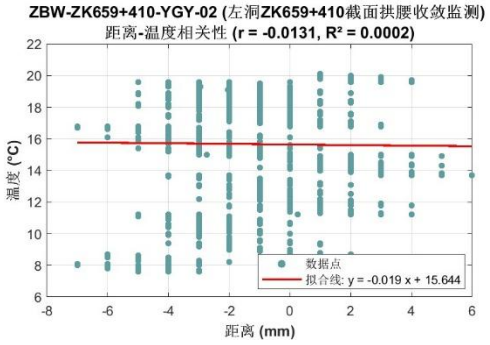
ZBW-ZK659+410-YGY-02 (左洞ZK659+410截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.0131, R² = 0.0002)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.019 x + 15.644

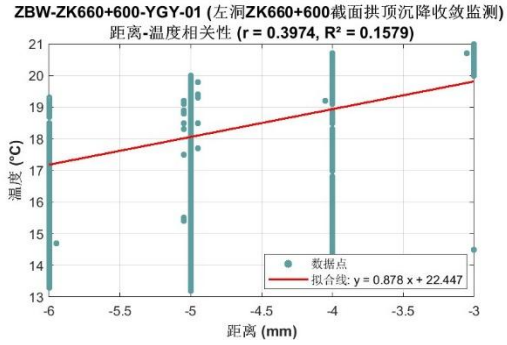
ZBW-ZK660+600-YGY-01 (左洞ZK660+600截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3974, R² = 0.1579)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.878 x + 22.447

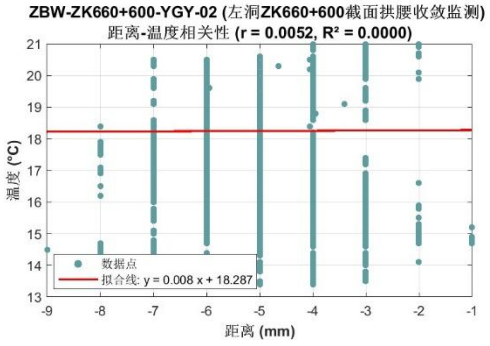
ZBW-ZK660+600-YGY-02 (左洞ZK660+600截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.0052, R² = 0.0000)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.008 x + 18.287

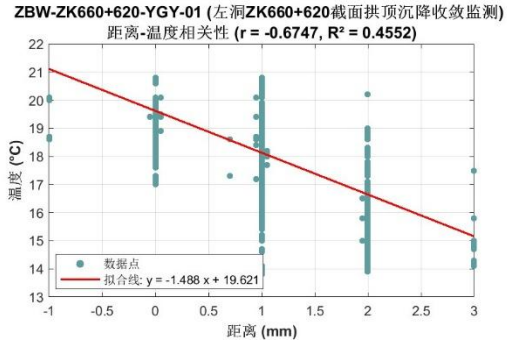
ZBW-ZK660+620-YGY-01 (左洞ZK660+620截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.6747, R² = 0.4552)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -1.488 x + 19.621

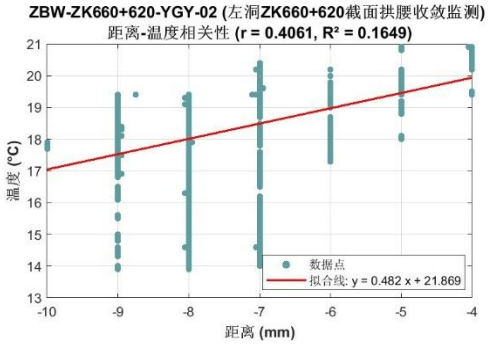
ZBW-ZK660+620-YGY-02 (左洞ZK660+620截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4061, R² = 0.1649)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.482 x + 21.869

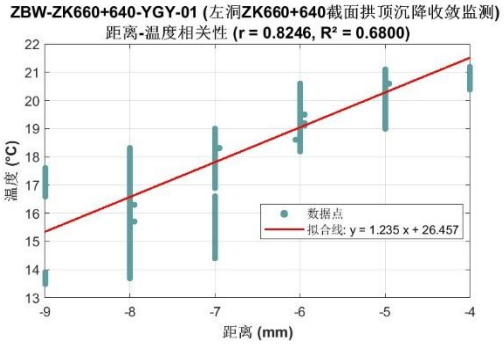
ZBW-ZK660+640-YGY-01 (左洞ZK660+640截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8246, R² = 0.6800)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.235 x + 26.457

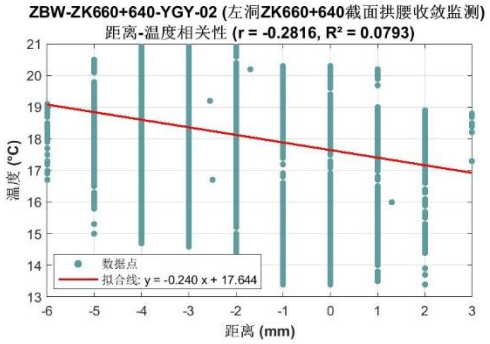
ZBW-ZK660+640-YGY-02 (左洞ZK660+640截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2816, R² = 0.0793)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.240 x + 17.644

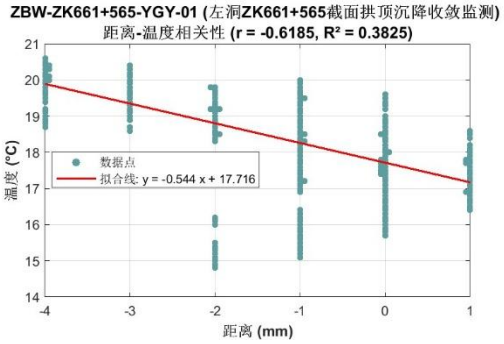
ZBW-ZK661+565-YGY-01 (左洞ZK661+565截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.6185, R² = 0.3825)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.544 x + 17.716

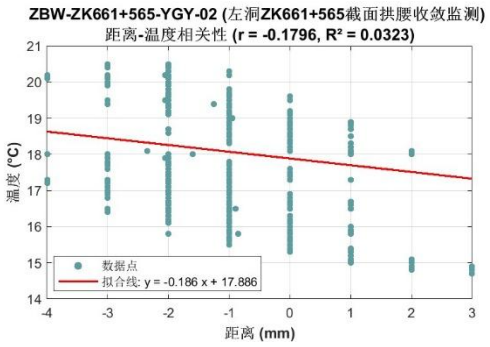
ZBW-ZK661+565-YGY-02 (左洞ZK661+565截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.1796, R² = 0.0323)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.186 x + 17.886

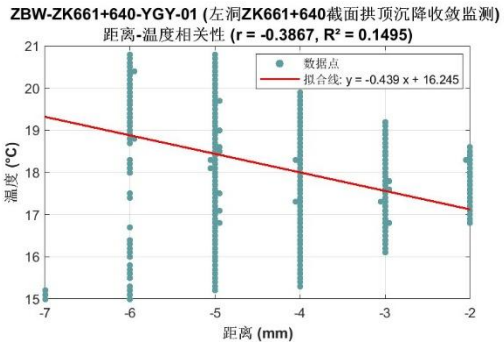
ZBW-ZK661+640-YGY-01 (左洞ZK661+640截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.3867, R² = 0.1495)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.439 x + 16.245

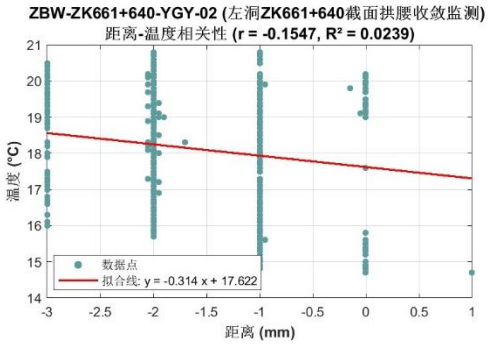
ZBW-ZK661+640-YGY-02 (左洞ZK661+640截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.1547, R² = 0.0239)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.314 x + 17.622

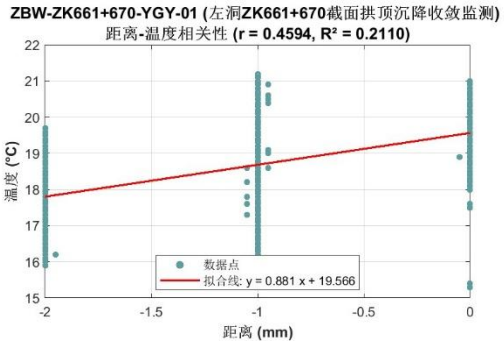
ZBW-ZK661+670-YGY-01 (左洞ZK661+670截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4594, R² = 0.2110)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.881 x + 19.566

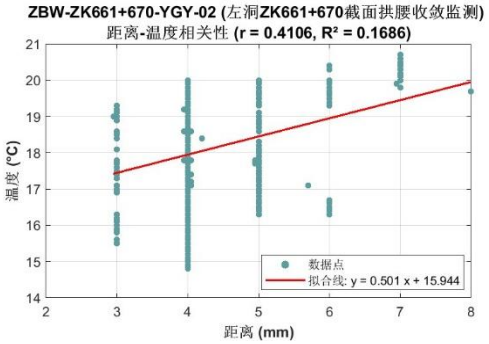
ZBW-ZK661+670-YGY-02 (左洞ZK661+670截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4106, R² = 0.1686)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.501 x + 15.944

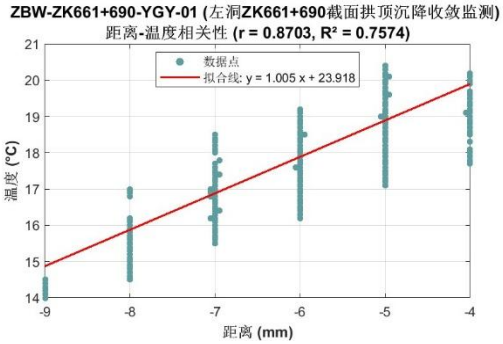
ZBW-ZK661+690-YGY-01 (左洞ZK661+690截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8703, R² = 0.7574)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.005 x + 23.918

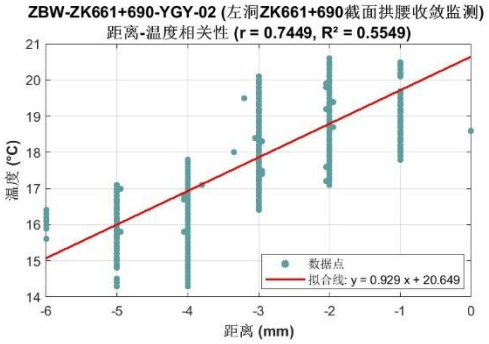
ZBW-ZK661+690-YGY-02 (左洞ZK661+690截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7449, R² = 0.5549)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.929 x + 20.649

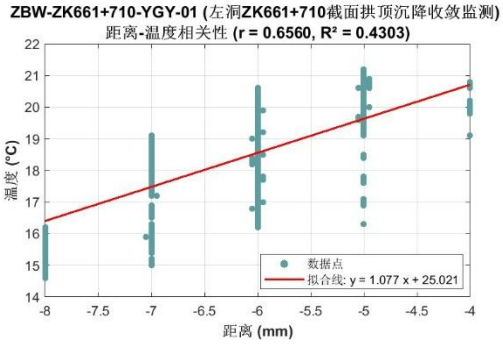
ZBW-ZK661+710-YGY-01 (左洞ZK661+710截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6560, R² = 0.4303)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.077 x + 25.021

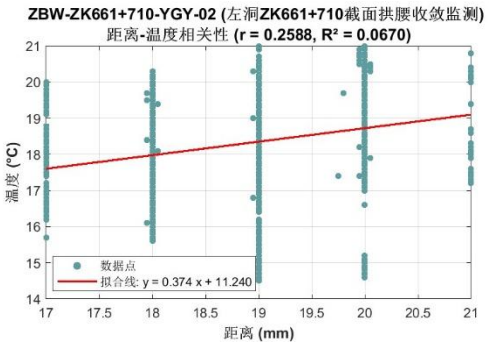
ZBW-ZK661+710-YGY-02 (左洞ZK661+710截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.2588, R² = 0.0670)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.374 x + 11.240

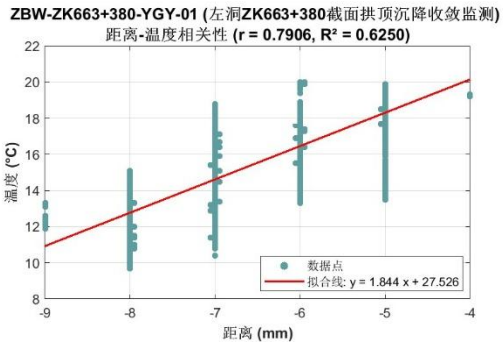
ZBW-ZK663+380-YGY-01 (左洞ZK663+380截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7906, R² = 0.6250)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.844 x + 27.526

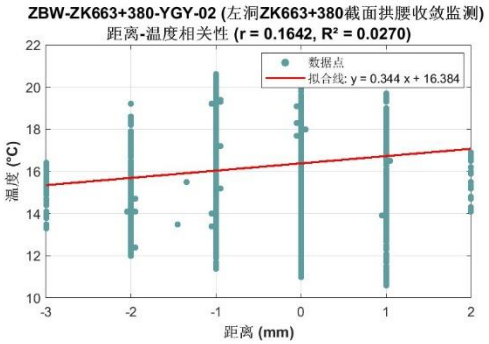
ZBW-ZK663+380-YGY-02 (左洞ZK663+380截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1642, R² = 0.0270)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.344 x + 16.384

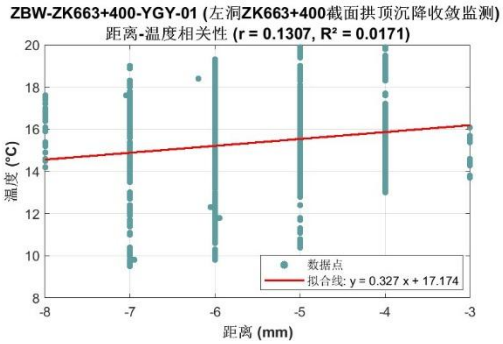
ZBW-ZK663+400-YGY-01 (左洞ZK663+400截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1307, R² = 0.0171)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.327 x + 17.174

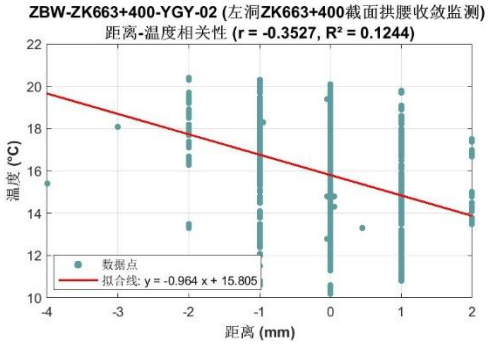
ZBW-ZK663+400-YGY-02 (左洞ZK663+400截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.3527, R² = 0.1244)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.964 x + 15.805

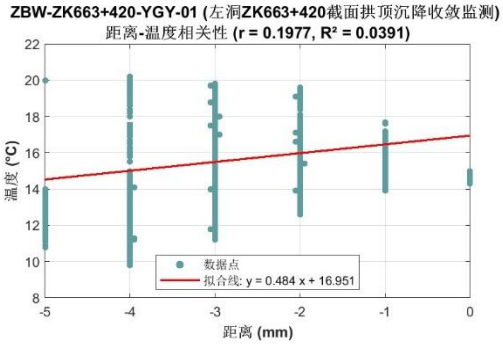
ZBW-ZK663+420-YGY-01 (左洞ZK663+420截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.1977, R² = 0.0391)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.484 x + 16.951

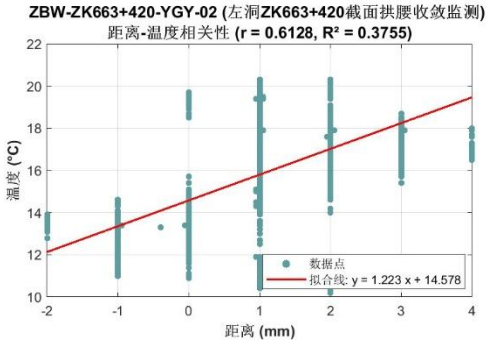
ZBW-ZK663+420-YGY-02 (左洞ZK663+420截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6128, R² = 0.3755)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.223 x + 14.578

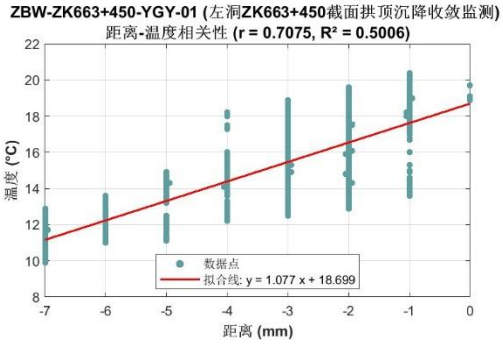
ZBW-ZK663+450-YGY-01 (左洞ZK663+450截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7075, R² = 0.5006)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.077 x + 18.699

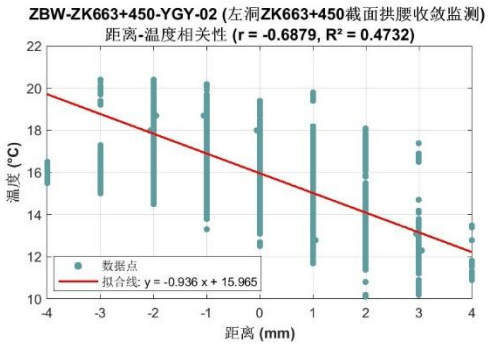
ZBW-ZK663+450-YGY-02 (左洞ZK663+450截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.6879, R² = 0.4732)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.936 x + 15.965

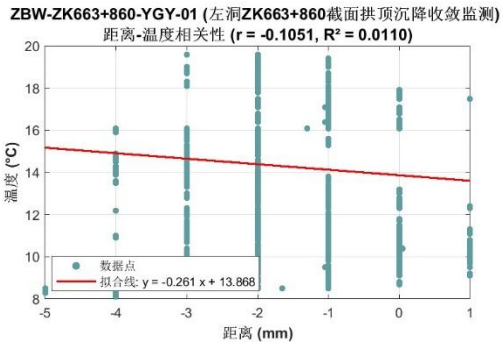
ZBW-ZK663+860-YGY-01 (左洞ZK663+860截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.1051, R² = 0.0110)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -0.261 x + 13.868

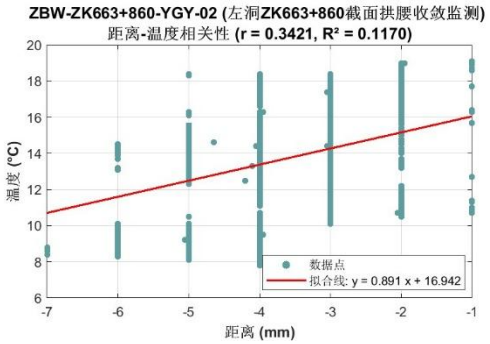
ZBW-ZK663+860-YGY-02 (左洞ZK663+860截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3421, R² = 0.1170)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.891 x + 16.942

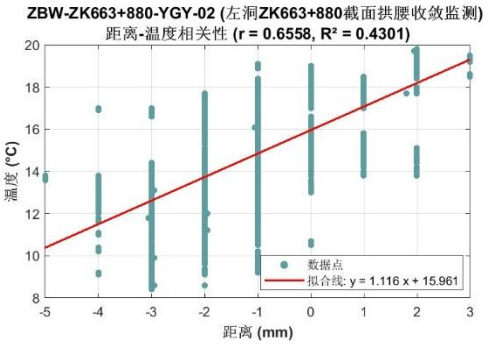
ZBW-ZK663+880-YGY-02 (左洞ZK663+880截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6558, R² = 0.4301)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.116 x + 15.961

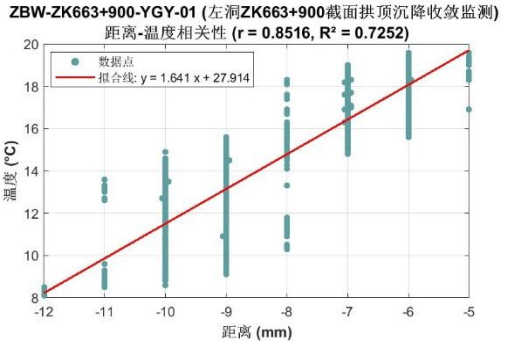
ZBW-ZK663+900-YGY-01 (左洞ZK663+900截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8516, R² = 0.7252)
数据点
拟合线: y = 1.641 x + 27.914
温度 (°C)
距离 (mm)

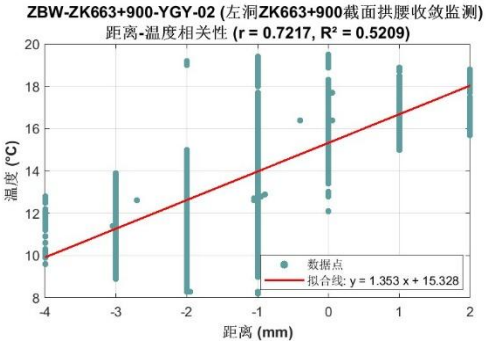
ZBW-ZK663+900-YGY-02 (左洞ZK663+900截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7217, R² = 0.5209)
数据点
拟合线: y = 1.353 x + 15.328
温度 (°C)
距离 (mm)

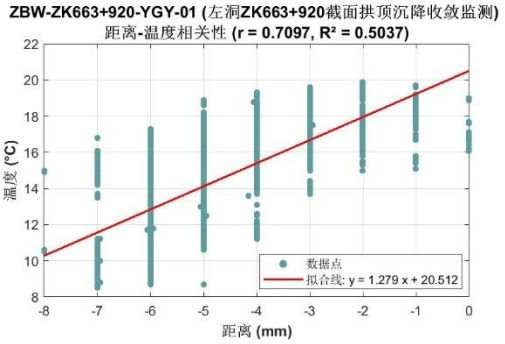
ZBW-ZK663+920-YGY-01 (左洞ZK663+920截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7097, R² = 0.5037)
数据点
拟合线: y = 1.279 x + 20.512
温度 (°C)
距离 (mm)

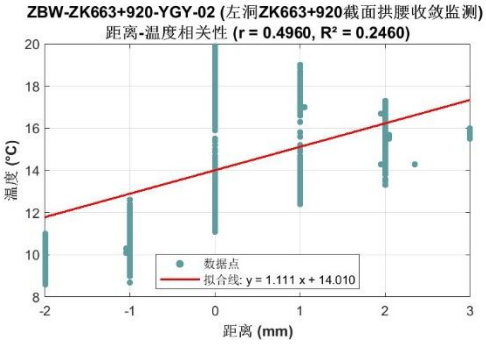
ZBW-ZK663+920-YGY-02 (左洞ZK663+920截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.4960, R² = 0.2460)
数据点
拟合线: y = 1.111 x + 14.010
温度 (°C)
距离 (mm)

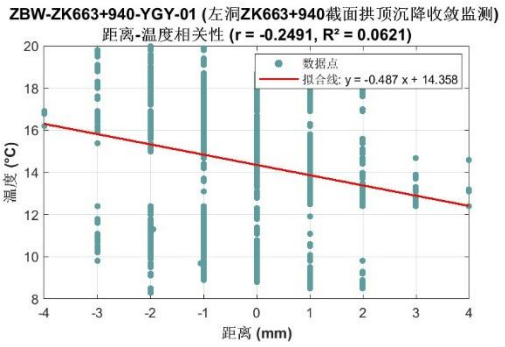
ZBW-ZK663+940-YGY-01 (左洞ZK663+940截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.2491, R² = 0.0621)
数据点
拟合线: y = -0.487 x + 14.358
温度 (°C)
距离 (mm)

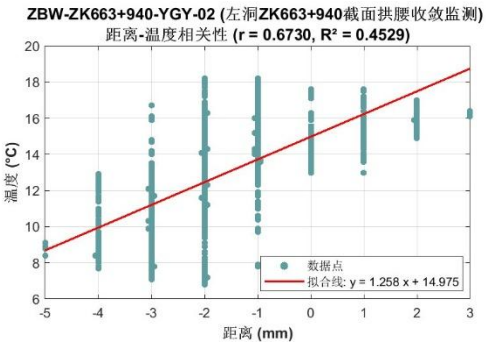
ZBW-ZK663+940-YGY-02 (左洞ZK663+940截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6730, R² = 0.4529)
数据点
拟合线: y = 1.258 x + 14.975
温度 (°C)
距离 (mm)

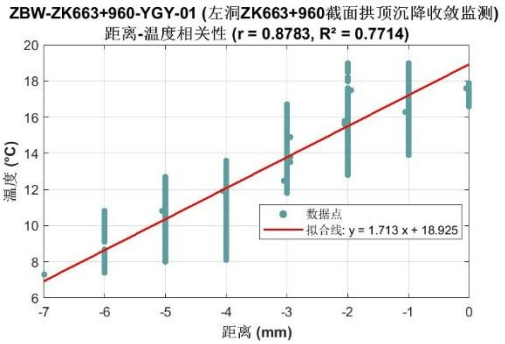
ZBW-ZK663+960-YGY-01 (左洞ZK663+960截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8783, R² = 0.7714)
数据点
拟合线: y = 1.713 x + 18.925
温度 (°C)
距离 (mm)

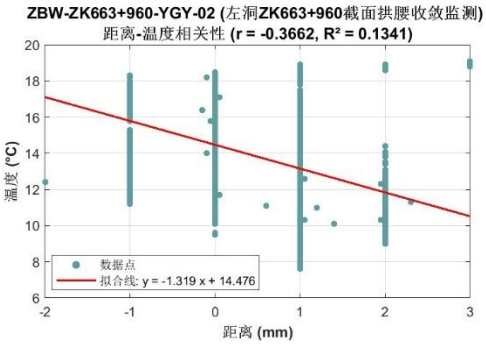
ZBW-ZK663+960-YGY-02 (左洞ZK663+960截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.3662, R² = 0.1341)
数据点
拟合线: y = -1.319 x + 14.476
温度 (°C)
距离 (mm)

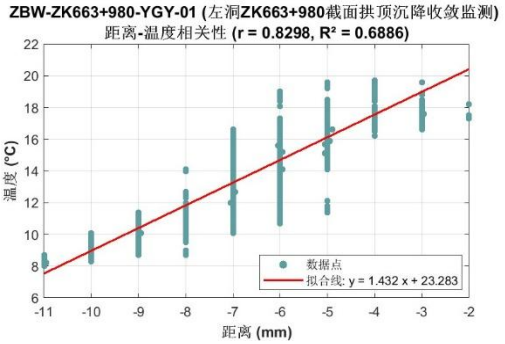
ZBW-ZK663+980-YGY-01 (左洞ZK663+980截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.8298, R² = 0.6886)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.432 x + 23.283

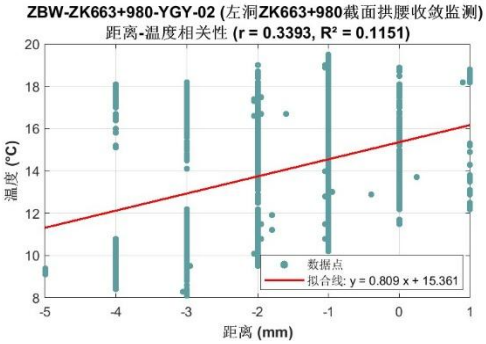
ZBW-ZK663+980-YGY-02 (左洞ZK663+980截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3393, R² = 0.1151)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.809 x + 15.361

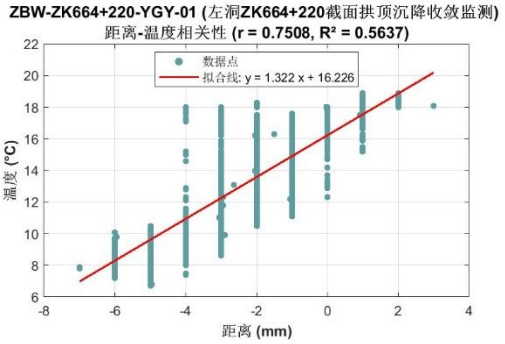
ZBW-ZK664+220-YGY-01 (左洞ZK664+220截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.7508, R² = 0.5637)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.322 x + 16.226

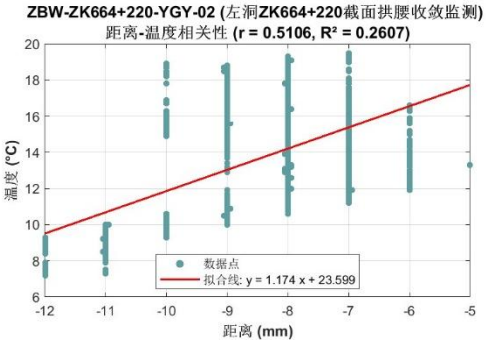
ZBW-ZK664+220-YGY-02 (左洞ZK664+220截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.5106, R² = 0.2607)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.174 x + 23.599

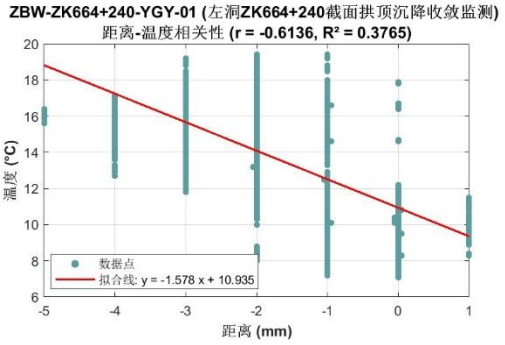
ZBW-ZK664+240-YGY-01 (左洞ZK664+240截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = -0.6136, R² = 0.3765)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = -1.578 x + 10.935

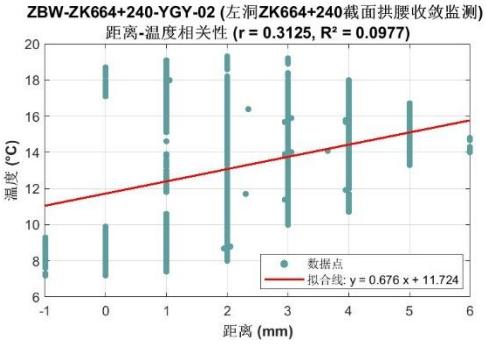
ZBW-ZK664+240-YGY-02 (左洞ZK664+240截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.3125, R² = 0.0977)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.676 x + 11.724

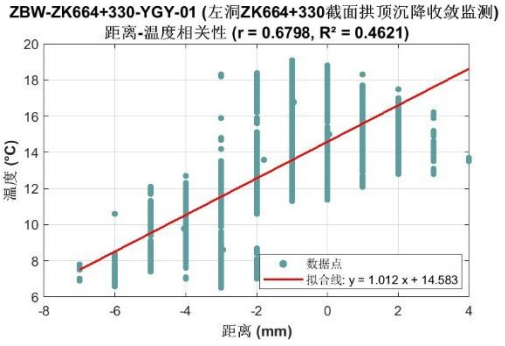
ZBW-ZK664+330-YGY-01 (左洞ZK664+330截面拱顶沉降收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.6798, R² = 0.4621)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 1.012 x + 14.583

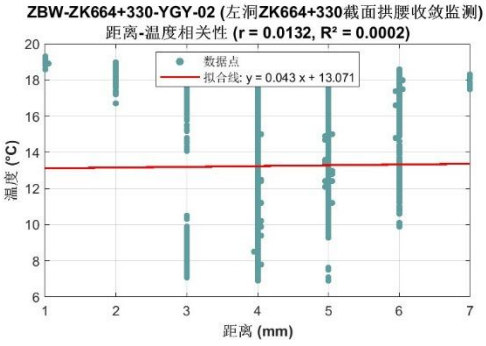
ZBW-ZK664+330-YGY-02 (左洞ZK664+330截面拱腰收敛监测)
距离-温度相关性 (r = 0.0132, R² = 0.0002)
温度 (°C)
距离 (mm)
数据点
拟合线: y = 0.043 x + 13.071

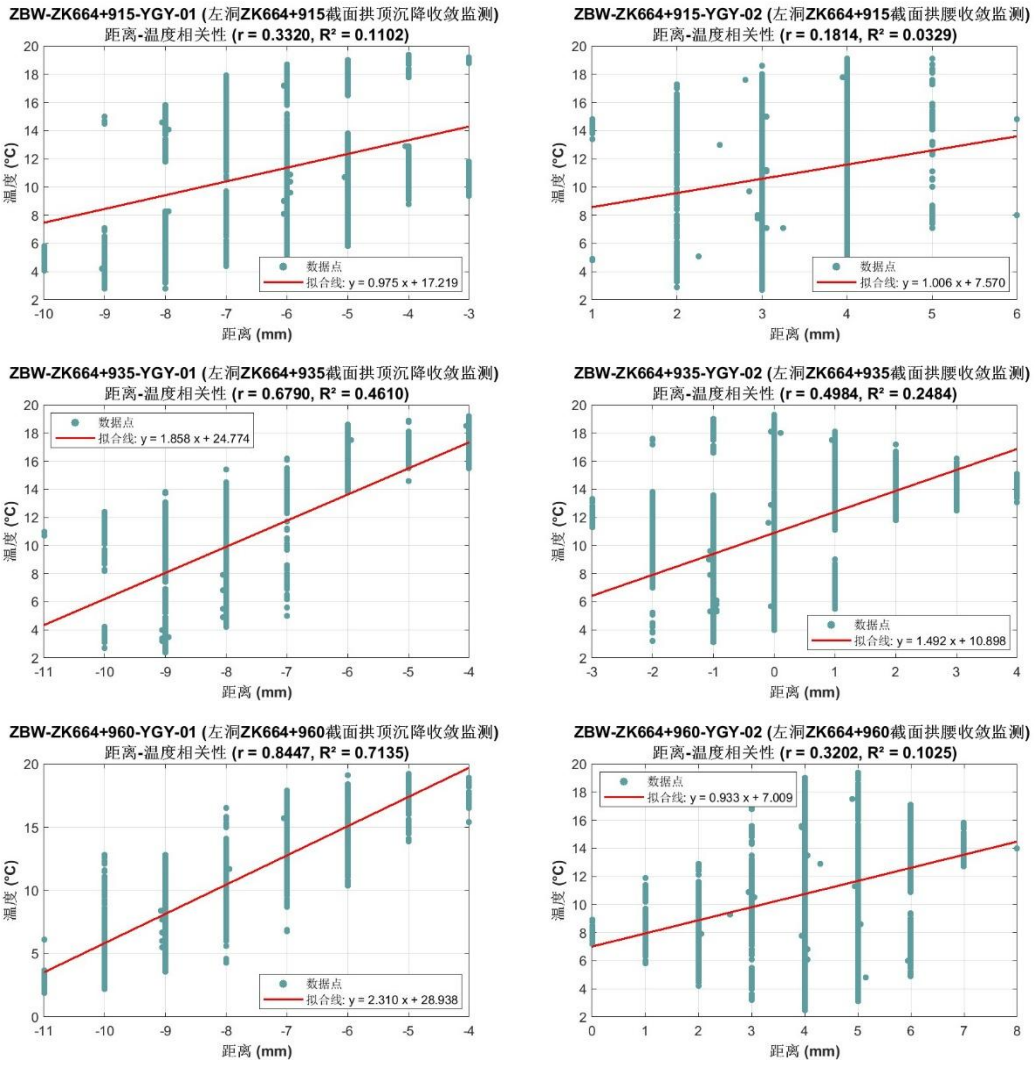

图 3.3-1 拱顶沉降、拱腰收敛时程曲线图

表 3.3-1 拱顶沉降、拱腰收敛数据统计表

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK658+740-YGY-01	右洞YK658+740截面拱顶沉降收敛监测	1	-10	11	-5.29	2025-12-16 23:09:50	2026-01-02 22:41:09	19.8	1.6	18.2	10.28	2026-01-18 15:41:40	2026-01-22 01:41:47	0.695
ZBW-YK658+740-YGY-02	右洞YK658+740截面拱腰收敛监测	2	-5	7	-1.94	2025-12-16 14:29:58	2026-01-18 00:11:47	19.2	1.8	17.4	10.11	2026-01-18 15:31:48	2026-01-22 01:41:55	0.1584
ZBW-YK658+765-YGY-01	右洞YK658+765截面拱顶沉降收敛监测	-2	-11	9	-6.48	2025-12-17 16:50:08	2026-01-22 02:12:09	19.5	1.9	17.6	10.22	2026-01-18 15:41:56	2026-01-22 01:42:03	0.9096
ZBW-YK658+765-YGY-02	右洞YK658+765截面拱腰收敛监测	9	-3	12	1.22	2026-01-13 08:21:54	2025-12-16 13:40:14	19.3	2.3	17	10.33	2026-01-18 15:42:04	2026-01-22 01:42:11	0.4986
ZBW-YK658+830-YGY-01	右洞YK658+830截面拱顶沉降收敛监测	-2	-8	6	-5.05	2025-12-15 00:53:04	2026-01-17 10:32:10	19.1	1.7	17.4	10.2	2026-01-18 15:42:12	2026-01-22 02:32:20	-0.2377
ZBW-YK658+830-YGY-02	右洞YK658+830截面拱腰收敛监测	2	-9	11	-4.26	2026-01-09 14:42:02	2026-01-04 20:51:53	19.2	2.1	17.1	10.47	2026-01-18 15:42:21	2026-01-22 02:32:28	0.7134

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK658+850-YGY-01	右洞YK658+850截面拱顶沉降收敛监测	-2	-7	5	-4.43	2026-01-07 16:22:07	2026-01-03 03:31:58	19.1	2.3	16.8	10.39	2026-01-18 15:42:29	2026-01-22 02:32:36	-0.2834
ZBW-YK658+850-YGY-02	右洞YK658+850截面拱腰收敛监测	6	-2	8	1.46	2026-01-13 07:52:26	2025-12-18 22:10:51	18.9	2.5	16.4	10.47	2026-01-18 15:32:37	2026-01-22 02:32:44	-0.469
ZBW-YK658+960-YGY-01	右洞YK658+960截面拱顶沉降收敛监测	-5	-9	4	-6.61	2025-12-15 16:23:05	2026-01-14 05:02:36	19	3.3	15.7	11.11	2026-01-18 15:42:45	2026-01-22 02:32:52	0.6536
ZBW-YK658+960-YGY-02	右洞YK658+960截面拱腰收敛监测	6	-5	11	-0.52	2026-01-03 00:12:29	2026-01-25 22:13:07	18.5	3.1	15.4	10.86	2026-01-18 15:42:53	2026-01-22 02:33:00	-0.3578
ZBW-YK658+980-YGY-01	右洞YK658+980截面拱顶沉降收敛监测	-1	-7	6	-4.48	2026-01-01 09:11:06	2026-01-02 07:11:08	18.6	2.5	16.1	10.62	2026-01-18 15:41:40	2026-01-22 02:31:47	0.1809
ZBW-YK658+980-YGY-02	右洞YK658+980截面拱腰收敛监测	4	-7	11	-1.3	2025-12-17 17:30:00	2026-01-18 04:21:47	18.7	3	15.7	10.99	2026-01-18 15:41:48	2026-01-22 02:31:55	0.0647

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK659+000-YGY-01	右洞YK659+000截面拱顶沉降收敛监测	1	-6	7	-2.42	2025-12-17 12:40:07	2026-01-25 16:02:10	18.4	2.9	15.5	10.71	2026-01-18 15:41:56	2026-01-22 02:32:04	0.3606
ZBW-YK659+000-YGY-02	右洞YK659+000截面拱腰收敛监测	3	-4	7	-0.61	2025-12-17 17:20:16	2026-01-08 10:51:44	18.6	3.4	15.2	10.99	2026-01-18 15:42:04	2026-01-22 01:42:11	0.1719
ZBW-YK659+020-YGY-01	右洞YK659+020截面拱顶沉降收敛监测	-2	-10	8	-5.79	2025-12-16 11:50:21	2026-01-21 18:42:19	18.6	3.3	15.3	10.95	2026-01-18 15:42:12	2026-01-22 02:32:20	0.8428
ZBW-YK659+020-YGY-02	右洞YK659+020截面拱腰收敛监测	2	-3	5	0.31	2025-12-16 11:40:29	2026-01-03 14:51:51	18.6	3.6	15	11.16	2026-01-18 15:32:21	2026-01-22 02:32:28	0.1741
ZBW-YK659+040-YGY-01	右洞YK659+040截面拱顶沉降收敛监测	-3	-9	6	-5.61	2025-12-16 11:20:38	2026-01-10 12:12:12	18.6	3.1	15.5	11	2026-01-18 15:42:29	2026-01-22 01:42:36	0.3004
ZBW-YK659+040-YGY-02	右洞YK659+040截面拱腰收敛监测	5	-5	10	-0.92	2026-01-13 03:52:25	2025-12-15 06:23:29	18.6	3.3	15.3	11.15	2026-01-18 15:42:37	2026-01-22 02:32:44	0.4294

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK659+060-YGY-01	右洞YK659+060截面拱顶沉降收敛监测	-5	-10	5	-7.71	2026-01-18 00:51:39	2026-01-02 08:11:08	18.3	5.1	13.2	11.69	2026-01-18 15:51:40	2026-01-03 07:21:10	0.3555
ZBW-YK659+060-YGY-02	右洞YK659+060截面拱腰收敛监测	7	-2	9	4.1	2025-12-15 05:02:40	2026-01-17 09:21:46	18.3	5	13.3	11.65	2026-01-18 15:41:48	2026-01-03 07:21:18	-0.62
ZBW-YK659+080-YGY-01	右洞YK659+080截面拱顶沉降收敛监测	2	-3	5	-0.79	2025-12-15 22:52:17	2025-12-17 05:30:07	21.8	7	14.8	14.7	2026-01-18 15:41:56	2026-01-22 02:32:04	-0.2599
ZBW-YK659+080-YGY-02	右洞YK659+080截面拱腰收敛监测	3	-12	15	-6.94	2026-01-16 13:02:00	2026-01-02 18:31:33	18.3	4.1	14.2	11.34	2026-01-18 15:42:04	2026-01-22 02:32:12	0.6709
ZBW-YK659+100-YGY-01	右洞YK659+100截面拱顶沉降收敛监测	0	-5	5	-2.35	2025-12-15 02:03:04	2026-01-02 23:31:42	18.4	3.1	15.3	11	2026-01-18 15:42:12	2026-01-22 02:32:20	0.4451
ZBW-YK659+100-YGY-02	右洞YK659+100截面拱腰收敛监测	2	-6	8	-1.76	2026-01-07 05:51:58	2025-12-15 04:13:13	18.5	3.6	14.9	11.32	2026-01-18 15:42:21	2026-01-22 01:42:28	0.2779

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK659+150-YGY-01	右洞YK659+150截面拱顶沉降收敛监测	-2	-11	9	-6.69	2025-12-16 11:50:38	2026-01-26 01:52:43	18.6	4.1	14.5	11.57	2026-01-18 15:42:29	2026-01-03 07:31:58	0.5315
ZBW-YK659+150-YGY-02	右洞YK659+150截面拱腰收敛监测	4	-4	8	-0.42	2026-01-20 23:22:42	2026-01-16 04:12:32	18.1	4	14.1	11.34	2026-01-18 15:42:37	2026-01-03 07:42:07	-0.7912
ZBW-YK659+250-YGY-01	右洞YK659+250截面拱顶沉降收敛监测	9	-2	11	2.49	2026-01-24 13:51:52	2025-12-15 16:22:01	18.1	5.1	13	11.95	2026-01-18 15:21:40	2026-01-03 07:31:10	-0.7236
ZBW-YK659+250-YGY-02	右洞YK659+250截面拱腰收敛监测	-2	-8	6	-4.83	2026-01-19 11:21:50	2026-01-23 06:11:58	16.9	3.5	13.4	10.53	2026-01-18 15:41:48	2026-01-03 07:31:18	0.7843
ZBW-YK659+270-YGY-01	右洞YK659+270截面拱顶沉降收敛监测	0	-5	5	-2.68	2026-01-01 08:41:22	2026-01-03 01:21:26	18.4	5.1	13.3	12.14	2026-01-18 15:41:56	2026-01-03 07:31:26	0.4018
ZBW-YK659+270-YGY-02	右洞YK659+270截面拱腰收敛监测	8	-2	10	3.97	2026-01-20 19:22:09	2026-01-19 06:12:06	18	4.9	13.1	11.91	2026-01-18 15:22:04	2026-01-03 07:41:34	-0.2861

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK659+290-YGY-01	右洞YK659+290截面拱顶沉降收敛监测	-4	-14.05	10.05	-9.25	2025-12-18 04:50:25	2026-01-21 10:52:18	18.3	5	13.3	12.06	2026-01-18 15:22:12	2026-01-03 07:31:42	0.5622
ZBW-YK659+290-YGY-02	右洞YK659+290截面拱腰收敛监测	3	-5	8	-1.7	2026-01-17 13:22:18	2026-01-01 04:11:46	17.4	4.4	13	11.37	2026-01-18 15:42:21	2026-01-03 07:31:50	0.3322
ZBW-YK659+310-YGY-01	右洞YK659+310截面拱顶沉降收敛监测	-6	-14	8	-9.05	2026-01-18 15:22:29	2026-01-03 00:31:58	18.1	5.1	13	12.22	2026-01-18 15:42:29	2026-01-03 07:41:58	0.7518
ZBW-YK659+310-YGY-02	右洞YK659+310截面拱腰收敛监测	3	-5	8	-1.92	2026-01-16 13:22:32	2025-12-15 00:03:28	18.1	5.5	12.6	12.23	2026-01-18 15:52:37	2026-01-22 02:42:44	0.8091
ZBW-YK659+550-YGY-01	右洞YK659+550截面拱顶沉降收敛监测	-5	-12	7	-8.25	2026-01-20 18:01:45	2026-01-23 01:11:49	17.8	6	11.8	12.46	2026-01-18 15:41:40	2026-01-03 07:31:10	0.8244
ZBW-YK659+550-YGY-02	右洞YK659+550截面拱腰收敛监测	5	-3	8	0.39	2026-01-29 01:52:09	2026-01-18 03:21:47	17.5	6	11.5	12.24	2026-01-18 15:51:48	2026-01-03 07:31:18	-0.4983

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK659+570-YGY-01	右洞YK659+570截面拱顶沉降收敛监测	-6	-11	5	-8.24	2025-12-16 12:50:05	2026-01-25 05:12:09	17.7	6.2	11.5	12.51	2026-01-18 15:21:56	2026-01-03 07:31:26	0.6428
ZBW-YK659+570-YGY-02	右洞YK659+570截面拱腰收敛监测	4	-2	6	1.4	2025-12-15 03:52:56	2026-01-26 22:22:21	17.8	6.6	11.2	12.78	2026-01-18 15:42:04	2026-01-03 07:31:34	-0.234
ZBW-YK659+620-YGY-01	右洞YK659+620截面拱顶沉降收敛监测	-3	-13	10	-7.44	2025-12-15 16:22:33	2026-01-22 04:32:20	18	6.6	11.4	12.95	2026-01-18 15:42:12	2026-01-03 07:31:42	0.8779
ZBW-YK659+620-YGY-02	右洞YK659+620截面拱腰收敛监测	-1	-6	5	-2.74	2026-01-15 18:42:15	2026-01-20 09:12:24	17	14.6	2.4	15.6	2026-01-18 15:42:21	2026-01-20 17:52:25	0.363
ZBW-YK659+680-YGY-01	右洞YK659+680截面拱顶沉降收敛监测	-3	-13	10	-8.33	2025-12-16 14:00:38	2026-01-22 07:02:36	17.6	6.7	10.9	12.77	2026-01-18 15:52:29	2026-01-03 07:31:58	0.8731
ZBW-YK659+680-YGY-02	右洞YK659+680截面拱腰收敛监测	2	-7	9	-1.77	2025-12-16 03:02:58	2026-01-20 21:42:42	17.6	7.1	10.5	12.99	2026-01-18 15:32:37	2026-01-03 07:32:07	0.055

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK661+640-YGY-01	右洞YK661+640截面拱顶沉降收敛监测	-2	-6	4	-4.25	2025-12-15 02:12:32	2026-01-16 14:01:36	18.3	12.3	6	15.53	2025-12-17 05:09:51	2026-01-03 08:31:10	0.2128
ZBW-YK661+640-YGY-02	右洞YK661+640截面拱腰收敛监测	2	-3	5	-0.34	2025-12-15 06:33:13	2026-01-25 19:52:35	19.5	13.6	5.9	16.83	2025-12-17 04:50:31	2026-01-03 08:31:50	0.3372
ZBW-YK661+680-YGY-01	右洞YK661+680截面拱顶沉降收敛监测	-1	-7	6	-4.27	2025-12-15 03:32:40	2026-01-06 17:51:25	19.7	13.6	6.1	16.84	2025-12-17 05:09:59	2026-01-03 08:31:18	-0.0843
ZBW-YK661+680-YGY-02	右洞YK661+680截面拱腰收敛监测	3	-1	4	1.23	2025-12-16 00:02:17	2026-01-18 00:11:55	19	13.2	5.8	16.23	2025-12-17 05:40:07	2026-01-03 08:21:26	0.6956
ZBW-YK661+710-YGY-01	右洞YK661+710截面拱顶沉降收敛监测	-3	-12	9	-7.43	2025-12-15 00:42:56	2026-01-03 06:51:34	19.5	13.6	5.9	16.77	2025-12-19 05:40:19	2026-01-03 08:21:34	0.8171
ZBW-YK661+710-YGY-02	右洞YK661+710截面拱腰收敛监测	3	-1	4	0.3	2025-12-17 04:00:23	2026-01-04 00:41:44	19.3	13.6	5.7	16.7	2025-12-17 05:50:23	2026-01-03 08:21:42	0.3741

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK661+730-YGY-01	右洞YK661+730截面拱顶沉降收敛监测	-3	-6	3	-4.54	2025-12-15 02:52:32	2025-12-16 01:12:01	19.6	13.7	5.9	16.87	2025-12-19 05:39:55	2026-01-03 08:21:10	-0.4035
ZBW-YK661+730-YGY-02	右洞YK661+730截面拱腰收敛监测	5	-2	7	1.67	2026-01-07 22:51:27	2026-01-18 03:21:49	19.6	14	5.6	17.03	2025-12-19 05:50:03	2026-01-03 08:31:18	-0.1413
ZBW-YK661+810-YGY-01	右洞YK661+810截面拱顶沉降收敛监测	-5	-9	4	-7.54	2025-12-16 17:50:06	2026-01-02 05:01:24	19.3	13.6	5.7	16.68	2025-12-16 06:52:18	2026-01-03 08:21:26	0.8527
ZBW-YK661+810-YGY-02	右洞YK661+810截面拱腰收敛监测	5	-1.05	6.05	1.8	2026-01-07 22:41:43	2025-12-17 04:50:15	19.9	14.3	5.6	17.29	2025-12-19 05:50:19	2026-01-03 08:21:34	-0.1657
ZBW-YK661+840-YGY-01	右洞YK661+840截面拱顶沉降收敛监测	-3	-9	6	-6.26	2026-01-03 01:21:50	2025-12-15 02:13:12	19.9	14.6	5.3	17.49	2025-12-16 07:02:42	2026-01-03 08:21:50	-0.6621
ZBW-YK661+840-YGY-02	右洞YK661+840截面拱腰收敛监测	2	-2	4	-0.6	2026-01-17 18:22:11	2025-12-15 02:43:04	20.3	15	5.3	17.95	2025-12-16 06:52:34	2026-01-03 08:31:42	0.0391

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK662+450-YGY-01	右洞YK662+450截面拱顶沉降收敛监测	8	4	4	6.56	2025-12-15 18:52:01	2026-01-16 20:41:37	19.6	14.9	4.7	17.38	2025-12-18 05:29:53	2026-01-29 06:52:01	-0.2326
ZBW-YK662+450-YGY-02	右洞YK662+450截面拱腰收敛监测	6	-3	9	1.44	2025-12-16 20:19:58	2026-01-03 12:51:19	20.1	15.4	4.7	17.96	2025-12-18 05:20:01	2026-01-31 07:02:13	0.5935
ZBW-YK662+500-YGY-01	右洞YK662+500截面拱顶沉降收敛监测	0	-3	3	-1.64	2026-01-03 06:51:26	2026-01-16 02:41:51	20.7	15.8	4.9	18.46	2025-12-18 05:30:09	2026-01-31 07:02:21	-0.0834
ZBW-YK662+500-YGY-02	右洞YK662+500截面拱腰收敛监测	3	-4	7	-0.69	2026-01-23 20:22:15	2025-12-16 01:42:26	19.8	14.9	4.9	17.64	2025-12-18 05:30:17	2026-01-31 07:02:29	-0.455
ZBW-YK662+550-YGY-01	右洞YK662+550截面拱顶沉降收敛监测	-3	-7	4	-5.32	2025-12-16 00:32:34	2026-01-07 06:51:50	20.5	15.4	5.1	18.3	2025-12-18 05:20:25	2026-01-31 07:02:37	0.3261
ZBW-YK662+550-YGY-02	右洞YK662+550截面拱腰收敛监测	-1	-6	5	-3.18	2026-01-08 15:42:01	2026-01-15 06:42:14	20.2	15.2	5	18.04	2025-12-18 05:20:33	2026-01-31 07:02:45	-0.2907

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK662+730-YGY-01	右洞YK662+730截面拱顶沉降收敛监测	6	-2	8	3.04	2026-01-31 01:42:05	2025-12-15 04:42:32	20.7	15.1	5.6	18.55	2025-12-18 05:29:53	2026-01-31 07:22:05	-0.7417
ZBW-YK662+730-YGY-02	右洞YK662+730截面拱腰收敛监测	-2	-7	5	-4.01	2025-12-15 04:22:40	2026-01-14 23:31:46	20.5	15	5.5	18.33	2025-12-18 05:30:01	2026-01-31 07:02:13	-0.3037
ZBW-YK662+750-YGY-01	右洞YK662+750截面拱顶沉降收敛监测	5	-1	6	2.46	2026-01-08 23:51:37	2026-01-18 06:01:56	20	14.5	5.5	17.86	2025-12-18 05:30:09	2026-01-31 07:02:21	-0.2078
ZBW-YK662+750-YGY-02	右洞YK662+750截面拱腰收敛监测	3	-2	5	0.89	2025-12-15 00:02:56	2026-01-18 23:02:05	20.4	14.9	5.5	18.25	2025-12-18 03:00:17	2026-01-31 07:02:29	0.2971
ZBW-YK662+770-YGY-01	右洞YK662+770截面拱顶沉降收敛监测	9	0	9	3.17	2025-12-17 06:40:23	2026-01-08 23:41:53	20.5	14.9	5.6	18.39	2025-12-18 03:10:25	2026-01-31 07:12:37	0.2335
ZBW-YK662+770-YGY-02	右洞YK662+770截面拱腰收敛监测	3	-2	5	0.77	2025-12-15 00:33:12	2026-01-19 21:52:23	20.7	15.2	5.5	18.51	2025-12-18 03:10:33	2026-01-31 07:02:45	0.218

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-YK664+710-YGY-01	右洞YK664+710截面拱顶沉降收敛监测	-4	-10	6	-6.21	2025-12-15 02:22:32	2026-01-07 01:21:17	19.1	6.2	12.9	15.71	2025-12-18 01:49:53	2026-01-20 03:41:44	0.5523
ZBW-YK664+710-YGY-02	右洞YK664+710截面拱腰收敛监测	0	-8	8	-2.62	2026-01-09 23:21:31	2026-01-07 02:21:25	20.3	6.2	14.1	16.84	2025-12-18 01:50:01	2026-01-07 05:31:26	0.73
ZBW-YK664+730-YGY-01	右洞YK664+730截面拱顶沉降收敛监测	3	-3	6	0.65	2025-12-15 02:42:48	2026-01-18 04:31:55	20.1	6.3	13.8	16.57	2025-12-18 01:50:09	2026-01-07 05:01:34	-0.2544
ZBW-YK664+730-YGY-02	右洞YK664+730截面拱腰收敛监测	1	-5	6	-1.98	2026-01-01 04:21:30	2026-01-19 18:32:07	20.1	6.3	13.8	16.57	2025-12-18 01:50:17	2026-01-07 05:01:42	0.3868
ZBW-YK664+750-YGY-01	右洞YK664+750截面拱顶沉降收敛监测	0	-8	8	-2.58	2026-01-05 08:51:46	2026-01-07 02:11:50	20.6	6.9	13.7	17.13	2025-12-18 01:50:25	2026-01-07 03:31:50	0.7276
ZBW-YK664+750-YGY-02	右洞YK664+750截面拱腰收敛监测	6	0	6	2.7	2026-01-24 16:02:32	2026-01-08 03:02:00	20.4	6.2	14.2	16.73	2025-12-18 01:50:33	2026-01-07 05:41:58	0.1608

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK659+010-YGY-01	左洞 ZK659+010 截面拱顶沉降收敛监测	-4	-13	9	-7.59	2025-12-15 16:22:01	2026-01-21 23:51:47	19.5	5.2	14.3	14.27	2026-01-17 17:51:38	2026-01-22 02:11:47	0.8926
ZBW-ZK659+010-YGY-02	左洞 ZK659+010 截面拱腰收敛监测	3	-5	8	-0.34	2026-01-04 21:51:21	2026-01-22 08:41:56	18.8	5.1	13.7	13.8	2026-01-17 17:51:47	2026-01-22 02:11:55	0.5267
ZBW-ZK659+036-YGY-01	左洞 ZK659+036 截面拱顶沉降收敛监测	-2	-8	6	-4.99	2025-12-15 00:02:48	2026-01-25 11:22:10	18.5	3.4	15.1	13.04	2026-01-17 18:11:55	2026-01-22 02:42:04	0.3207
ZBW-ZK659+036-YGY-02	左洞 ZK659+036 截面拱腰收敛监测	0	-5	5	-2.4	2026-01-02 19:51:33	2025-12-19 08:40:19	19.4	4.3	15.1	13.97	2026-01-17 18:12:03	2026-01-22 02:42:12	-0.1822
ZBW-ZK659+180-YGY-01	左洞 ZK659+180 截面拱顶沉降收敛监测	2	-4	6	-0.88	2026-01-07 02:31:50	2026-01-09 23:01:55	19.3	5.3	14	14.44	2025-12-17 17:30:31	2026-01-22 01:42:20	0.742
ZBW-ZK659+180-YGY-02	左洞 ZK659+180 截面拱腰收敛监测	-2	-11	9	-6.55	2025-12-15 21:02:41	2026-01-21 21:32:27	19.3	5.1	14.2	14.33	2025-12-17 18:10:38	2026-01-03 07:31:50	0.6738

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK659+206-YGY-01	左洞ZK659+206截面拱顶沉降收敛监测	1	-6	7	-2.66	2026-01-07 11:01:18	2026-01-03 02:31:10	19.9	6	13.9	15.05	2025-12-17 18:19:52	2026-01-22 02:11:47	0.327
ZBW-ZK659+206-YGY-02	左洞ZK659+206截面拱腰收敛监测	0	-5	5	-2.73	2026-01-07 19:41:27	2025-12-17 12:59:59	19.6	6.1	13.5	14.86	2025-12-17 17:50:00	2026-01-22 02:11:55	0.531
ZBW-ZK659+226-YGY-01	左洞ZK659+226截面拱顶沉降收敛监测	-2	-8	6	-5.07	2025-12-15 18:52:17	2026-01-21 22:42:03	19.5	5.8	13.7	14.71	2025-12-17 17:20:08	2026-01-22 02:42:04	0.411
ZBW-ZK659+226-YGY-02	左洞ZK659+226截面拱腰收敛监测	0	-6	6	-3.46	2026-01-09 19:11:47	2026-01-02 02:41:32	19.7	6.3	13.4	15	2025-12-17 17:30:22	2026-01-03 07:31:34	0.6129
ZBW-ZK659+246-YGY-01	左洞ZK659+246截面拱顶沉降收敛监测	4	-4	8	0.51	2025-12-16 22:50:22	2026-01-21 01:42:18	20	6.8	13.2	15.43	2025-12-17 17:20:24	2026-01-22 02:42:20	0.7578
ZBW-ZK659+246-YGY-02	左洞ZK659+246截面拱腰收敛监测	8	-2	10	3.64	2025-12-15 17:52:41	2026-01-02 09:01:49	19.6	6.1	13.5	14.88	2025-12-17 17:20:32	2026-01-22 02:12:28	0.8005

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK659+266-YGY-01	左洞ZK659+266截面拱顶沉降收敛监测	-2	-8	6	-4.72	2025-12-15 18:12:01	2026-01-02 22:21:09	19.4	6.2	13.2	14.73	2025-12-17 17:19:52	2026-01-22 02:11:47	0.5115
ZBW-ZK659+266-YGY-02	左洞ZK659+266截面拱腰收敛监测	5	-4	9	0.92	2025-12-18 20:30:02	2026-01-21 19:11:55	19.5	6.4	13.1	14.87	2025-12-17 17:20:00	2026-01-22 02:41:55	0.7334
ZBW-ZK659+290-YGY-01	左洞ZK659+290截面拱顶沉降收敛监测	1	-6	7	-2.11	2025-12-15 20:32:17	2026-01-22 15:32:04	19.2	5.7	13.5	14.6	2026-01-17 17:01:54	2026-01-22 02:12:03	0.6031
ZBW-ZK659+290-YGY-02	左洞ZK659+290截面拱腰收敛监测	3	-2	5	0.38	2026-01-02 04:31:32	2026-01-17 02:12:01	19.7	6.3	13.4	15.19	2026-01-17 16:22:03	2026-01-03 07:31:34	-0.3685
ZBW-ZK659+370-YGY-01	左洞ZK659+370截面拱顶沉降收敛监测	-5	-12	7	-9.36	2025-12-16 20:00:22	2026-01-21 09:22:18	20	6.9	13.1	15.49	2025-12-17 17:20:24	2026-01-22 02:12:20	0.5329
ZBW-ZK659+370-YGY-02	左洞ZK659+370截面拱腰收敛监测	-3	-9	6	-7.02	2026-01-26 15:12:36	2025-12-16 01:52:42	18.6	5.7	12.9	14.12	2025-12-17 17:30:37	2026-01-22 02:12:28	0.436

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK659+390-YGY-01	左洞 ZK659+390 截面拱顶沉降收敛监测	1	-9	10	-3.13	2025-12-19 04:39:55	2026-01-22 01:41:47	19.8	6.9	12.9	15.36	2025-12-17 17:19:52	2026-01-03 07:31:10	0.8605
ZBW-ZK659+390-YGY-02	左洞 ZK659+390 截面拱腰收敛监测	1	-5	6	-1.62	2026-01-08 05:41:28	2026-01-19 19:31:51	19.4	6.6	12.8	14.95	2025-12-17 17:50:00	2026-01-22 02:41:55	-0.4943
ZBW-ZK659+410-YGY-01	左洞 ZK659+410 截面拱顶沉降收敛监测	0	-6	6	-3.04	2025-12-15 18:12:17	2026-01-03 03:21:26	20.1	7.4	12.7	15.66	2025-12-17 17:20:08	2026-01-22 02:42:04	0.5699
ZBW-ZK659+410-YGY-02	左洞 ZK659+410 截面拱腰收敛监测	6	-7	13	-1.35	2026-01-30 01:02:27	2026-01-03 04:11:34	20.1	7.6	12.5	15.67	2025-12-17 17:50:16	2026-01-22 02:12:12	-0.0131
ZBW-ZK660+600-YGY-01	左洞 ZK660+600 截面拱顶沉降收敛监测	-3	-6	3	-4.85	2025-12-15 16:22:01	2025-12-15 00:02:32	21	13.2	7.8	18.19	2025-12-17 13:09:51	2026-01-22 02:41:47	0.3974
ZBW-ZK660+600-YGY-02	左洞 ZK660+600 截面拱腰收敛监测	-1	-9	8	-4.94	2026-01-02 22:51:17	2026-01-29 07:42:09	21	13.4	7.6	18.25	2025-12-17 12:59:59	2026-01-03 07:31:18	0.0052

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK660+620-YGY-01	左洞 ZK660+620 截面拱顶沉降收敛监测	3	-1	4	1	2026-01-03 08:41:26	2025-12-15 21:42:17	20.8	13.8	7	18.14	2025-12-17 13:10:08	2026-01-03 07:41:26	-0.6747
ZBW-ZK660+620-YGY-02	左洞 ZK660+620 截面拱腰收敛监测	-4	-10	6	-7.6	2025-12-15 17:12:25	2026-01-25 13:02:18	20.9	13.9	7	18.2	2025-12-17 13:10:16	2026-01-03 07:31:34	0.4061
ZBW-ZK660+640-YGY-01	左洞 ZK660+640 截面拱顶沉降收敛监测	-4	-9	5	-6.52	2025-12-16 17:00:22	2026-01-03 03:51:42	21.2	13.5	7.7	18.4	2025-12-17 13:40:24	2026-01-22 07:02:20	0.8246
ZBW-ZK660+640-YGY-02	左洞 ZK660+640 截面拱腰收敛监测	3	-6	9	-2.13	2026-01-25 16:32:34	2026-01-02 13:31:49	20.9	13.4	7.5	18.15	2025-12-17 13:40:32	2026-01-03 07:31:50	-0.2816
ZBW-ZK661+565-YGY-01	左洞 ZK661+565 截面拱顶沉降收敛监测	1	-4	5	-0.91	2026-01-19 17:31:43	2025-12-15 00:42:32	20.6	14.8	5.8	18.21	2025-12-17 13:39:51	2026-01-31 09:32:05	-0.6185
ZBW-ZK661+565-YGY-02	左洞 ZK661+565 截面拱腰收敛监测	3	-4	7	-1.11	2026-01-31 08:22:13	2025-12-15 17:42:09	20.5	14.7	5.8	18.09	2025-12-18 13:50:02	2026-01-31 09:52:13	-0.1796

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK661+640-YGY-01	左洞 ZK661+640 截面拱顶沉降收敛监测	-2	-7	5	-4.39	2026-01-15 13:11:50	2026-01-31 14:32:22	20.8	15	5.8	18.17	2025-12-17 16:10:08	2026-01-31 04:02:21	-0.3867
ZBW-ZK661+640-YGY-02	左洞 ZK661+640 截面拱腰收敛监测	1	-3	4	-1.74	2026-01-31 09:42:29	2025-12-15 00:22:56	20.8	14.7	6.1	18.17	2025-12-17 16:20:16	2026-01-31 09:12:29	-0.1547
ZBW-ZK661+670-YGY-01	左洞 ZK661+670 截面拱顶沉降收敛监测	0	-2	2	-0.98	2025-12-15 16:42:35	2025-12-15 00:03:04	21.2	15.3	5.9	18.7	2025-12-18 04:40:25	2026-01-31 09:32:37	0.4594
ZBW-ZK661+670-YGY-02	左洞 ZK661+670 截面拱腰收敛监测	8	2.95	5.05	4.54	2025-12-15 18:32:41	2026-01-16 14:52:16	20.7	14.8	5.9	18.22	2025-12-18 05:00:33	2026-01-31 09:52:45	0.4106
ZBW-ZK661+690-YGY-01	左洞 ZK661+690 截面拱顶沉降收敛监测	-4	-9	5	-6.13	2025-12-15 00:03:20	2026-01-31 04:02:53	20.4	14	6.4	17.76	2025-12-18 20:50:43	2026-01-31 09:22:53	0.8703
ZBW-ZK661+690-YGY-02	左洞 ZK661+690 截面拱腰收敛监测	0	-6	6	-2.87	2026-01-14 04:02:27	2026-01-19 23:42:40	20.6	14.3	6.3	17.98	2025-12-18 05:00:49	2026-01-31 09:13:02	0.7449

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK661+710-YGY-01	左洞ZK661+710截面拱顶沉降收敛监测	-4	-8	4	-6.04	2025-12-15 06:03:37	2026-01-20 03:42:48	21.2	14.6	6.6	18.51	2025-12-18 16:10:58	2026-01-31 09:43:10	0.656
ZBW-ZK661+710-YGY-02	左洞ZK661+710截面拱腰收敛监测	21	17	4	19.04	2025-12-15 18:53:13	2026-01-15 16:22:47	21	14.5	6.5	18.37	2025-12-18 05:21:05	2026-01-31 09:53:18	0.2588
ZBW-ZK663+380-YGY-01	左洞ZK663+380截面拱顶沉降收敛监测	-4	-9	5	-6.57	2026-01-19 07:11:42	2026-01-26 14:41:56	20	9.7	10.3	15.42	2025-12-31 16:31:05	2026-01-31 11:32:05	0.7906
ZBW-ZK663+380-YGY-02	左洞ZK663+380截面拱腰收敛监测	2	-3	5	-0.68	2026-01-26 07:02:03	2026-01-01 13:11:15	20.6	10.6	10	16.15	2025-12-31 16:11:13	2026-01-31 11:22:13	0.1642
ZBW-ZK663+400-YGY-01	左洞ZK663+400截面拱顶沉降收敛监测	-3	-8	5	-5.79	2026-01-19 15:01:59	2026-01-03 09:51:26	19.9	9.5	10.4	15.28	2025-12-31 16:01:21	2026-01-31 11:32:21	0.1307
ZBW-ZK663+400-YGY-02	左洞ZK663+400截面拱腰收敛监测	2	-4	6	-0.07	2026-01-09 21:11:47	2026-01-28 18:32:24	20.4	10.2	10.2	15.88	2025-12-31 16:11:29	2026-01-31 11:22:29	-0.3527

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK663+420-YGY-01	左洞ZK663+420截面拱顶沉降收敛监测	0	-5	5	-2.8	2026-01-25 16:52:26	2025-12-31 22:11:38	20.2	9.8	10.4	15.59	2025-12-31 16:11:37	2026-01-31 09:52:37	0.1977
ZBW-ZK663+420-YGY-02	左洞ZK663+420截面拱腰收敛监测	4	-2	6	1.03	2026-01-08 12:42:00	2026-01-05 09:41:54	20.3	10.2	10.1	15.84	2025-12-31 16:01:45	2026-01-31 11:22:46	0.6128
ZBW-ZK663+450-YGY-01	左洞ZK663+450截面拱顶沉降收敛监测	0	-7	7	-2.77	2026-01-17 05:32:26	2026-01-20 00:52:32	20.4	9.9	10.5	15.71	2025-12-31 18:41:53	2026-01-31 11:22:54	0.7075
ZBW-ZK663+450-YGY-02	左洞ZK663+450截面拱腰收敛监测	4	-4	8	0.12	2026-01-13 01:42:25	2026-01-27 09:42:54	20.4	10.1	10.3	15.85	2025-12-31 15:52:01	2026-01-31 11:13:02	-0.6879
ZBW-ZK663+860-YGY-01	左洞ZK663+860截面拱顶沉降收敛监测	1	-5	6	-1.59	2026-01-04 20:11:13	2026-01-31 06:42:05	19.6	8.1	11.5	14.28	2025-12-31 15:51:05	2026-01-31 11:22:05	-0.1051
ZBW-ZK663+860-YGY-02	左洞ZK663+860截面拱腰收敛监测	-1	-7	6	-3.52	2025-12-15 00:52:40	2026-01-07 02:41:25	19.1	7.7	11.4	13.81	2025-12-31 19:01:13	2026-01-31 11:32:13	0.3421

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK663+880-YGY-02	左洞 ZK663+880 截面拱腰收敛监测	3	-5	8	-1.33	2025-12-16 19:20:14	2026-01-05 20:51:39	19.8	8.4	11.4	14.47	2025-12-31 19:01:29	2026-01-31 11:32:29	0.6558
ZBW-ZK663+900-YGY-01	左洞 ZK663+900 截面拱顶沉降收敛监测	-5	-12	7	-8.32	2025-12-15 00:23:04	2026-01-20 17:42:17	19.6	8.1	11.5	14.26	2025-12-31 15:41:37	2026-01-31 11:22:38	0.8516
ZBW-ZK663+900-YGY-02	左洞 ZK663+900 截面拱腰收敛监测	2	-4	6	-0.79	2026-01-01 00:01:46	2026-01-04 21:11:53	19.5	8.2	11.3	14.26	2025-12-31 19:01:45	2026-01-31 11:22:46	0.7217
ZBW-ZK663+920-YGY-01	左洞 ZK663+920 截面拱顶沉降收敛监测	0	-8	8	-4.6	2025-12-15 02:13:20	2026-01-06 23:02:05	19.9	8.5	11.4	14.63	2025-12-31 19:01:53	2026-01-31 09:52:54	0.7097
ZBW-ZK663+920-YGY-02	左洞 ZK663+920 截面拱腰收敛监测	3	-2	5	0.63	2026-01-05 23:02:12	2026-01-07 05:12:14	19.9	8.6	11.3	14.71	2025-12-31 19:02:02	2026-01-31 11:23:02	0.496
ZBW-ZK663+940-YGY-01	左洞 ZK663+940 截面拱顶沉降收敛监测	4	-4	8	-0.42	2025-12-15 06:12:33	2026-01-16 11:01:36	20	8.3	11.7	14.56	2025-12-31 15:51:05	2026-01-31 11:32:05	-0.2491

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK663+940-YGY-02	左洞 ZK663+940 截面拱腰收敛监测	3	-5	8	-1.64	2026-01-16 06:11:43	2026-01-24 04:21:59	18.2	6.8	11.4	12.91	2025-12-31 15:51:13	2026-01-31 11:32:13	0.673
ZBW-ZK663+960-YGY-01	左洞 ZK663+960 截面拱顶沉降收敛监测	0	-7	7	-3.13	2026-01-16 23:31:53	2026-01-31 11:22:21	19	7.3	11.7	13.56	2025-12-31 18:51:21	2026-01-31 11:22:21	0.8783
ZBW-ZK663+960-YGY-02	左洞 ZK663+960 截面拱腰收敛监测	3	-2	5	0.51	2025-12-31 13:21:29	2026-01-28 08:12:23	19.1	7.6	11.5	13.8	2025-12-31 15:51:29	2026-01-31 11:22:29	-0.3662
ZBW-ZK663+980-YGY-01	左洞 ZK663+980 截面拱顶沉降收敛监测	-2	-11	9	-6.31	2025-12-15 01:53:04	2026-01-20 16:32:17	19.7	8	11.7	14.25	2025-12-31 18:51:37	2026-01-31 11:22:38	0.8298
ZBW-ZK663+980-YGY-02	左洞 ZK663+980 截面拱腰收敛监测	1	-5	6	-1.43	2026-01-01 18:31:47	2026-01-07 03:01:58	19.5	8.1	11.4	14.2	2025-12-31 15:41:45	2026-01-31 11:22:46	0.3393
ZBW-ZK664+220-YGY-01	左洞 ZK664+220 截面拱顶沉降收敛监测	3	-7	10	-2.32	2025-12-16 20:09:50	2026-01-08 04:11:19	18.9	6.7	12.2	13.16	2025-12-31 18:51:05	2026-01-31 11:22:05	0.7508

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK664+220-YGY-02	左洞 ZK664+220 截面拱腰收敛监测	-5	-12	7	-8.46	2026-01-03 11:01:18	2026-01-07 04:41:26	19.5	7.2	12.3	13.67	2025-12-31 13:41:13	2026-01-31 10:52:13	0.5106
ZBW-ZK664+240-YGY-01	左洞 ZK664+240 截面拱顶沉降收敛监测	1	-5	6	-1.63	2026-01-05 00:01:29	2026-01-17 09:11:54	19.4	7.1	12.3	13.51	2025-12-31 15:51:21	2026-01-20 17:42:01	-0.6136
ZBW-ZK664+240-YGY-02	左洞 ZK664+240 截面拱腰收敛监测	6	-1	7	2.65	2026-01-08 12:11:44	2026-01-07 00:41:41	19.3	7.2	12.1	13.51	2025-12-31 19:01:29	2026-01-20 17:42:09	0.3125
ZBW-ZK664+330-YGY-01	左洞 ZK664+330 截面拱顶沉降收敛监测	4	-7	11	-1.6	2025-12-15 02:33:04	2026-01-07 03:01:50	19.1	6.5	12.6	12.96	2025-12-31 19:11:37	2026-01-20 17:32:17	0.6798
ZBW-ZK664+330-YGY-02	左洞 ZK664+330 截面拱腰收敛监测	7	1	6	4.47	2026-01-17 14:12:18	2025-12-18 19:30:34	19.3	6.9	12.4	13.26	2025-12-31 19:11:45	2026-01-20 17:32:25	0.0132
ZBW-ZK664+915-YGY-01	左洞 ZK664+915 截面拱顶沉降收敛监测	-3	-10	7	-6.47	2025-12-15 04:12:32	2026-01-20 01:31:47	19.4	2.8	16.6	10.91	2026-01-16 14:01:36	2026-01-07 05:21:18	0.332

测点编号	测点名称	距离最大值/mm	距离最小值/mm	距离极差/mm	距离均值/mm	距离最大值时间	距离最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	距离-温度相关系数
ZBW-ZK664+915-YGY-02	左洞 ZK664+915 截面拱腰收敛监测	6	1	5	3.17	2026-01-13 03:51:37	2025-12-15 16:42:09	19.1	2.7	16.4	10.75	2026-01-16 14:01:44	2026-01-07 05:21:26	0.1814
ZBW-ZK664+935-YGY-01	左洞 ZK664+935 截面拱顶沉降收敛监测	-4	-11	7	-7.66	2025-12-15 00:02:48	2026-01-29 12:52:18	19.2	2.4	16.8	10.54	2026-01-16 13:51:52	2026-01-07 05:41:34	0.679
ZBW-ZK664+935-YGY-02	左洞 ZK664+935 截面拱腰收敛监测	4	-3	7	0.02	2025-12-17 09:50:15	2026-01-08 19:51:49	19.3	3.1	16.2	10.93	2026-01-16 13:52:00	2026-01-07 05:31:42	0.4984
ZBW-ZK664+960-YGY-01	左洞 ZK664+960 截面拱顶沉降收敛监测	-4	-11	7	-8.08	2025-12-16 14:00:22	2026-01-07 05:01:50	19.2	1.9	17.3	10.28	2026-01-16 14:02:08	2026-01-07 05:41:50	0.8447
ZBW-ZK664+960-YGY-02	左洞 ZK664+960 截面拱腰收敛监测	8	0	8	3.97	2025-12-15 17:12:41	2026-01-01 20:21:48	19.4	2.5	16.9	10.71	2026-01-16 13:52:16	2026-01-07 05:21:58	0.3202

4 受力监测

4.1 应变


BML-YK659+040-GD-01 (右洞YK659+040拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+040-YGY-01 (右洞YK659+040右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+040-GD-01 (右洞YK659+040拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+040-YGY-01 (右洞YK659+040右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+040-ZGY-01 (右洞YK659+040左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+060-GD-01 (右洞YK659+060拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+040-ZGY-01 (右洞YK659+040左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+060-GD-01 (右洞YK659+060拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+060-YGY-01 (右洞YK659+060右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-YK659+060-ZGY-01 (右洞YK659+060左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+060-YGY-01 (右洞YK659+060右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+060-ZGY-01 (右洞YK659+060左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+080-GD-01 (右洞YK659+080拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-YK659+080-YGY-01 (右洞YK659+080右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+080-GD-01 (右洞YK659+080拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+080-YGY-01 (右洞YK659+080右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+080-ZGY-01 (右洞YK659+080左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+100-GD-01 (右洞YK659+100拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+080-ZGY-01 (右洞YK659+080左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+100-GD-01 (右洞YK659+100拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+100-YGY-01 (右洞YK659+100右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+100-ZGY-01 (右洞YK659+100左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+100-YGY-01 (右洞YK659+100右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+100-ZGY-01 (右洞YK659+100左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+150-GD-01 (右洞YK659+150拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+150-YGY-01 (右洞YK659+150右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

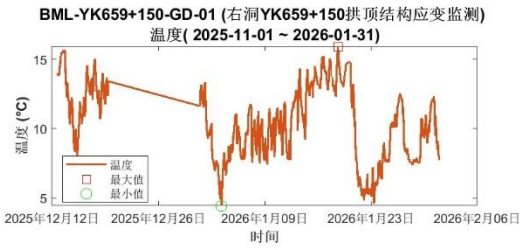
BML-YK659+150-GD-01 (右洞YK659+150拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

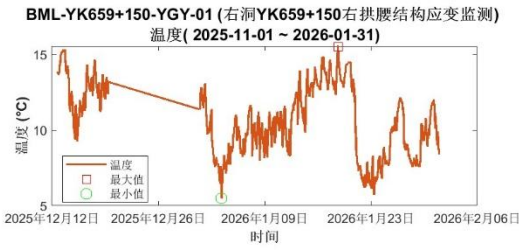
BML-YK659+150-YGY-01 (右洞YK659+150右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+150-ZGY-01 (右洞YK659+150左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+170-GD-01 (右洞YK659+170拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+150-ZGY-01 (右洞YK659+150左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+170-GD-01 (右洞YK659+170拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+170-YGY-01 (右洞YK659+170右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-YK659+170-ZGY-01 (右洞YK659+170左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+170-YGY-01 (右洞YK659+170右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+170-ZGY-01 (右洞YK659+170左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+190-GD-01 (右洞YK659+190拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+190-YGY-01 (右洞YK659+190右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

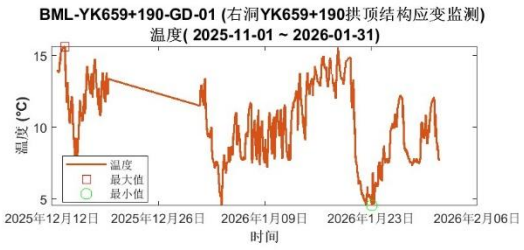
BML-YK659+190-GD-01 (右洞YK659+190拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

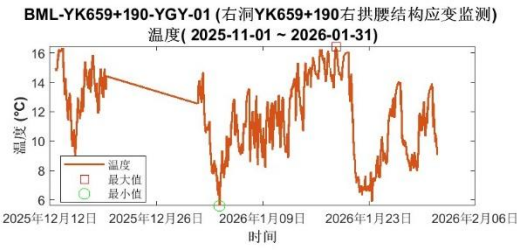
BML-YK659+190-YGY-01 (右洞YK659+190右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+190-ZGY-01 (右洞YK659+190左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+210-GD-01 (右洞YK659+210拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-YK659+190-ZGY-01 (右洞YK659+190左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+210-GD-01 (右洞YK659+210拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+210-YGY-01 (右洞YK659+210右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+210-ZGY-01 (右洞YK659+210左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+210-YGY-01 (右洞YK659+210右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+210-ZGY-01 (右洞YK659+210左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK659+230-GD-01 (右洞YK659+230拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK659+230-YGY-01 (右洞YK659+230右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

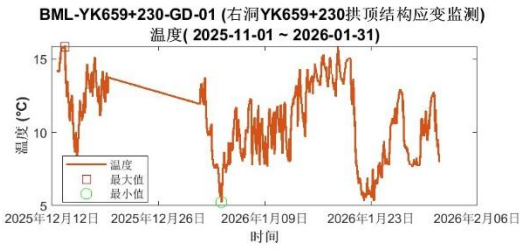
BML-YK659+230-GD-01 (右洞YK659+230拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+230-YGY-01 (右洞YK659+230右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK659+230-ZGY-01 (右洞YK659+230左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+680-GD-01 (右洞YK661+680拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-YK659+230-ZGY-01 (右洞YK659+230左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+680-GD-01 (右洞YK661+680拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+680-YGY-01 (右洞YK661+680右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-YK661+680-ZGY-01 (右洞YK661+680左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+680-YGY-01 (右洞YK661+680右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-YK661+680-ZGY-01 (右洞YK661+680左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+710-GD-01 (右洞YK661+710拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+710-YGY-01 (右洞YK661+710右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

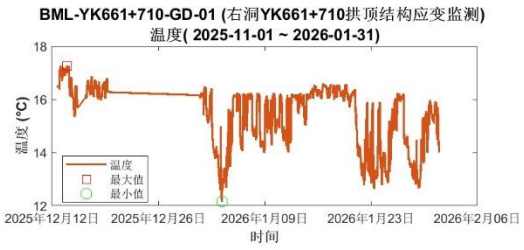
BML-YK661+710-GD-01 (右洞YK661+710拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

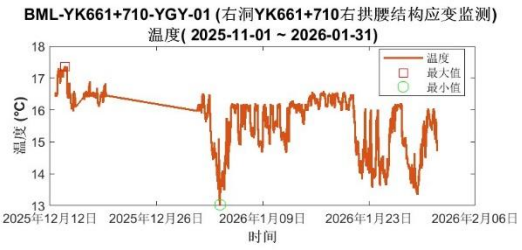
BML-YK661+710-YGY-01 (右洞YK661+710右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+710-ZGY-01 (右洞YK661+710左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+730-GD-01 (右洞YK661+730拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+710-ZGY-01 (右洞YK661+710左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+730-GD-01 (右洞YK661+730拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+730-YGY-01 (右洞YK661+730右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+730-ZGY-01 (右洞YK661+730左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-YK661+730-YGY-01 (右洞YK661+730右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-YK661+730-ZGY-01 (右洞YK661+730左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+180-GD-01 (左洞ZK659+180拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK659+180-YGY-01 (左洞ZK659+180右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+180-GD-01 (左洞ZK659+180拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+180-YGY-01 (左洞ZK659+180右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK659+180-ZGY-01 (左洞ZK659+180左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+206-GD-01 (左洞ZK659+206拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+180-ZGY-01 (左洞ZK659+180左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+206-GD-01 (左洞ZK659+206拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK659+206-YGY-01 (左洞ZK659+206右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK659+206-ZGY-01 (左洞ZK659+206左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+206-YGY-01 (左洞ZK659+206右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK659+206-ZGY-01 (左洞ZK659+206左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+226-GD-01 (左洞ZK659+226拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK659+226-YGY-01 (左洞ZK659+226右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK659+226-GD-01 (左洞ZK659+226拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK659+226-YGY-01 (左洞ZK659+226右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+226-ZGY-01 (左洞ZK659+226左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+246-GD-01 (左洞ZK659+246拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+226-ZGY-01 (左洞ZK659+226左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+246-GD-01 (左洞ZK659+246拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK659+246-YGY-01 (左洞ZK659+246右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK659+246-ZGY-01 (左洞ZK659+246左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK659+246-YGY-01 (左洞ZK659+246右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK659+246-ZGY-01 (左洞ZK659+246左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+565-GD-01 (左洞ZK661+565拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+565-YGY-01 (左洞ZK661+565右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+565-GD-01 (左洞ZK661+565拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+565-YGY-01 (左洞ZK661+565右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK661+565-ZGY-01 (左洞ZK661+565左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+640-GD-01 (左洞ZK659+640拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+565-ZGY-01 (左洞ZK661+565左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+640-GD-01 (左洞ZK659+640拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK661+640-YGY-01 (左洞ZK661+640右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK661+640-ZGY-01 (左洞ZK661+640左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+640-YGY-01 (左洞ZK661+640右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+640-ZGY-01 (左洞ZK661+640左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+670-GD-01 (左洞ZK661+670拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+670-YGY-01 (左洞ZK661+670右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+670-GD-01 (左洞ZK661+670拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK661+670-YGY-01 (左洞ZK661+670右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK661+670-ZGY-01 (左洞ZK661+670左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+690-GD-01 (左洞ZK661+690拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK661+670-ZGY-01 (左洞ZK661+670左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+690-GD-01 (左洞ZK661+690拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK661+690-YGY-01 (左洞ZK661+690右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK661+690-ZGY-01 (左洞ZK661+690左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK661+690-YGY-01 (左洞ZK661+690右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK661+690-ZGY-01 (左洞ZK661+690左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK663+690-GD-01 (左洞ZK663+690拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK663+690-YGY-01 (左洞ZK663+690右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

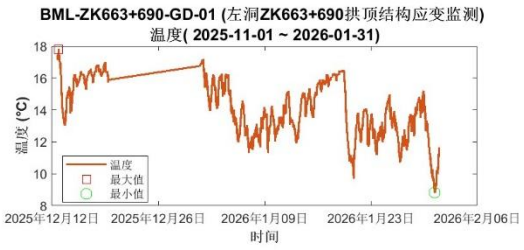
BML-ZK663+690-GD-01 (左洞ZK663+690拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+690-YGY-01 (左洞ZK663+690右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+690-ZGY-01 (左洞ZK663+690左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+720-GD-01 (左洞ZK663+720拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK663+690-ZGY-01 (左洞ZK663+690左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK663+720-GD-01 (左洞ZK663+720拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK663+720-YGY-01 (左洞ZK663+720右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+720-ZGY-01 (左洞ZK663+720左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+720-YGY-01 (左洞ZK663+720右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+720-ZGY-01 (左洞ZK663+720左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK663+740-GD-01 (左洞ZK663+740拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+740-YGY-01 (左洞ZK663+740右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+740-GD-01 (左洞ZK663+740拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+740-YGY-01 (左洞ZK663+740右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+740-ZGY-01 (左洞ZK663+740左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+760-GD-01 (左洞ZK663+760拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+740-ZGY-01 (左洞ZK663+740左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK663+760-GD-01 (左洞ZK663+760拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+760-YGY-01 (左洞ZK663+760右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK663+760-ZGY-01 (左洞ZK663+760左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+760-YGY-01 (左洞ZK663+760右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+760-ZGY-01 (左洞ZK663+760左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间


BML-ZK663+780-GD-01 (左洞ZK663+780拱顶结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK663+780-YGY-01 (左洞ZK663+780右拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日


BML-ZK663+780-GD-01 (左洞ZK663+780拱顶结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+780-YGY-01 (左洞ZK663+780右拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

BML-ZK663+780-ZGY-01 (左洞ZK663+780左拱腰结构应变监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
应变 (με)
应变
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日

BML-ZK663+780-ZGY-01 (左洞ZK663+780左拱腰结构应变监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月12日
2025年12月26日
2026年1月09日
2026年1月23日
2026年2月06日
时间

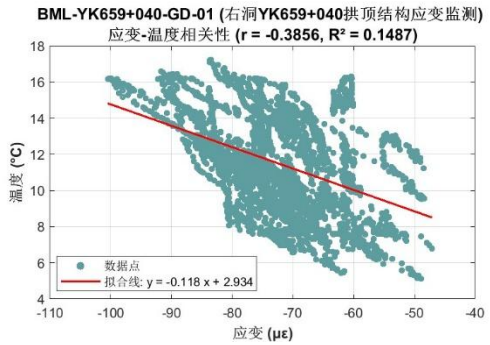
BML-YK659+040-GD-01 (右洞YK659+040拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.3856, R² = 0.1487)
温度 (°C)
数据点
拟合线: y = -0.118 x + 2.934
应变 (με)

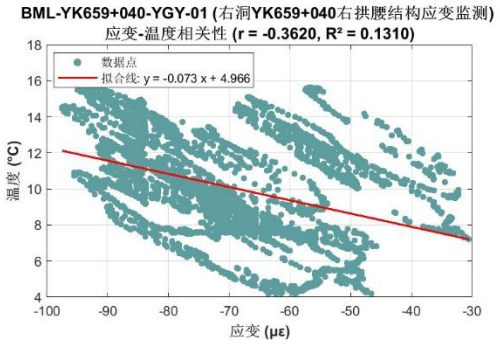
BML-YK659+040-YGY-01 (右洞YK659+040右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.3620, R² = 0.1310)
数据点
拟合线: y = -0.073 x + 4.966
温度 (°C)
应变 (με)

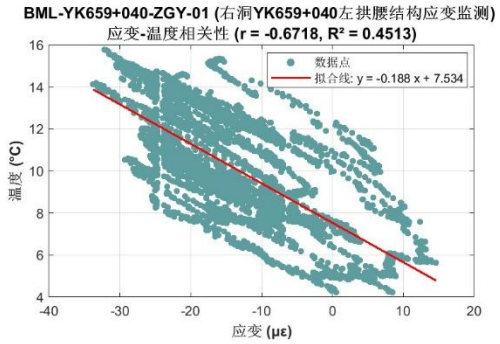
BML-YK659+040-ZGY-01 (右洞YK659+040左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.6718, R² = 0.4513)
数据点
拟合线: y = -0.188 x + 7.534
温度 (°C)
应变 (με)

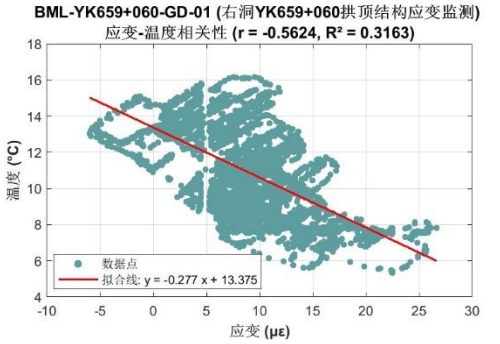
BML-YK659+060-GD-01 (右洞YK659+060拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.5624, R² = 0.3163)
数据点
拟合线: y = -0.277 x + 13.375
温度 (°C)
应变 (με)

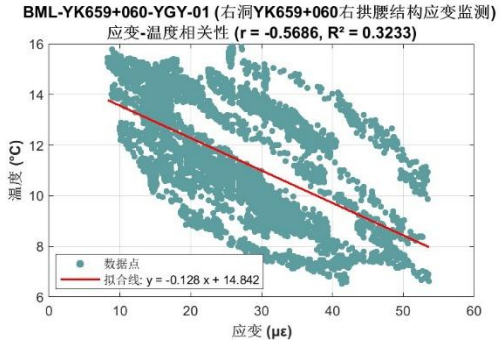
BML-YK659+060-YGY-01 (右洞YK659+060右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.5686, R² = 0.3233)
数据点
拟合线: y = -0.128 x + 14.842
温度 (°C)
应变 (με)

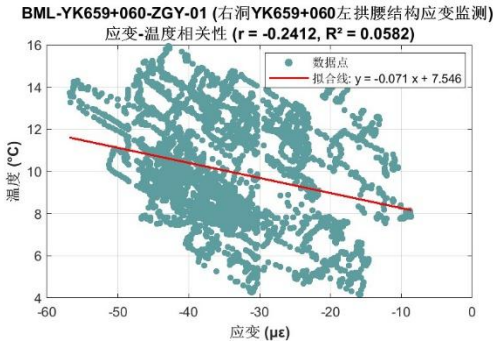
BML-YK659+060-ZGY-01 (右洞YK659+060左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.2412, R² = 0.0582)
数据点
拟合线: y = -0.071 x + 7.546
温度 (°C)
应变 (με)

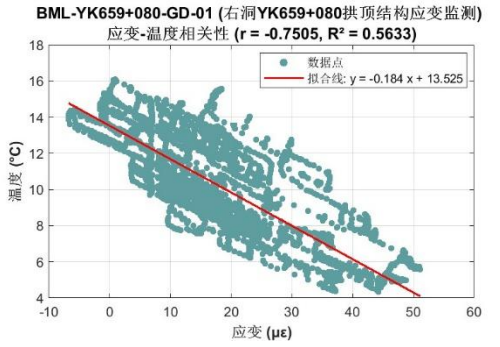
BML-YK659+080-GD-01 (右洞YK659+080拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.7505, R² = 0.5633)
数据点
拟合线: y = -0.184 x + 13.525
温度 (°C)
应变 (με)

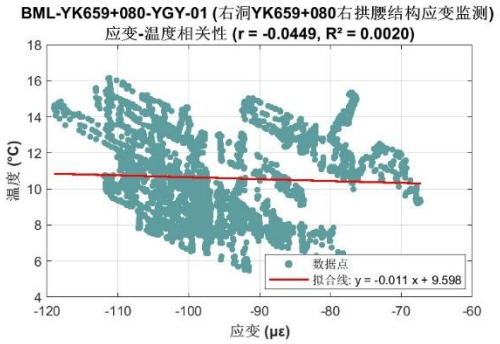
BML-YK659+080-YGY-01 (右洞YK659+080右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.0449, R² = 0.0020)
数据点
拟合线: y = -0.011 x + 9.598
温度 (°C)
应变 (με)

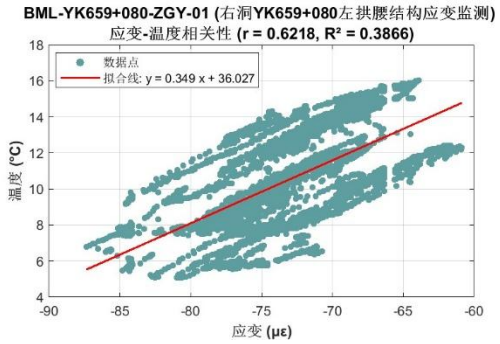
BML-YK659+080-ZGY-01 (右洞YK659+080左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.6218, R² = 0.3866)
数据点
拟合线: y = 0.349 x + 36.027
温度 (°C)
应变 (με)

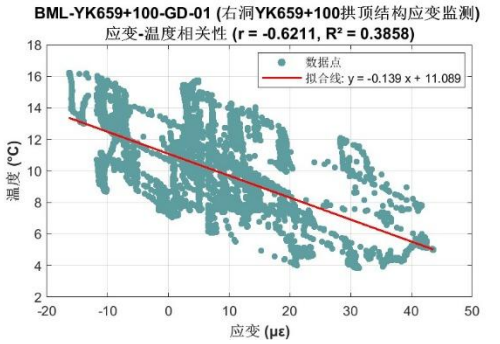
BML-YK659+100-GD-01 (右洞YK659+100拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.6211, R² = 0.3858)
数据点
拟合线: y = -0.139 x + 11.089
温度 (°C)
应变 (με)

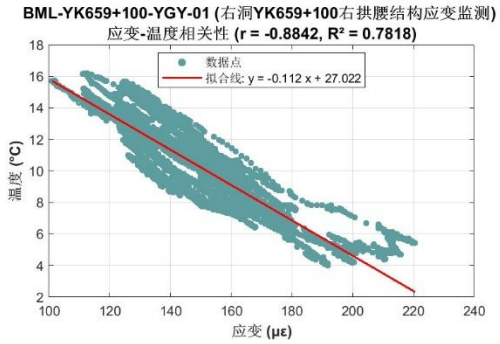
BML-YK659+100-YGY-01 (右洞YK659+100右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.8842, R² = 0.7818)
数据点
拟合线: y = -0.112 x + 27.022
温度 (°C)
应变 (με)

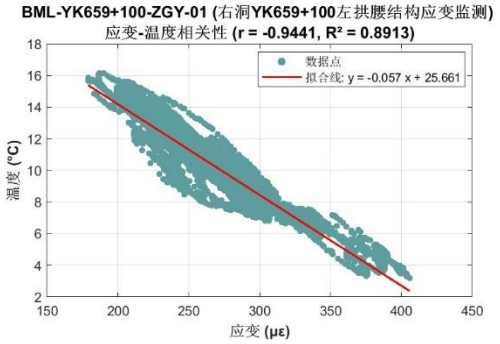
BML-YK659+100-ZGY-01 (右洞YK659+100左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9441, R² = 0.8913)
数据点
拟合线: y = -0.057 x + 25.661
温度 (°C)
应变 (με)

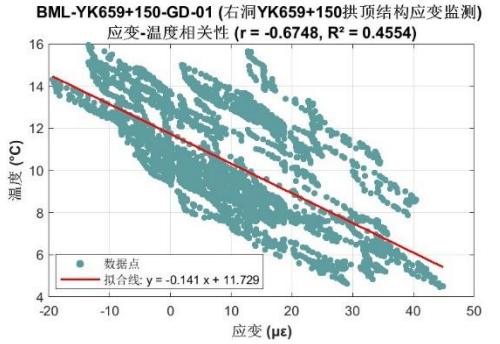
BML-YK659+150-GD-01 (右洞YK659+150拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.6748, R² = 0.4554)
数据点
拟合线: y = -0.141 x + 11.729
温度 (°C)
应变 (με)

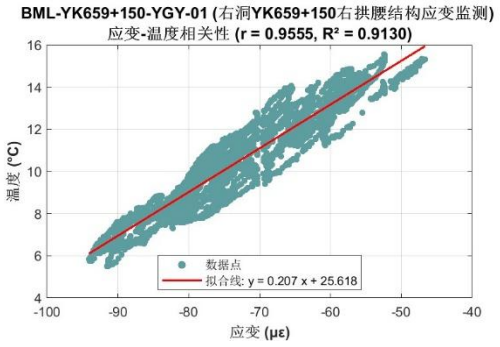
BML-YK659+150-YGY-01 (右洞YK659+150右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.9555, R² = 0.9130)
数据点
拟合线: y = 0.207 x + 25.618
温度 (°C)
应变 (με)

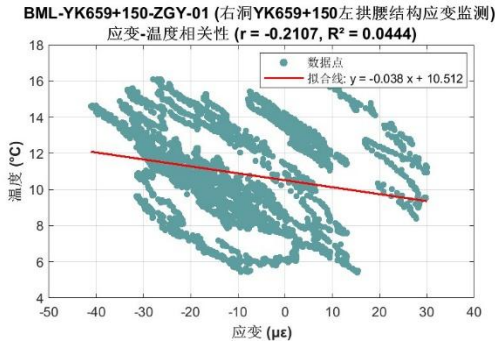
BML-YK659+150-ZGY-01 (右洞YK659+150左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.2107, R² = 0.0444)
数据点
拟合线: y = -0.038 x + 10.512
温度 (°C)
应变 (με)

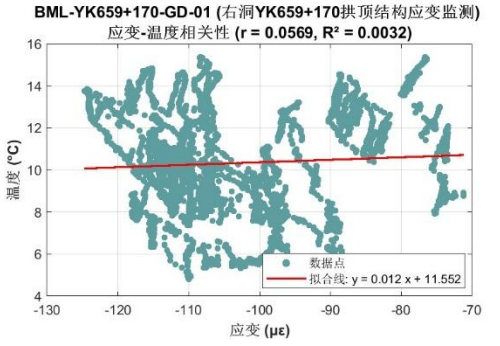
BML-YK659+170-GD-01 (右洞YK659+170拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.0569, R² = 0.0032)
数据点
拟合线: y = 0.012 x + 11.552
温度 (°C)
应变 (με)

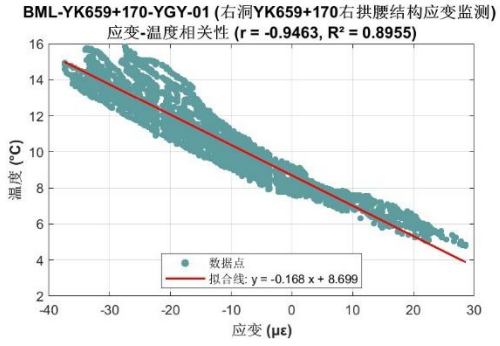
BML-YK659+170-YGY-01 (右洞YK659+170右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9463, R² = 0.8955)
数据点
拟合线: y = -0.168 x + 8.699
温度 (°C)
应变 (με)

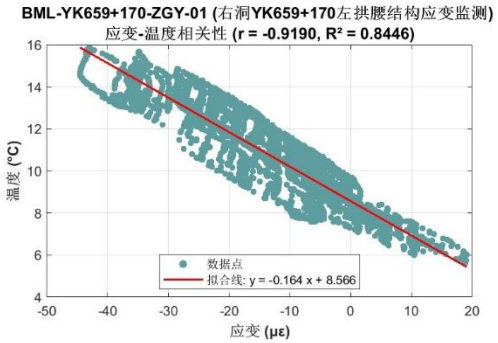
BML-YK659+170-ZGY-01 (右洞YK659+170左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9190, R² = 0.8446)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.164 x + 8.566

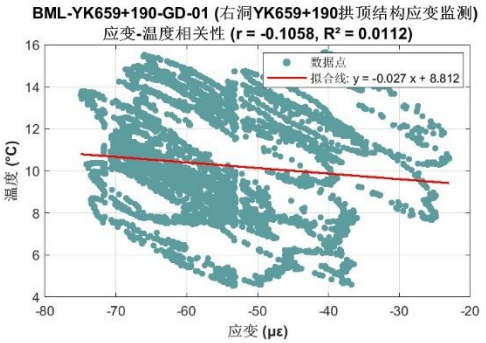
BML-YK659+190-GD-01 (右洞YK659+190拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.1058, R² = 0.0112)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.027 x + 8.812

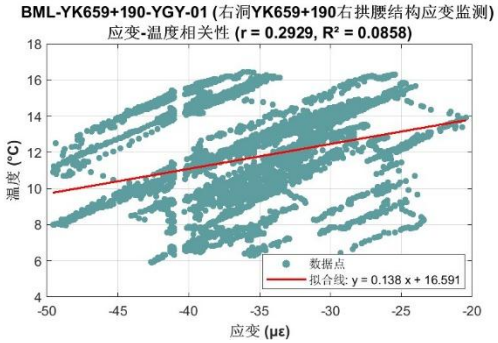
BML-YK659+190-YGY-01 (右洞YK659+190右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.2929, R² = 0.0858)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.138 x + 16.591

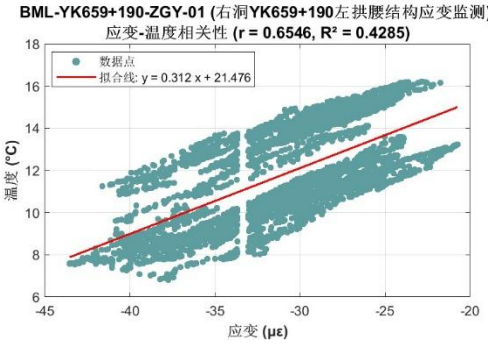
BML-YK659+190-ZGY-01 (右洞YK659+190左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.6546, R² = 0.4285)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.312 x + 21.476

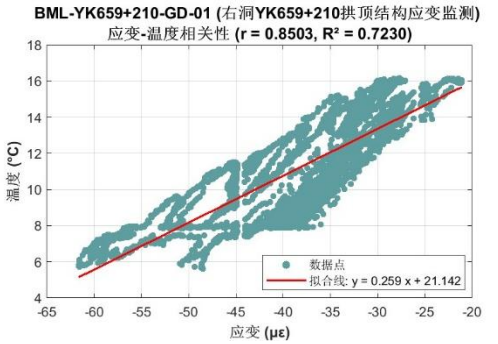
BML-YK659+210-GD-01 (右洞YK659+210拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.8503, R² = 0.7230)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.259 x + 21.142

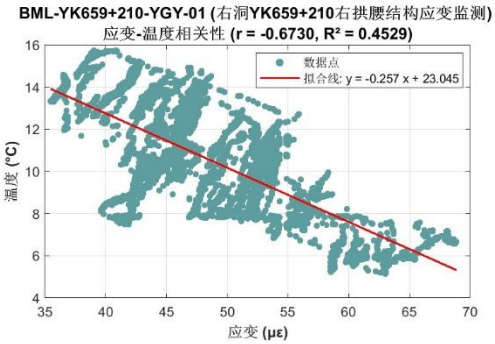
BML-YK659+210-YGY-01 (右洞YK659+210右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.6730, R² = 0.4529)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.257 x + 23.045

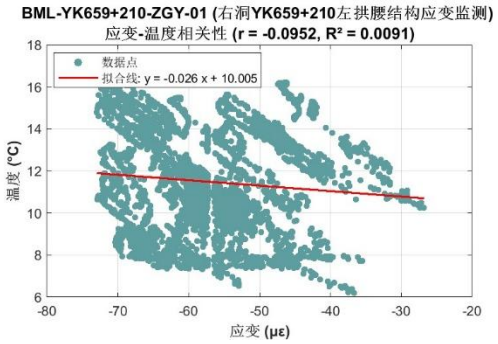
BML-YK659+210-ZGY-01 (右洞YK659+210左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.0952, R² = 0.0091)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.026 x + 10.005

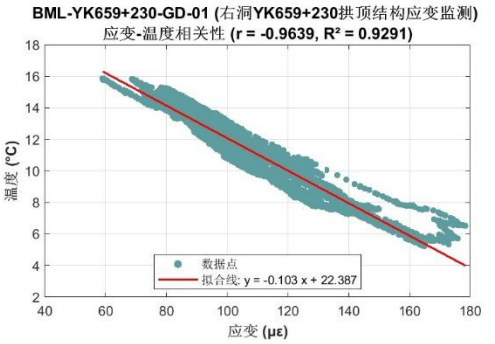
BML-YK659+230-GD-01 (右洞YK659+230拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9639, R² = 0.9291)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.103 x + 22.387

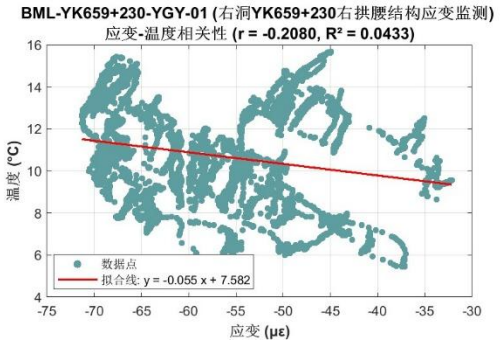
BML-YK659+230-YGY-01 (右洞YK659+230右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.2080, R² = 0.0433)
数据点
拟合线: y = -0.055 x + 7.582
温度 (°C)
应变 (με)

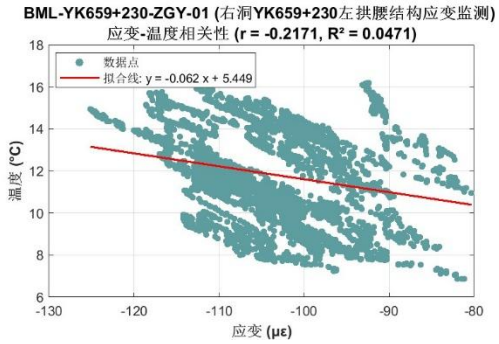
BML-YK659+230-ZGY-01 (右洞YK659+230左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.2171, R² = 0.0471)
数据点
拟合线: y = -0.062 x + 5.449
温度 (°C)
应变 (με)

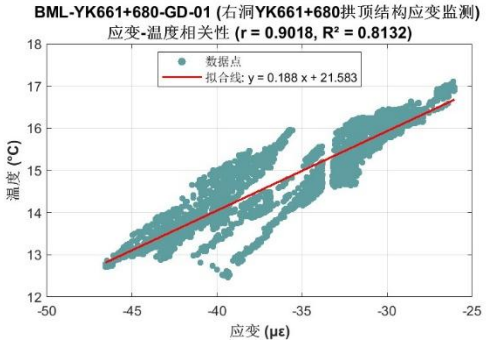
BML-YK661+680-GD-01 (右洞YK661+680拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.9018, R² = 0.8132)
数据点
拟合线: y = 0.188 x + 21.583
温度 (°C)
应变 (με)

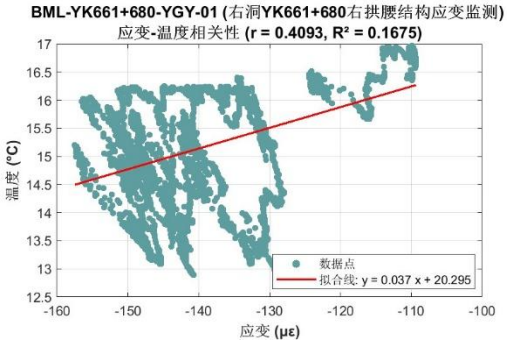
BML-YK661+680-YGY-01 (右洞YK661+680右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.4093, R² = 0.1675)
数据点
拟合线: y = 0.037 x + 20.295
温度 (°C)
应变 (με)

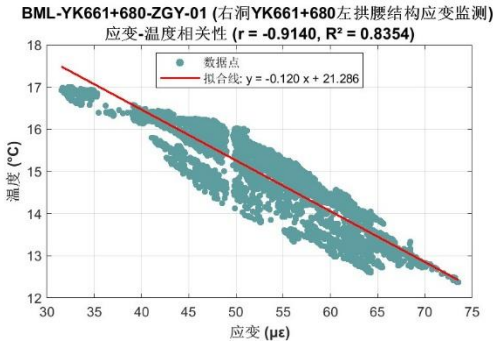
BML-YK661+680-ZGY-01 (右洞YK661+680左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9140, R² = 0.8354)
数据点
拟合线: y = -0.120 x + 21.286
温度 (°C)
应变 (με)

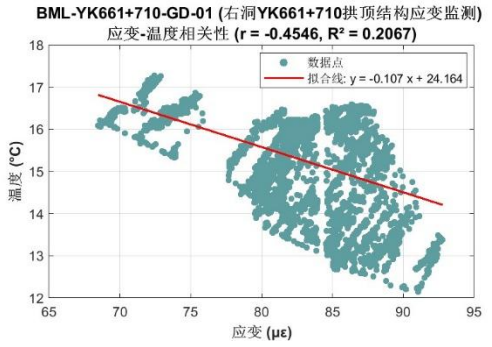
BML-YK661+710-GD-01 (右洞YK661+710拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.4546, R² = 0.2067)
数据点
拟合线: y = -0.107 x + 24.164
温度 (°C)
应变 (με)

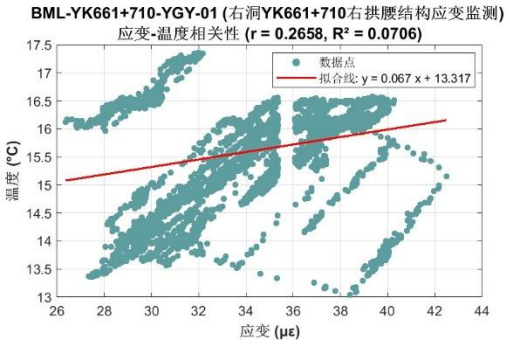
BML-YK661+710-YGY-01 (右洞YK661+710右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.2658, R² = 0.0706)
数据点
拟合线: y = 0.067 x + 13.317
温度 (°C)
应变 (με)

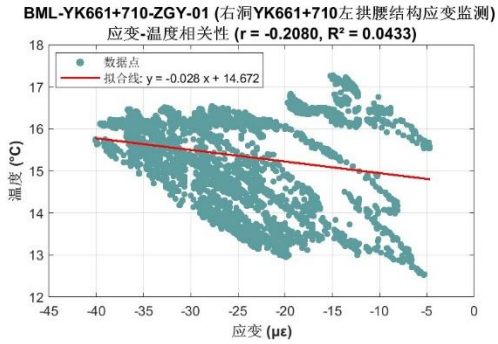
BML-YK661+710-ZGY-01 (右洞YK661+710左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.2080, R² = 0.0433)
数据点
拟合线: y = -0.028 x + 14.672
温度 (°C)
应变 (με)

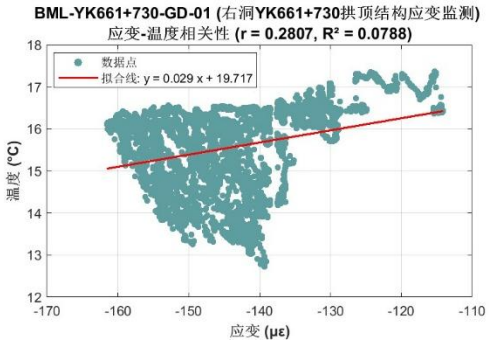
BML-YK661+730-GD-01 (右洞YK661+730拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.2807, R² = 0.0788)
数据点
拟合线: y = 0.029 x + 19.717
温度 (°C)
应变 (με)

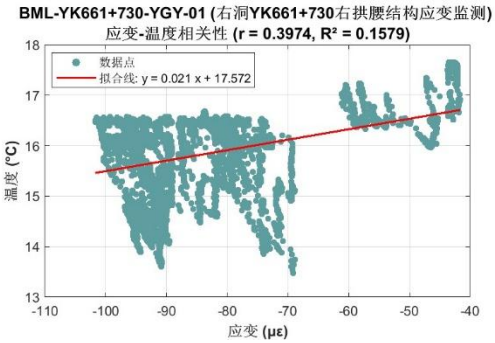
BML-YK661+730-YGY-01 (右洞YK661+730右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.3974, R² = 0.1579)
数据点
拟合线: y = 0.021 x + 17.572
温度 (°C)
应变 (με)

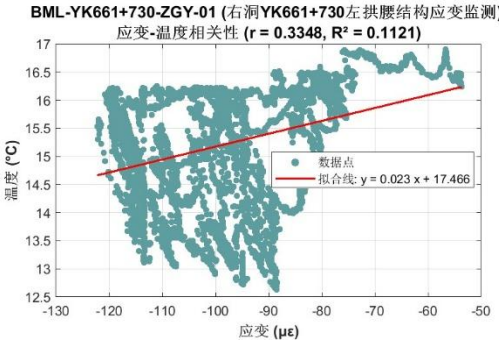
BML-YK661+730-ZGY-01 (右洞YK661+730左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.3348, R² = 0.1121)
数据点
拟合线: y = 0.023 x + 17.466
温度 (°C)
应变 (με)

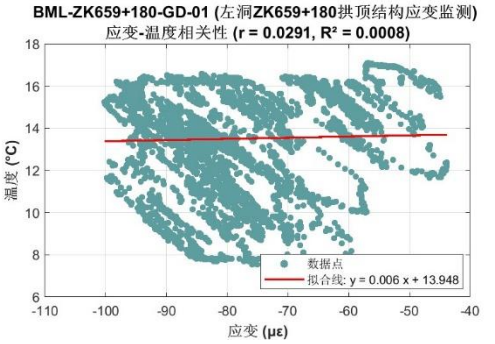
BML-ZK659+180-GD-01 (左洞ZK659+180拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.0291, R² = 0.0008)
数据点
拟合线: y = 0.006 x + 13.948
温度 (°C)
应变 (με)

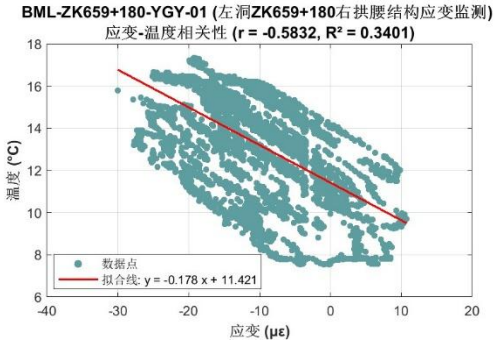
BML-ZK659+180-YGY-01 (左洞ZK659+180右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.5832, R² = 0.3401)
数据点
拟合线: y = -0.178 x + 11.421
温度 (°C)
应变 (με)

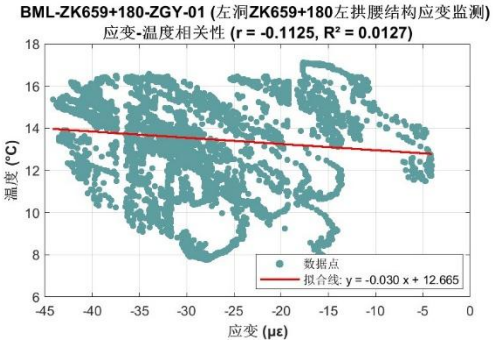
BML-ZK659+180-ZGY-01 (左洞ZK659+180左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.1125, R² = 0.0127)
数据点
拟合线: y = -0.030 x + 12.665
温度 (°C)
应变 (με)

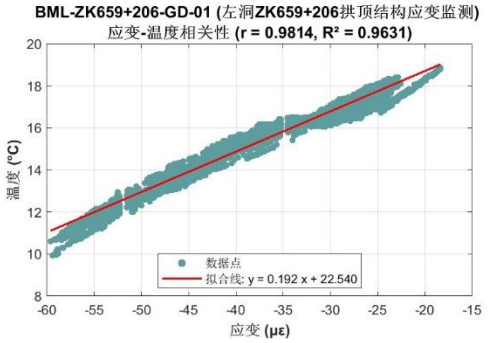
BML-ZK659+206-GD-01 (左洞ZK659+206拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.9814, R² = 0.9631)
数据点
拟合线: y = 0.192 x + 22.540
温度 (°C)
应变 (με)

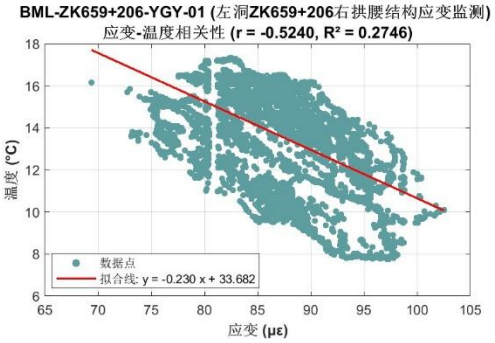
BML-ZK659+206-YGY-01 (左洞ZK659+206右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.5240, R² = 0.2746)
数据点
拟合线: y = -0.230 x + 33.682
温度 (°C)
应变 (με)

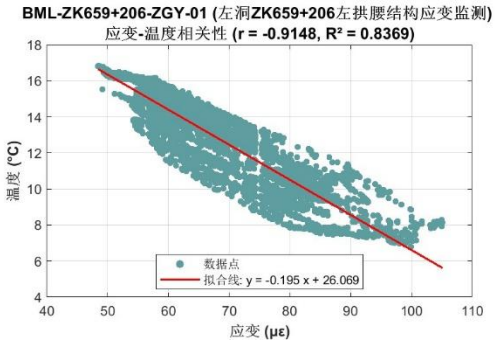
BML-ZK659+206-ZGY-01 (左洞ZK659+206左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9148, R² = 0.8369)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.195 x + 26.069

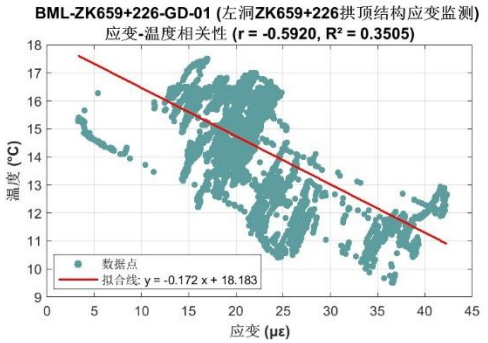
BML-ZK659+226-GD-01 (左洞ZK659+226拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.5920, R² = 0.3505)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.172 x + 18.183

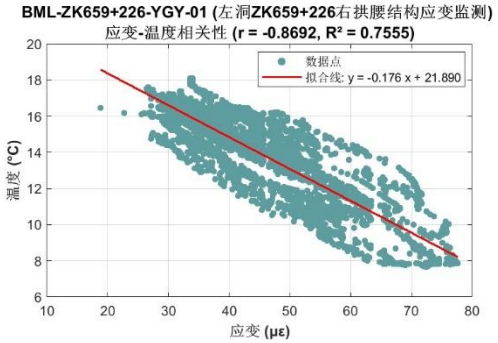
BML-ZK659+226-YGY-01 (左洞ZK659+226右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.8692, R² = 0.7555)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.176 x + 21.890

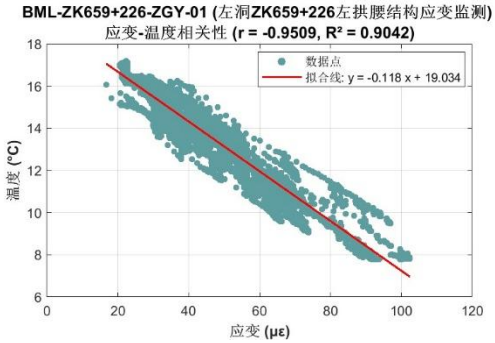
BML-ZK659+226-ZGY-01 (左洞ZK659+226左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.9509, R² = 0.9042)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.118 x + 19.034

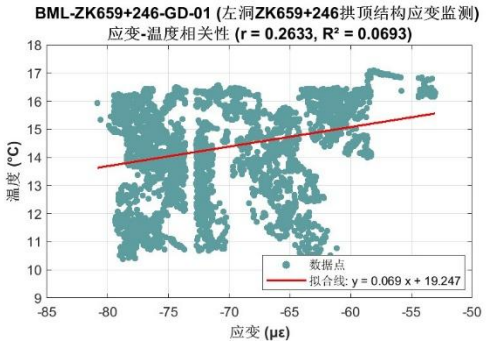
BML-ZK659+246-GD-01 (左洞ZK659+246拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.2633, R² = 0.0693)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.069 x + 19.247

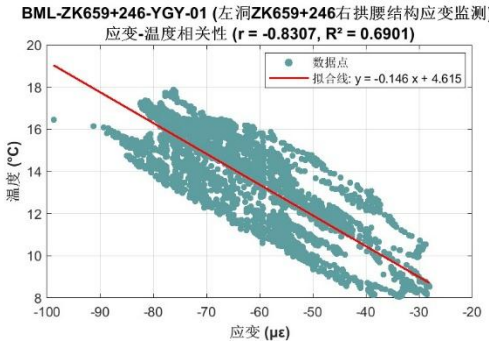
BML-ZK659+246-YGY-01 (左洞ZK659+246右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.8307, R² = 0.6901)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.146 x + 4.615

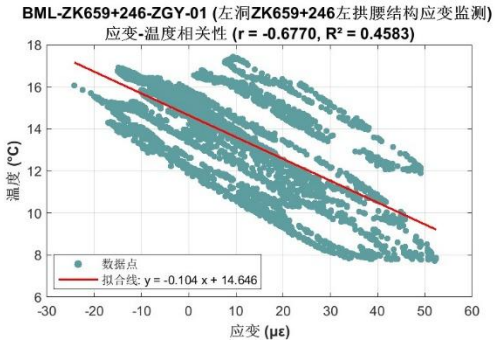
BML-ZK659+246-ZGY-01 (左洞ZK659+246左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.6770, R² = 0.4583)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.104 x + 14.646

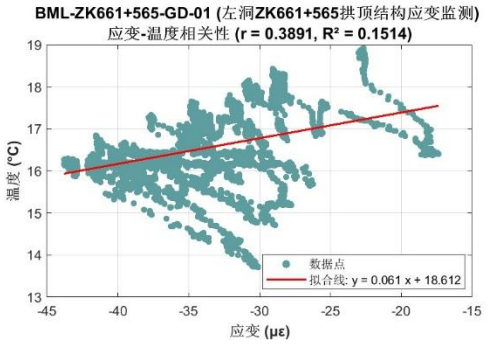
BML-ZK661+565-GD-01 (左洞ZK661+565拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.3891, R² = 0.1514)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.061 x + 18.612

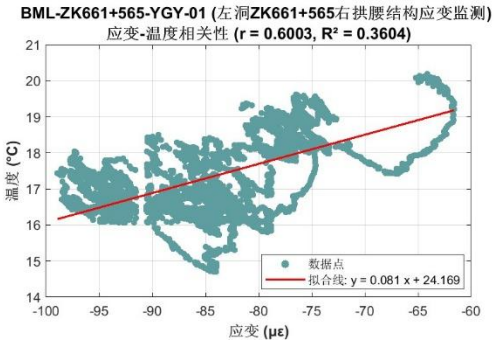
BML-ZK661+565-YGY-01 (左洞ZK661+565右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.6003, R² = 0.3604)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.081 x + 24.169

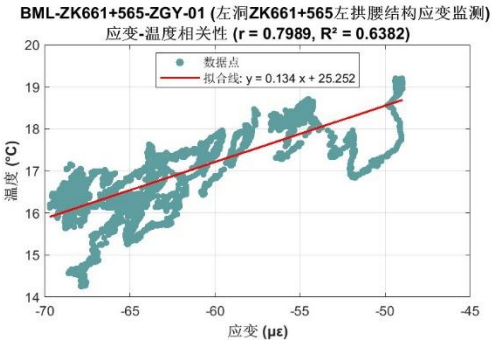
BML-ZK661+565-ZGY-01 (左洞ZK661+565左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.7989, R² = 0.6382)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.134 x + 25.252

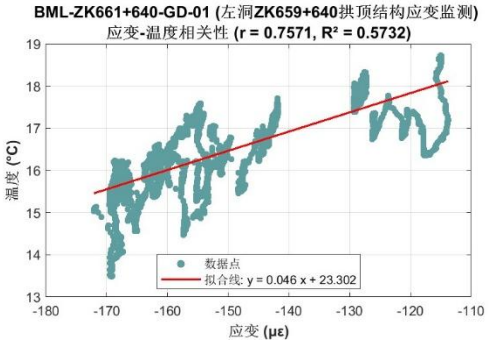
BML-ZK661+640-GD-01 (左洞ZK659+640拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.7571, R² = 0.5732)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.046 x + 23.302

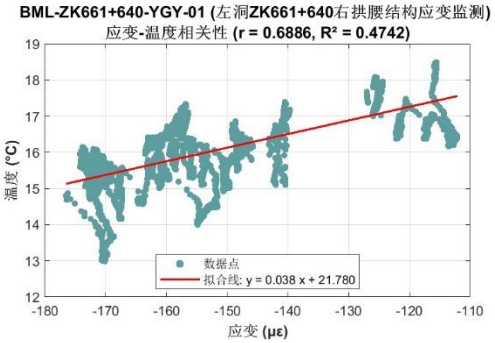
BML-ZK661+640-YGY-01 (左洞ZK661+640右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.6886, R² = 0.4742)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.038 x + 21.780

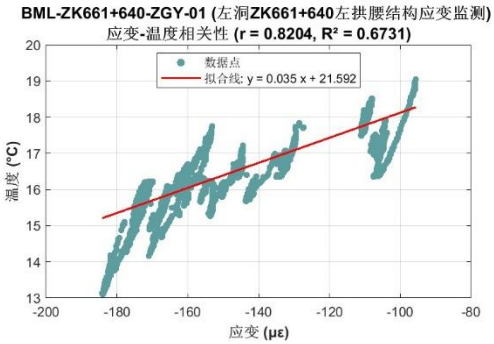
BML-ZK661+640-ZGY-01 (左洞ZK661+640左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.8204, R² = 0.6731)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.035 x + 21.592

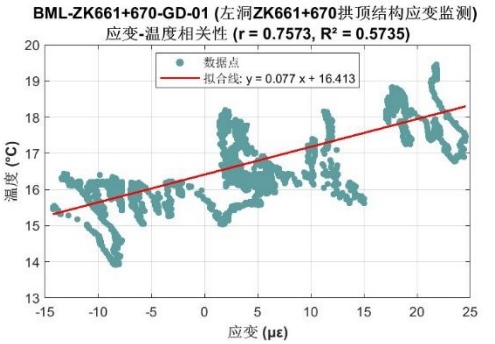
BML-ZK661+670-GD-01 (左洞ZK661+670拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.7573, R² = 0.5735)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.077 x + 16.413

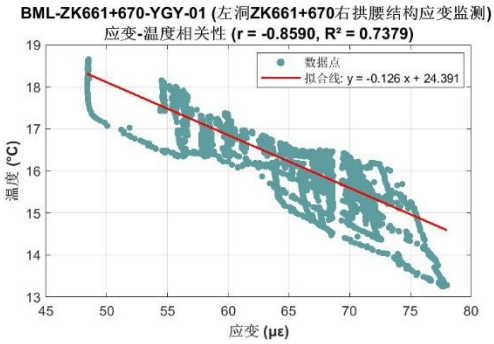
BML-ZK661+670-YGY-01 (左洞ZK661+670右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.8590, R² = 0.7379)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.126 x + 24.391

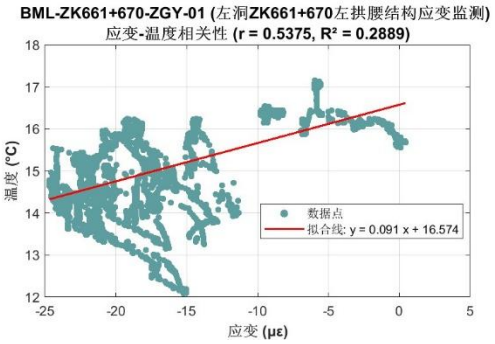
BML-ZK661+670-ZGY-01 (左洞ZK661+670左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.5375, R² = 0.2889)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.091 x + 16.574

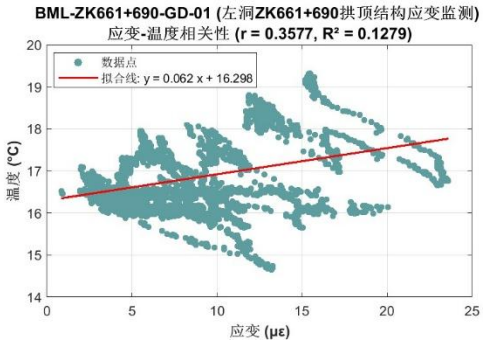
BML-ZK661+690-GD-01 (左洞ZK661+690拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.3577, R² = 0.1279)
数据点
拟合线: y = 0.062 x + 16.298
温度 (°C)
应变 (με)

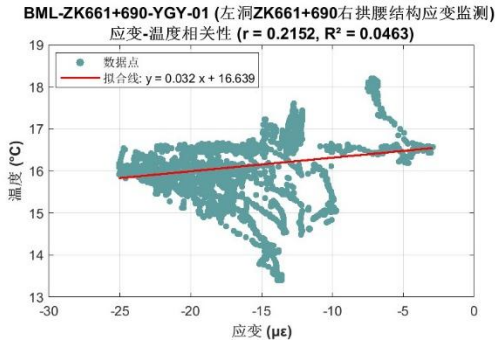
BML-ZK661+690-YGY-01 (左洞ZK661+690右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.2152, R² = 0.0463)
数据点
拟合线: y = 0.032 x + 16.639
温度 (°C)
应变 (με)

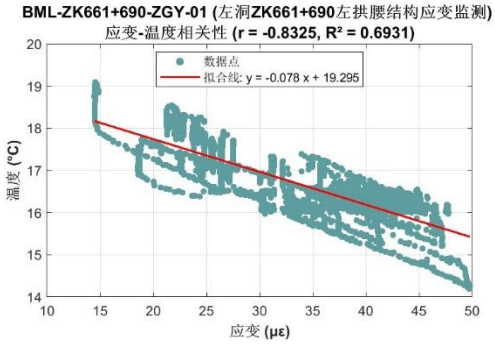
BML-ZK661+690-ZGY-01 (左洞ZK661+690左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.8325, R² = 0.6931)
数据点
拟合线: y = -0.078 x + 19.295
温度 (°C)
应变 (με)

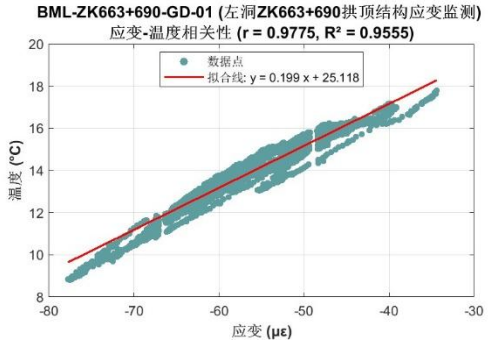
BML-ZK663+690-GD-01 (左洞ZK663+690拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.9775, R² = 0.9555)
数据点
拟合线: y = 0.199 x + 25.118
温度 (°C)
应变 (με)

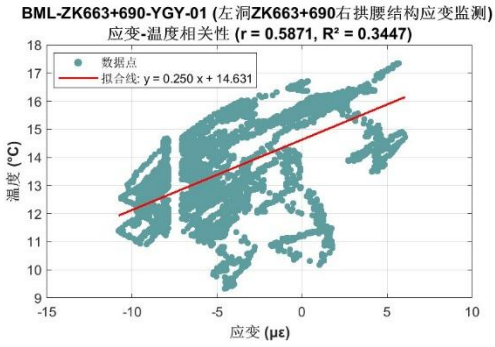
BML-ZK663+690-YGY-01 (左洞ZK663+690右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.5871, R² = 0.3447)
数据点
拟合线: y = 0.250 x + 14.631
温度 (°C)
应变 (με)

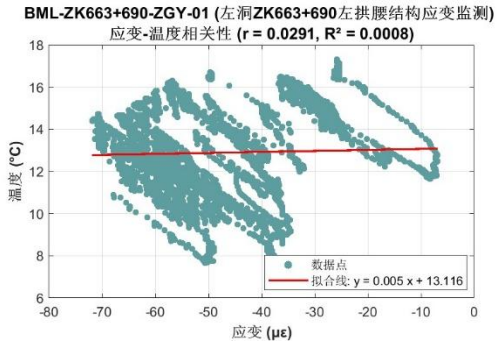
BML-ZK663+690-ZGY-01 (左洞ZK663+690左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.0291, R² = 0.0008)
数据点
拟合线: y = 0.005 x + 13.116
温度 (°C)
应变 (με)

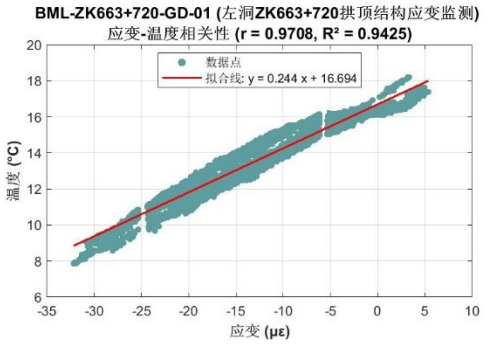
BML-ZK663+720-GD-01 (左洞ZK663+720拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.9708, R² = 0.9425)
数据点
拟合线: y = 0.244 x + 16.694
温度 (°C)
应变 (με)

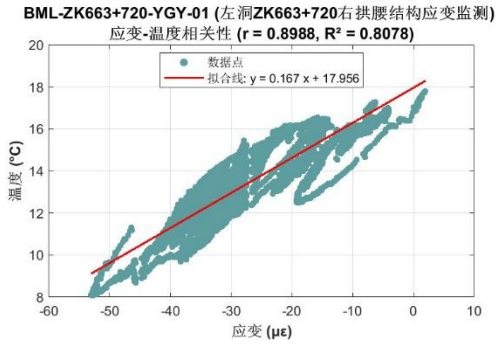
BML-ZK663+720-YGY-01 (左洞ZK663+720右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.8988, R² = 0.8078)
数据点
拟合线: y = 0.167 x + 17.956
温度 (°C)
应变 (με)

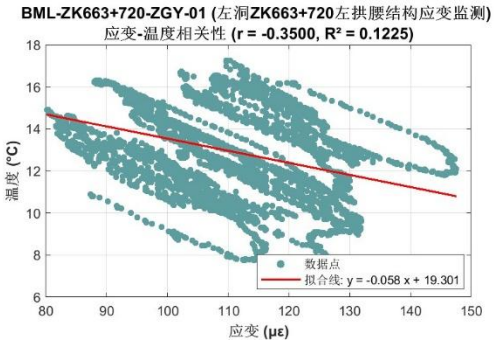
BML-ZK663+720-ZGY-01 (左洞ZK663+720左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.3500, R² = 0.1225)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.058 x + 19.301

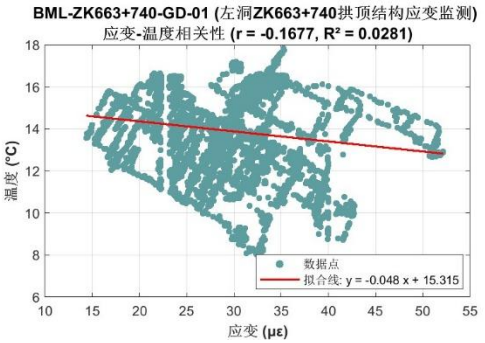
BML-ZK663+740-GD-01 (左洞ZK663+740拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.1677, R² = 0.0281)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.048 x + 15.315

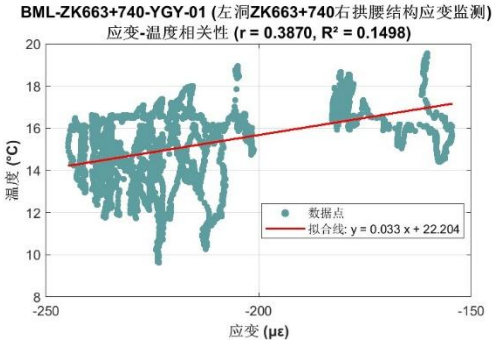
BML-ZK663+740-YGY-01 (左洞ZK663+740右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.3870, R² = 0.1498)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.033 x + 22.204

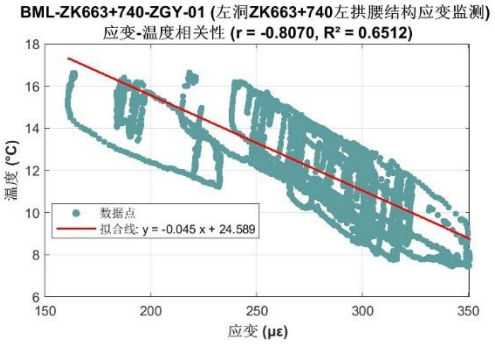
BML-ZK663+740-ZGY-01 (左洞ZK663+740左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.8070, R² = 0.6512)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.045 x + 24.589

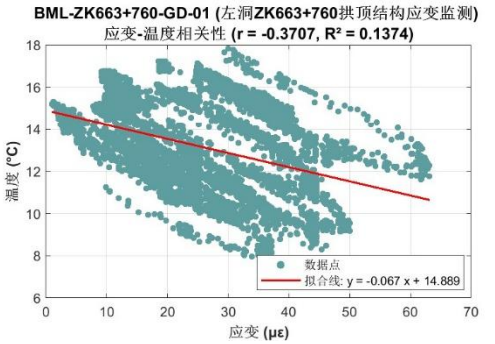
BML-ZK663+760-GD-01 (左洞ZK663+760拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = -0.3707, R² = 0.1374)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = -0.067 x + 14.889

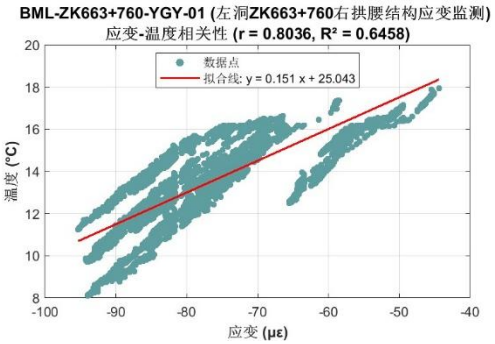
BML-ZK663+760-YGY-01 (左洞ZK663+760右拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.8036, R² = 0.6458)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.151 x + 25.043

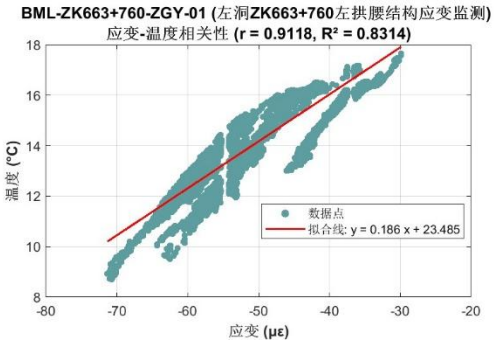
BML-ZK663+760-ZGY-01 (左洞ZK663+760左拱腰结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.9118, R² = 0.8314)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.186 x + 23.485

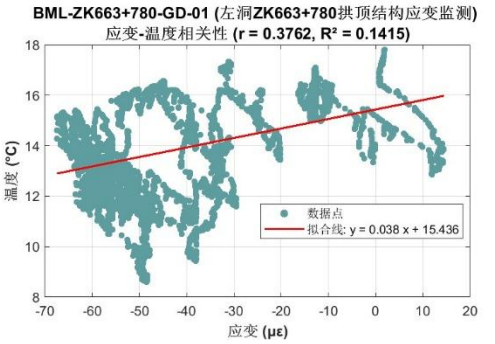
BML-ZK663+780-GD-01 (左洞ZK663+780拱顶结构应变监测)
应变-温度相关性 (r = 0.3762, R² = 0.1415)
温度 (°C)
应变 (με)
数据点
拟合线: y = 0.038 x + 15.436

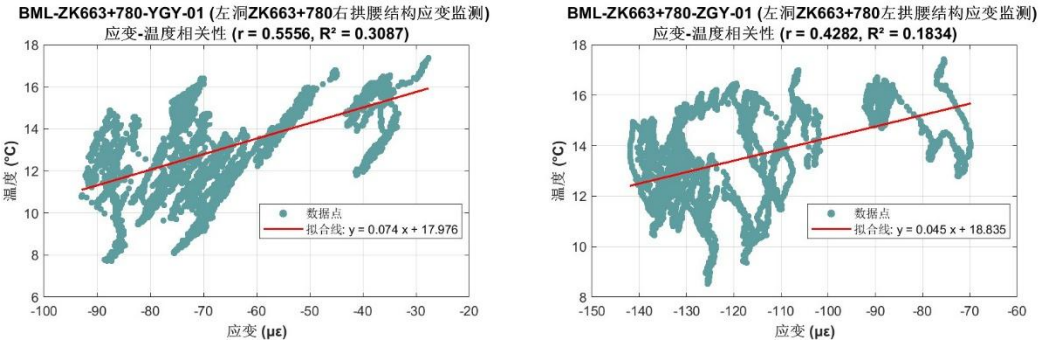

图 4.1-1 拱顶、拱腰结构应变时程曲线图

表 4.1-1 拱顶、拱腰结构应变数据统计表

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-YK659+040-GD-01	右洞YK659+040拱顶结构应变监测	-47.07	-100.49	53.42	-72.69	2026-01-21 08:16:42	2026-01-14 15:06:28	17.24	5.11	12.13	11.53	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 07:46:07	-0.3856
BML-YK659+040-YGY-01	右洞YK659+040右拱腰结构应变监测	-30.55	-97.5	66.96	-70.47	2025-12-15 07:27:29	2026-01-14 14:26:28	16.16	4.2	11.96	10.14	2026-01-18 15:36:37	2026-01-23 02:56:46	-0.362
BML-YK659+040-ZGY-01	右洞YK659+040左拱腰结构应变监测	14.64	-33.78	48.42	-13.39	2026-01-21 08:26:42	2026-01-14 14:36:28	15.78	4.22	11.56	10.05	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 07:46:07	-0.6718
BML-YK659+060-GD-01	右洞YK659+060拱顶结构应变监测	26.65	-6	32.65	9.12	2026-01-21 12:06:43	2026-01-13 16:56:26	16.18	5.35	10.83	10.85	2026-01-18 15:06:37	2026-01-03 07:46:07	-0.5624
BML-YK659+060-YGY-01	右洞YK659+060右拱腰结构应变监测	53.67	8.28	45.38	27.82	2026-01-03 08:16:07	2026-01-16 13:36:33	15.91	6.52	9.39	11.28	2025-12-13 12:57:25	2026-01-23 10:26:46	-0.5686
BML-YK659+060-ZGY-01	右洞YK659+060左拱腰结构应变监测	-8.6	-56.82	48.22	-34.04	2025-12-14 21:47:28	2026-01-13 15:56:26	15.94	4.15	11.79	9.98	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 08:16:07	-0.2412

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-YK659+080-GD-01	右洞YK659+080 拱顶结构应变监测	51.12	-6.77	57.89	17.79	2026-01-21 08:26:42	2026-01-13 16:06:26	16.11	4.35	11.76	10.24	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 07:46:07	-0.7505
BML-YK659+080-YGY-01	右洞YK659+080 右拱腰结构应变监测	-67.26	-119.01	51.75	-96.7	2025-12-14 20:57:28	2026-01-13 15:06:26	16.17	5.14	11.02	10.62	2026-01-18 15:16:37	2026-01-03 07:46:07	-0.0449
BML-YK659+080-ZGY-01	右洞YK659+080 左拱腰结构应变监测	-60.88	-87.38	26.5	-73.12	2026-01-31 06:37:01	2026-01-02 22:46:06	16.03	5.07	10.96	10.5	2026-01-18 15:46:37	2026-01-23 08:46:46	0.6218
BML-YK659+100-GD-01	右洞YK659+100 拱顶结构应变监测	43.61	-16.41	60.01	5.71	2026-01-21 08:26:42	2026-01-18 15:26:37	16.25	3.86	12.39	10.29	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 07:36:07	-0.6211
BML-YK659+100-YGY-01	右洞YK659+100 右拱腰结构应变监测	220.57	100.97	119.59	150	2026-01-21 08:26:42	2025-12-13 11:37:25	16.18	4.03	12.15	10.22	2026-01-18 15:26:37	2026-01-03 07:56:07	-0.8842
BML-YK659+100-ZGY-01	右洞YK659+100 左拱腰结构应变监测	405.81	179.11	226.71	271.18	2026-01-22 02:36:44	2025-12-13 11:47:25	16.17	3.21	12.95	10.1	2026-01-18 15:56:37	2026-01-22 02:36:44	-0.9441

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-YK659+150-GD-01	右洞YK659+150拱顶结构应变监测	44.89	-19.43	64.32	9.3	2026-01-03 07:56:07	2026-01-13 14:56:26	15.95	4.46	11.49	10.42	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 07:46:07	-0.6748
BML-YK659+150-YGY-01	右洞YK659+150右拱腰结构应变监测	-46.64	-94.06	47.42	-72.12	2025-12-13 16:07:26	2026-01-23 10:16:46	15.57	5.5	10.07	10.66	2026-01-18 15:46:37	2026-01-03 08:16:07	0.9555
BML-YK659+150-ZGY-01	右洞YK659+150左拱腰结构应变监测	30.03	-41.14	71.17	-10.94	2025-12-14 07:47:27	2026-01-14 14:36:28	16.11	5.4	10.71	10.93	2026-01-18 15:36:37	2026-01-03 07:46:07	-0.2107
BML-YK659+170-GD-01	右洞YK659+170拱顶结构应变监测	-71.18	-124.74	53.56	-103.67	2025-12-14 20:48:36	2026-01-14 14:37:36	15.38	4.68	10.7	10.32	2026-01-18 15:47:44	2026-01-03 07:47:14	0.0569
BML-YK659+170-YGY-01	右洞YK659+170右拱腰结构应变监测	28.61	-37.46	66.07	-12.57	2026-01-03 07:47:14	2025-12-17 14:35:55	15.84	4.79	11.05	10.81	2026-01-18 15:47:44	2026-01-03 07:47:14	-0.9463
BML-YK659+170-ZGY-01	右洞YK659+170左拱腰结构应变监测	19.08	-44.56	63.65	-15.07	2026-01-03 08:47:14	2026-01-18 19:17:45	15.83	5.63	10.21	11.04	2026-01-18 15:47:44	2026-01-03 07:47:14	-0.919

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-YK659+190-GD-01	右洞YK659+190拱顶结构应变监测	-22.95	-74.99	52.04	-55.06	2025-12-14 05:18:34	2026-01-14 14:17:36	15.67	4.54	11.13	10.27	2025-12-13 15:28:33	2026-01-23 02:57:53	-0.1058
BML-YK659+190-YGY-01	右洞YK659+190右拱腰结构应变监测	-20.42	-49.59	29.17	-35.79	2025-12-16 11:35:53	2026-01-14 07:07:35	16.47	5.6	10.87	11.67	2026-01-18 15:37:44	2026-01-03 07:47:14	0.2929
BML-YK659+190-ZGY-01	右洞YK659+190左拱腰结构应变监测	-20.75	-43.55	22.8	-30.69	2026-01-26 21:58:00	2026-01-03 03:37:14	16.22	6.8	9.43	11.9	2026-01-18 15:57:44	2026-01-03 07:47:14	0.6546
BML-YK659+210-GD-01	右洞YK659+210拱顶结构应变监测	-21.11	-61.67	40.56	-38.43	2025-12-13 16:38:33	2026-01-23 09:57:54	16.19	5.63	10.56	11.17	2026-01-18 14:47:44	2026-01-03 07:47:14	0.8503
BML-YK659+210-YGY-01	右洞YK659+210右拱腰结构应变监测	68.89	35.47	33.41	48.32	2026-01-21 08:47:50	2026-01-19 09:47:46	15.74	5.14	10.6	10.61	2025-12-13 15:28:33	2026-01-03 07:47:14	-0.673
BML-YK659+210-ZGY-01	右洞YK659+210左拱腰结构应变监测	-26.81	-72.99	46.19	-57.65	2025-12-14 20:48:36	2026-01-14 16:07:36	16.23	6.21	10.02	11.5	2025-12-13 15:28:33	2026-01-03 07:47:14	-0.0952

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-YK659+230-GD-01	右洞 YK659+230 拱顶结构应变监测	178.41	58.97	119.44	112.77	2026-01-21 08:27:50	2025-12-13 11:38:33	15.88	5.22	10.66	10.76	2025-12-13 16:08:33	2026-01-03 07:47:14	-0.9639
BML-YK659+230-YGY-01	右洞 YK659+230 右拱腰结构应变监测	-32.15	-71.31	39.15	-57.96	2025-12-14 20:58:36	2026-01-14 20:47:36	15.67	5.45	10.23	10.77	2025-12-13 15:28:33	2026-01-03 07:47:14	-0.208
BML-YK659+230-ZGY-01	右洞 YK659+230 左拱腰结构应变监测	-80.31	-125.14	44.83	-103.95	2025-12-14 20:48:36	2026-01-14 15:07:36	16.23	6.87	9.35	11.85	2026-01-18 15:17:44	2026-01-03 08:27:14	-0.2171
BML-YK661+680-GD-01	右洞 YK661+680 拱顶结构应变监测	-26.04	-46.56	20.53	-34.21	2025-12-13 20:39:32	2026-01-29 08:49:03	17.11	12.46	4.65	15.14	2025-12-13 02:49:30	2026-01-03 08:28:12	0.9018
BML-YK661+680-YGY-01	右洞 YK661+680 右拱腰结构应变监测	-109.34	-157.49	48.15	-139.91	2025-12-13 06:29:30	2026-01-23 06:18:52	16.97	12.8	4.17	15.14	2025-12-13 02:49:30	2026-01-03 08:28:12	0.4093
BML-YK661+680-ZGY-01	右洞 YK661+680 左拱腰结构应变监测	73.56	31.53	42.03	52.4	2026-01-03 08:28:12	2025-12-13 04:09:30	17	12.37	4.63	14.97	2025-12-13 02:59:30	2026-01-03 08:28:12	-0.914

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-YK661+710-GD-01	右洞YK661+710拱顶结构应变监测	92.77	68.46	24.31	82.5	2026-01-03 18:38:13	2025-12-14 16:19:33	17.27	12.15	5.12	15.31	2025-12-13 23:29:32	2026-01-03 08:28:12	-0.4546
BML-YK661+710-YGY-01	右洞YK661+710右拱腰结构应变监测	42.49	26.37	16.12	34.32	2026-01-04 04:38:14	2025-12-14 21:39:34	17.36	13.04	4.33	15.61	2025-12-13 23:59:32	2026-01-03 08:28:12	0.2658
BML-YK661+710-ZGY-01	右洞YK661+710左拱腰结构应变监测	-4.68	-40.1	35.42	-25.29	2025-12-14 23:09:34	2026-01-24 04:18:53	17.27	12.53	4.74	15.37	2025-12-13 23:29:32	2026-01-03 08:38:12	-0.208
BML-YK661+730-GD-01	右洞YK661+730拱顶结构应变监测	-114.11	-161.57	47.46	-144.47	2025-12-12 22:49:30	2026-01-23 03:58:52	17.37	12.73	4.64	15.55	2025-12-13 02:39:30	2026-01-03 08:28:12	0.2807
BML-YK661+730-YGY-01	右洞YK661+730右拱腰结构应变监测	-41.65	-101.73	60.08	-82.34	2025-12-12 22:59:30	2026-01-15 00:58:35	17.65	13.48	4.18	15.86	2025-12-13 23:19:32	2026-01-03 08:28:12	0.3974
BML-YK661+730-ZGY-01	右洞YK661+730左拱腰结构应变监测	-53.66	-122.23	68.57	-98.12	2025-12-12 20:39:29	2026-01-23 04:18:52	16.9	12.63	4.27	15.22	2025-12-13 02:49:30	2026-01-03 08:28:12	0.3348

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK659+180-GD-01	左洞ZK659+180拱顶结构应变监测	-43.84	-100.23	56.39	-79.31	2025-12-14 21:13:51	2026-01-12 15:22:47	17.1	7.33	9.77	13.5	2025-12-13 17:33:49	2026-01-03 07:32:30	0.0291
BML-ZK659+180-YGY-01	左洞ZK659+180右拱腰结构应变监测	10.75	-30.02	40.77	-11.69	2026-01-21 05:13:05	2026-01-26 15:33:16	17.35	7.54	9.81	13.51	2025-12-13 18:13:49	2026-01-23 03:03:09	-0.5832
BML-ZK659+180-ZGY-01	左洞ZK659+180左拱腰结构应变监测	-4.05	-44.17	40.11	-29.02	2025-12-14 23:23:52	2026-01-26 15:33:16	17.13	7.75	9.38	13.52	2025-12-13 17:33:49	2026-01-22 09:43:07	-0.1125
BML-ZK659+206-GD-01	左洞ZK659+206拱顶结构应变监测	-18.35	-59.64	41.29	-37.17	2025-12-13 17:33:49	2026-01-23 01:43:09	18.86	9.95	8.91	15.41	2025-12-13 18:13:49	2026-01-03 08:22:30	0.9814
BML-ZK659+206-YGY-01	左洞ZK659+206右拱腰结构应变监测	102.56	69.38	33.18	86.27	2026-01-21 04:23:05	2026-01-26 15:33:16	17.35	7.75	9.6	13.82	2025-12-13 18:03:49	2026-01-03 07:32:30	-0.524
BML-ZK659+206-ZGY-01	左洞ZK659+206左拱腰结构应变监测	105.13	48.41	56.71	65.33	2026-01-21 04:23:05	2025-12-13 17:23:49	16.84	6.77	10.06	13.36	2025-12-13 18:13:49	2026-01-03 07:32:30	-0.9148

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK659+226-GD-01	左洞ZK659+226拱顶结构应变监测	42.33	3.27	39.06	21.52	2026-01-21 09:23:05	2026-01-26 18:43:16	17.51	9.51	8.01	14.48	2025-12-13 18:13:49	2026-01-03 08:22:30	-0.592
BML-ZK659+226-YGY-01	左洞ZK659+226右拱腰结构应变监测	77.62	18.85	58.78	43.28	2026-01-03 07:32:30	2026-01-26 15:23:15	18.13	7.67	10.46	14.26	2025-12-13 18:03:49	2026-01-22 09:13:07	-0.8692
BML-ZK659+226-ZGY-01	左洞ZK659+226左拱腰结构应变监测	102.4	16.66	85.73	46.06	2026-01-22 02:43:07	2026-01-26 15:23:15	17.2	7.77	9.42	13.6	2025-12-13 17:23:49	2026-01-03 08:02:30	-0.9509
BML-ZK659+246-GD-01	左洞ZK659+246拱顶结构应变监测	-53.04	-80.85	27.81	-70.85	2025-12-12 19:23:47	2026-01-26 15:23:15	17.1	9.96	7.14	14.33	2025-12-13 18:03:49	2026-01-03 08:32:30	0.2633
BML-ZK659+246-YGY-01	左洞ZK659+246右拱腰结构应变监测	-27.99	-98.79	70.8	-65.52	2026-01-03 03:42:29	2026-01-26 15:23:15	17.88	8.05	9.82	14.18	2025-12-13 17:23:49	2026-01-22 09:13:07	-0.8307
BML-ZK659+246-ZGY-01	左洞ZK659+246左拱腰结构应变监测	52.39	-24.24	76.63	7.96	2026-01-03 03:42:29	2026-01-26 15:23:15	17.44	7.73	9.71	13.82	2025-12-13 18:13:49	2026-01-03 07:32:30	-0.677

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK661+565-GD-01	左洞 ZK661+565 拱顶结构应变监测	-17.37	-43.8	26.43	-34.63	2025-12-13 13:14:57	2026-01-23 02:34:17	18.91	13.71	5.2	16.5	2025-12-12 19:34:55	2026-01-31 09:44:33	0.3891
BML-ZK661+565-YGY-01	左洞 ZK661+565 右拱腰结构应变监测	-61.6	-98.92	37.31	-84.75	2025-12-13 03:44:56	2026-01-09 19:13:50	20.19	14.7	5.49	17.31	2025-12-12 19:44:55	2026-01-31 09:44:33	0.6003
BML-ZK661+565-ZGY-01	左洞 ZK661+565 左拱腰结构应变监测	-48.98	-69.72	20.74	-63.36	2025-12-12 20:14:55	2026-01-13 00:53:57	19.21	14.26	4.95	16.76	2025-12-12 19:54:55	2026-01-31 11:24:33	0.7989
BML-ZK661+640-GD-01	左洞 ZK659+640 拱顶结构应变监测	-113.78	-172.13	58.35	-153.72	2025-12-13 06:44:56	2026-01-31 22:54:34	18.73	13.48	5.25	16.3	2025-12-12 17:44:55	2026-01-31 11:14:33	0.7571
BML-ZK661+640-YGY-01	左洞 ZK661+640 右拱腰结构应变监测	-112.1	-176.54	64.45	-153.29	2025-12-13 08:34:56	2026-01-31 23:14:34	18.49	12.99	5.5	16.01	2025-12-12 19:34:55	2026-01-31 09:54:33	0.6886
BML-ZK661+640-ZGY-01	左洞 ZK661+640 左拱腰结构应变监测	-95.64	-184.13	88.5	-151.7	2025-12-12 19:14:55	2026-01-31 11:44:33	19.06	13.1	5.96	16.33	2025-12-12 19:14:55	2026-01-31 09:54:33	0.8204

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK661+670-GD-01	左洞 ZK661+670 拱顶结构应变监测	24.58	-14.25	38.83	3.53	2025-12-13 08:34:56	2026-01-31 23:44:34	19.46	13.92	5.54	16.68	2025-12-12 19:24:55	2026-01-31 09:54:33	0.7573
BML-ZK661+670-YGY-01	左洞 ZK661+670 右拱腰结构应变监测	78	48.38	29.62	65.7	2026-01-31 11:34:33	2025-12-13 02:24:56	18.65	13.25	5.41	16.14	2025-12-12 19:24:55	2026-01-31 09:44:33	-0.859
BML-ZK661+670-ZGY-01	左洞 ZK661+670 左拱腰结构应变监测	0.45	-24.7	25.15	-17.46	2025-12-13 13:14:57	2026-01-29 19:04:30	17.16	12.09	5.07	14.98	2025-12-12 19:14:55	2026-01-31 11:44:33	0.5375
BML-ZK661+690-GD-01	左洞 ZK661+690 拱顶结构应变监测	23.6	0.84	22.77	8.17	2025-12-13 13:14:57	2026-01-24 20:34:21	19.32	14.65	4.67	16.81	2025-12-12 19:34:55	2026-01-31 09:54:33	0.3577
BML-ZK661+690-YGY-01	左洞 ZK661+690 右拱腰结构应变监测	-2.93	-25.07	22.14	-17.6	2025-12-13 08:34:56	2026-01-11 21:13:54	18.2	13.4	4.8	16.07	2025-12-12 17:44:55	2026-01-31 09:44:33	0.2152
BML-ZK661+690-ZGY-01	左洞 ZK661+690 左拱腰结构应变监测	49.78	14.45	35.33	34.62	2026-01-31 09:54:33	2025-12-12 20:54:55	19.1	14.2	4.9	16.61	2025-12-12 19:04:55	2026-01-31 11:14:33	-0.8325

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK663+690-GD-01	左洞ZK663+690拱顶结构应变监测	-34.39	-77.78	43.39	-55.74	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:05:49	17.81	8.81	8.99	14.03	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 09:45:49	0.9775
BML-ZK663+690-YGY-01	左洞ZK663+690右拱腰结构应变监测	6.06	-10.8	16.85	-3.65	2025-12-14 05:06:14	2026-01-23 14:05:33	17.35	9.34	8.01	13.72	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:55:49	0.5871
BML-ZK663+690-ZGY-01	左洞ZK663+690左拱腰结构应变监测	-6.87	-71.91	65.04	-49.46	2025-12-13 09:06:12	2026-01-25 08:55:37	17.31	7.63	9.68	12.88	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:25:49	0.0291
BML-ZK663+720-GD-01	左洞ZK663+720拱顶结构应变监测	5.37	-32.2	37.57	-11.88	2025-12-18 22:43:38	2026-01-31 11:05:49	18.22	7.85	10.37	13.8	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:05:49	0.9708
BML-ZK663+720-YGY-01	左洞ZK663+720右拱腰结构应变监测	1.98	-53.05	55.03	-26.28	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:55:49	17.8	8.06	9.74	13.58	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:25:49	0.8988
BML-ZK663+720-ZGY-01	左洞ZK663+720左拱腰结构应变监测	147.56	80.13	67.43	109.01	2025-12-13 11:46:12	2026-01-29 21:45:46	17.27	7.73	9.54	13.02	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:25:49	-0.35

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK663+740-GD-01	左洞 ZK663+740 拱顶结构应变监测	52.13	14.37	37.77	28.98	2025-12-13 13:36:13	2026-01-30 02:05:46	17.83	7.98	9.85	13.93	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 09:45:49	-0.1677
BML-ZK663+740-YGY-01	左洞 ZK663+740 右拱腰结构应变监测	-154.42	-244.81	90.38	-217.48	2025-12-13 07:56:12	2026-01-12 06:05:11	19.55	9.64	9.91	15.11	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 09:45:49	0.387
BML-ZK663+740-ZGY-01	左洞 ZK663+740 左拱腰结构应变监测	350.88	160.7	190.17	268.5	2026-01-31 15:45:49	2025-12-13 03:16:12	16.64	7.43	9.2	12.47	2025-12-31 21:34:49	2026-01-31 11:35:49	-0.807
BML-ZK663+760-GD-01	左洞 ZK663+760 拱顶结构应变监测	63.14	0.97	62.17	25.51	2025-12-13 13:16:13	2026-01-29 21:35:46	17.83	7.78	10.05	13.18	2025-12-12 21:06:11	2026-01-31 11:15:49	-0.3707
BML-ZK663+760-YGY-01	左洞 ZK663+760 右拱腰结构应变监测	-44.41	-95.32	50.91	-75.63	2025-12-12 20:56:11	2026-01-13 04:25:13	17.94	8.1	9.84	13.66	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:25:49	0.8036
BML-ZK663+760-ZGY-01	左洞 ZK663+760 左拱腰结构应变监测	-29.88	-71.34	41.46	-51.68	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 08:55:48	17.66	8.69	8.97	13.86	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 09:45:49	0.9118

测点编号	测点名称	应变最大值/με	应变最小值/με	应变极差/με	应变均值/με	应变最大值时间	应变最小值时间	温度最大值/°C	温度最小值/°C	温度极差/°C	温度均值/°C	温度最大值时间	温度最小值时间	应变-温度相关系数
BML-ZK663+780-GD-01	左洞 ZK663+780 拱顶结构应变监测	14.44	-67.5	81.94	-42.77	2025-12-13 08:56:12	2026-01-25 11:25:37	17.82	8.59	9.23	13.83	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 09:45:49	0.3762
BML-ZK663+780-YGY-01	左洞 ZK663+780 右拱腰结构应变监测	-27.65	-92.93	65.28	-67.11	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 23:45:50	17.37	7.73	9.64	13.01	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 07:25:48	0.5556
BML-ZK663+780-ZGY-01	左洞 ZK663+780 左拱腰结构应变监测	-69.82	-141.99	72.17	-119.04	2025-12-13 07:46:12	2026-01-12 05:15:11	17.43	8.52	8.9	13.45	2025-12-12 20:56:11	2026-01-31 11:15:49	0.4282

4.2 水压力

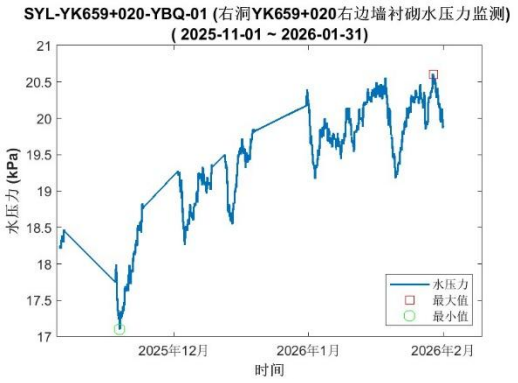
SYL-YK659+020-YBQ-01 (右洞YK659+020右边墙衬砌水压力监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水压力 (kPa)
时间
水压力
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月

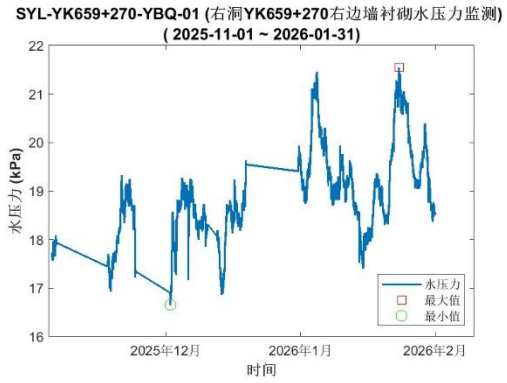
SYL-YK659+270-YBQ-01 (右洞YK659+270右边墙衬砌水压力监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水压力 (kPa)
时间
水压力
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月

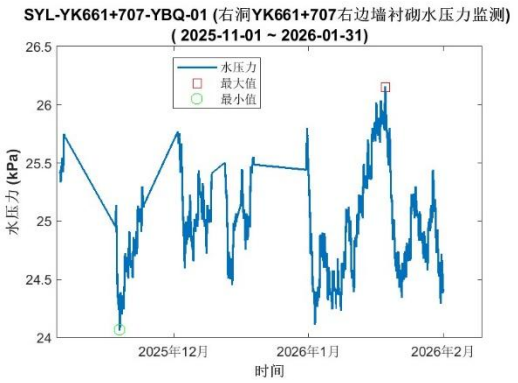
SYL-YK661+707-YBQ-01 (右洞YK661+707右边墙衬砌水压力监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水压力 (kPa)
时间
水压力
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月

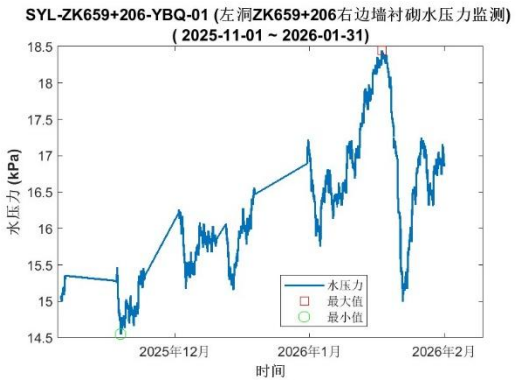
SYL-ZK659+206-YBQ-01 (左洞ZK659+206右边墙衬砌水压力监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水压力 (kPa)
时间
水压力
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月

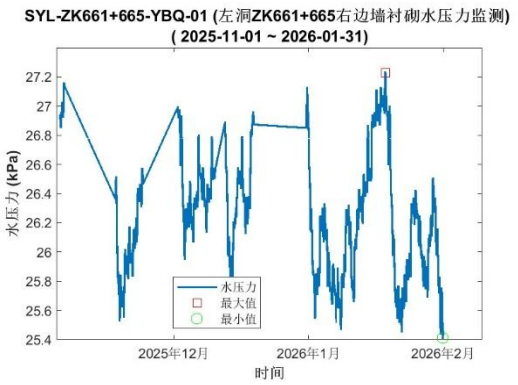
SYL-ZK661+665-YBQ-01 (左洞ZK661+665右边墙衬砌水压力监测)
(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水压力 (kPa)
时间
水压力
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月

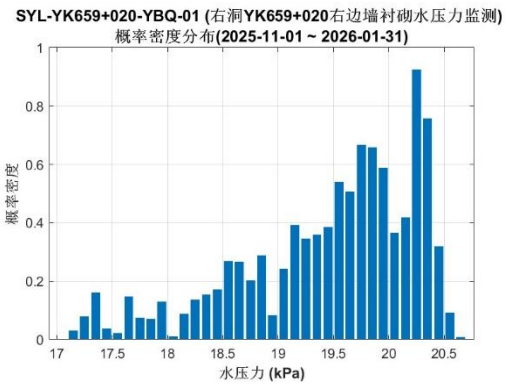
SYL-YK659+020-YBQ-01 (右洞YK659+020右边墙衬砌水压力监测)
概率密度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
水压力 (kPa)

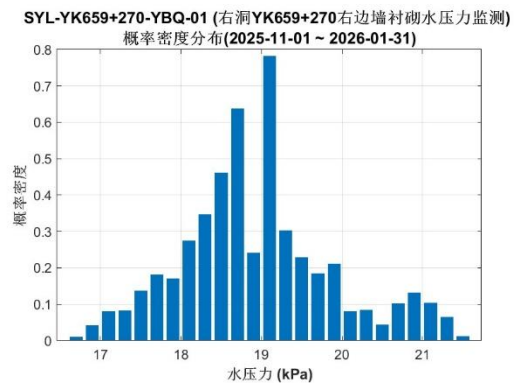
SYL-YK659+270-YBQ-01 (右洞YK659+270右边墙衬砌水压力监测)
概率密度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
水压力 (kPa)

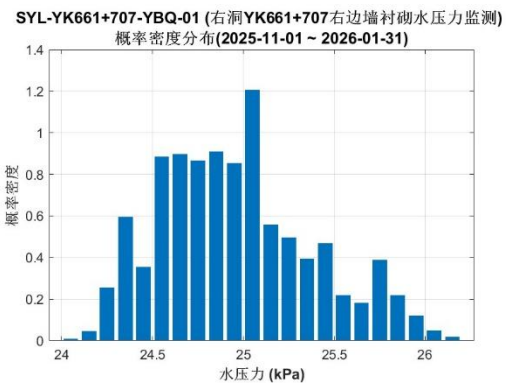
SYL-YK661+707-YBQ-01 (右洞YK661+707右边墙衬砌水压力监测)
概率密度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
水压力 (kPa)

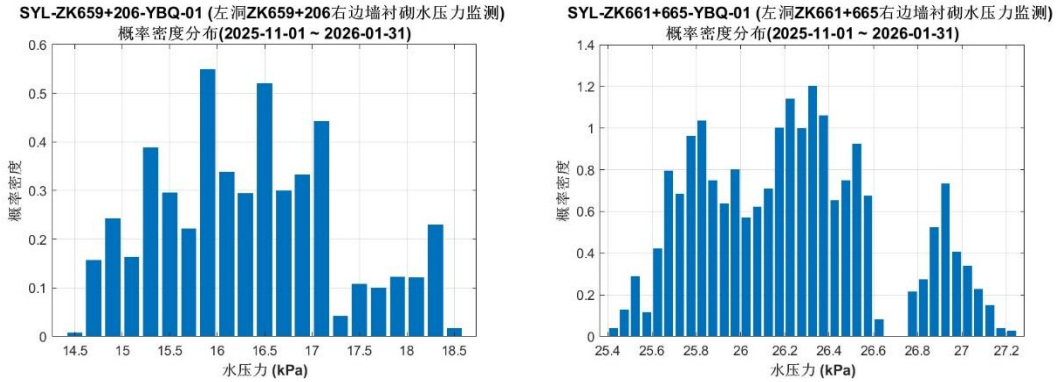

图 4.2-1 边墙衬砌水压力分析图

表 4.2-1 边墙衬砌水压力数据表

测点编号	测点名称	水压力最大值/kPa	水压力最小值/kPa	水压力极差/kPa	水压力均值/kPa	水压力标准差/kPa	水压力最大值时间	水压力最小值时间
SYL-YK659+020-YBQ-01	右洞YK659+020右边墙衬砌水压力监测	20.61	17.1	3.51	19.46	0.8	2026-01-29 16:56:58	2025-11-18 10:21:35
SYL-YK659+270-YBQ-01	右洞YK659+270右边墙衬砌水压力监测	21.55	16.66	4.89	18.94	0.95	2026-01-23 14:57:54	2025-12-01 23:22:52
SYL-YK661+707-YBQ-01	右洞YK661+707右边墙衬砌水压力监测	26.15	24.07	2.09	24.96	0.42	2026-01-18 15:38:43	2025-11-18 09:23:40
SYL-ZK659+206-YBQ-01	左洞ZK659+206右边墙衬砌水压力监测	18.44	14.55	3.89	16.33	0.95	2026-01-17 16:02:58	2025-11-18 09:47:58
SYL-ZK661+665-YBQ-01	左洞ZK661+665右边墙衬砌水压力监测	27.23	25.41	1.83	26.23	0.41	2026-01-18 15:04:08	2026-01-31 22:54:34

5 环境监测

5.1 气象


QXZ-YK665+835-DK-01 (YK665+835洞口气象监测) 风速时程
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)
风速 (m/s)
风速
最大值
最小值
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月


QXZ-ZK658+005-DK-01 (ZK658+005洞口气象监测) 风速时程
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)
风速 (m/s)
风速
最大值
最小值
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月


QXZ-YK665+835-DK-01 (YK665+835洞口气象监测) 风向玫瑰图
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)


QXZ-ZK658+005-DK-01 (ZK658+005洞口气象监测) 风向玫瑰图
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)


QXZ-YK665+835-DK-01 (YK665+835洞口气象监测) 气压时程
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)
气压 (hpa)
气压
最大值
最小值
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月


QXZ-ZK658+005-DK-01 (ZK658+005洞口气象监测) 气压时程
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)
气压 (hpa)
气压
最大值
最小值
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月


QXZ-YK665+835-DK-01 (YK665+835洞口气象监测) 能见度时程
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)
能见度 (m)
能见度
最大值
最小值
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


QXZ-ZK658+005-DK-01 (ZK658+005洞口气象监测) 能见度时程
(时间范围: 2025-11-01 ~ 2026-01-31)
能见度 (m)
能见度
最大值
最小值
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间

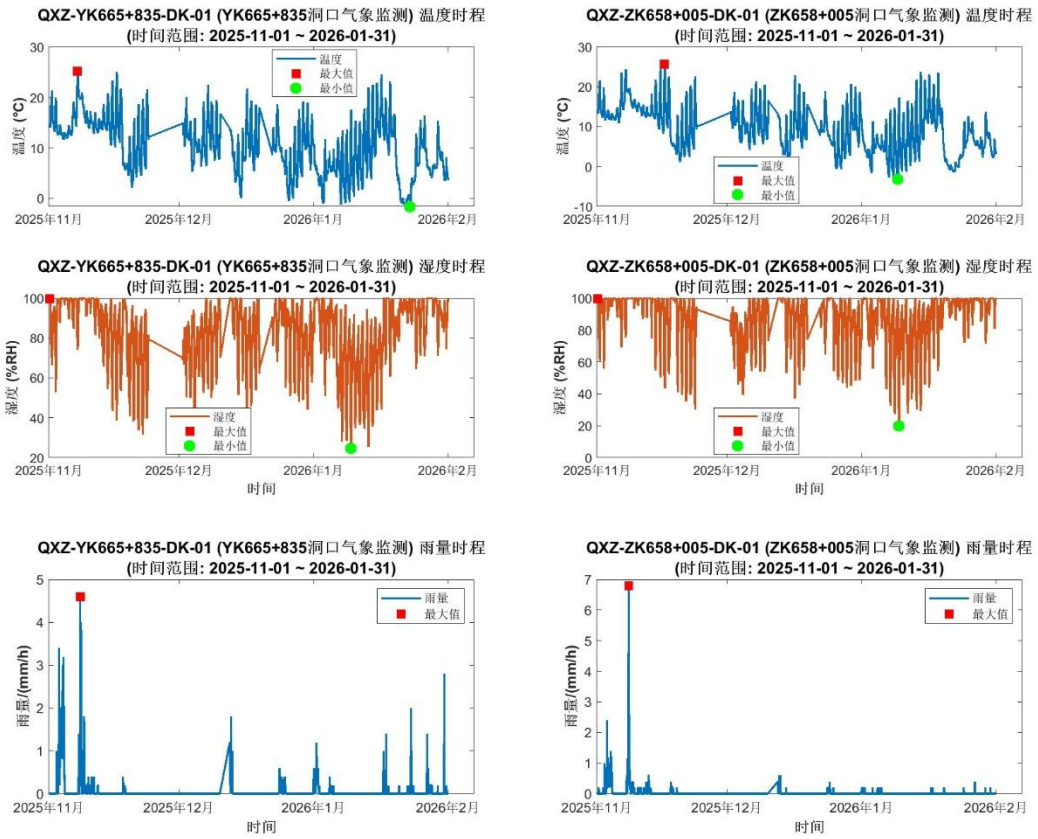

图 5.1-1 气象要素分析图

表 5.1-1 气象要素统计表

测点编号	QXZ-YK665+835-DK-01	QXZ-ZK658+005-DK-01
测点名称	YK665+835 洞口气象监测	ZK658+005 洞口气象监测
温度/℃最大值	25.3	25.8
温度/℃最小值	-1.6	-3.1
温度/℃极差	26.9	28.9
温度/℃最大值时间	2025-11-07 13:16:33	2025-11-16 14:38:23
温度/℃最小值时间	2026-01-23 04:34:18	2026-01-09 07:13:25
湿度/%最大值	99.9	99.9
湿度/%最小值	24.6	19.7
湿度/%极差	75.3	80.2
湿度/%最大值时间	2025-11-01 00:01:47	2025-11-01 00:02:55
湿度/%最小值时间	2026-01-09 15:33:17	2026-01-09 13:44:09
风速/m/s 最大值	8.4	6.9
风速/m/s 最小值	0	0
风速/m/s 极差	8.4	6.9
风速/m/s 最大值时间	2026-01-06 22:00:49	2025-12-23 07:18:54
风速/m/s 最小值时间	2025-11-01 01:12:01	2025-11-01 00:17:57
风向/°最大值	315	315
风向/°最小值	0	0

风向/°极差	315	315
风向/°最大值时间	2025-11-01 00:06:48	2025-11-01 02:23:16
风向/°最小值时间	2025-11-01 01:57:11	2025-11-01 00:17:57
气压/hpa 最大值	99.6	99.3
气压/hpa 最小值	97.2	96.8
气压/hpa 极差	2.4	2.5
气压/hpa 最大值时间	2025-11-18 09:36:48	2025-11-18 09:09:17
气压/hpa 最小值时间	2026-01-16 14:09:31	2026-01-18 15:09:28
能见度/m 最大值	46377	49963
能见度/m 最小值	183	1183
能见度/m 极差	46194	48780
能见度/m 最大值时间	2026-01-31 17:58:57	2025-12-18 21:20:25
能见度/m 最小值时间	2026-01-18 08:02:40	2025-11-13 08:26:03

表 5.1-2 降雨量统计表

测点编号	QXZ-YK665+835-DK-01	QXZ-ZK658+005-DK-01
测点名称	YK665+835 洞口气象监测	ZK658+005 洞口气象监测
雨量最大值/(mm/h)	4.6	6.8
雨量最小值/(mm/h)	0	0
雨量极差/(mm/h)	4.6	6.8
雨量均值/(mm/h)	0.08	0.04
雨量标准差/(mm/h)	0.34	0.26
雨量最大值时间	2025-11-08 04:00:01	2025-11-08 08:00:01
雨量最小值时间	2025-11-01 00:00:06	2025-11-01 00:00:06
零星小雨/（小时雨量/次）	1611	1662
小雨/（小时雨量/次）	166	135
中雨/（小时雨量/次）	27	7
大雨/（小时雨量/次）	0	0
暴雨/（小时雨量/次）	0	0
大暴雨/（小时雨量/次）	0	0
特大暴雨/（小时雨量/次）	0	0

5.2 温湿度


WSD-YK659+040-YBQ-01
(右洞YK659+040温湿度监测) 温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


WSD-YK661+750-YBQ-01
(右洞YK661+750温湿度监测) 温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


WSD-YK659+040-YBQ-01
(右洞YK659+040温湿度监测) 湿度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
湿度 (%RH)
湿度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间

WSD-YK661+750-YBQ-01
(右洞YK661+750温湿度监测) 湿度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
湿度 (%RH)
湿度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


WSD-YK664+730-YBQ-01
(右洞YK664+730温湿度监测) 温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


WSD-ZK659+250-YBQ-01
(左洞ZK659+250温湿度监测) 温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


WSD-YK664+730-YBQ-01
(右洞YK664+730温湿度监测) 湿度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
湿度 (%RH)
湿度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间

WSD-ZK659+250-YBQ-01
(左洞ZK659+250温湿度监测) 湿度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
湿度 (%RH)
湿度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间

WSD-ZK661+670-YBQ-01
(左洞ZK661+670温湿度监测) 温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


WSD-ZK663+880-YBQ-01
(左洞ZK663+880温湿度监测) 温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月

WSD-ZK661+670-YBQ-01
(左洞ZK661+670温湿度监测) 湿度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
湿度 (%RH)
湿度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


WSD-ZK663+880-YBQ-01
(左洞ZK663+880温湿度监测) 湿度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
湿度 (%RH)
湿度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


WSD-YK659+040-YBQ-01
(右洞YK659+040温湿度监测) 温度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
温度 (°C)


WSD-YK661+750-YBQ-01
(右洞YK661+750温湿度监测) 温度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
温度 (°C)


WSD-YK659+040-YBQ-01
(右洞YK659+040温湿度监测) 湿度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
湿度 (%RH)


WSD-YK661+750-YBQ-01
(右洞YK661+750温湿度监测) 湿度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
湿度 (%RH)


WSD-YK664+730-YBQ-01
(右洞YK664+730温湿度监测) 温度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
温度 (°C)


WSD-ZK659+250-YBQ-01
(左洞ZK659+250温湿度监测) 温度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
温度 (°C)


WSD-YK664+730-YBQ-01
(右洞YK664+730温湿度监测) 湿度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
湿度 (%RH)


WSD-ZK659+250-YBQ-01
(左洞ZK659+250温湿度监测) 湿度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
湿度 (%RH)


WSD-ZK661+670-YBQ-01
(左洞ZK661+670温湿度监测) 温度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
温度 (°C)


WSD-ZK663+880-YBQ-01
(左洞ZK663+880温湿度监测) 温度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
温度 (°C)


WSD-ZK661+670-YBQ-01
(左洞ZK661+670温湿度监测) 湿度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
湿度 (%RH)


WSD-ZK663+880-YBQ-01
(左洞ZK663+880温湿度监测) 湿度分布(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
概率密度
湿度 (%RH)

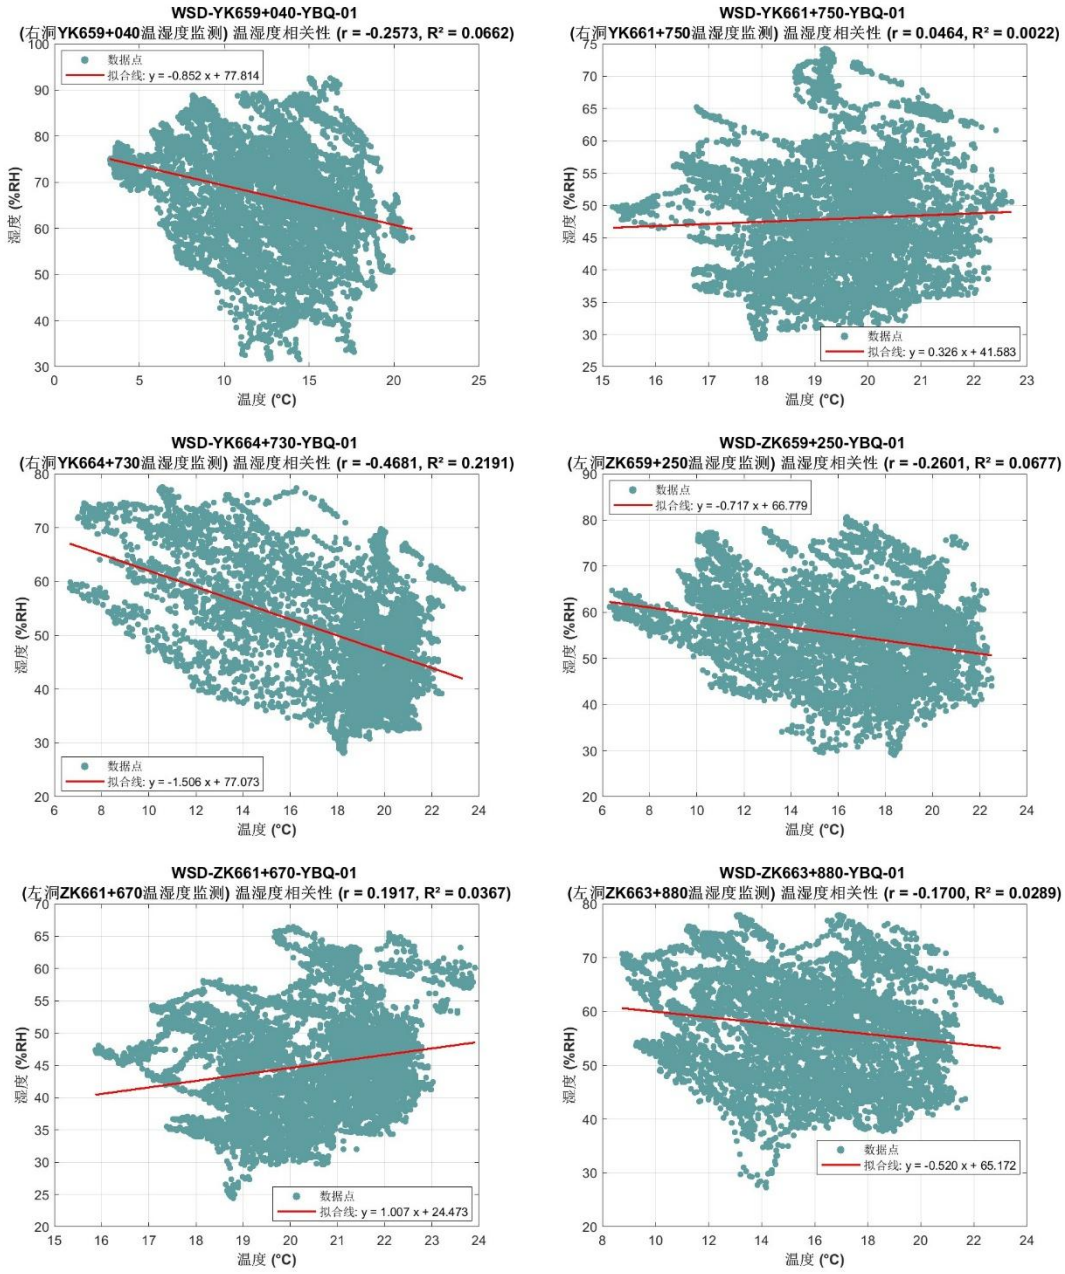

图 5.2-1 温湿度分析图

表 5.2-1 温湿度数据统计表

测点编号	WSD-YK659+040-YBQ-01	WSD-YK661+750-YBQ-01	WSD-YK664+730-YBQ-01	WSD-ZK659+250-YBQ-01	WSD-ZK661+670-YBQ-01	WSD-ZK663+880-YBQ-01
测点名称	右洞YK659+040温湿度监测	右洞YK661+750温湿度监测	右洞YK664+730温湿度监测	左洞ZK659+250温湿度监测	左洞ZK661+670温湿度监测	左洞ZK663+880温湿度监测
温度最大值/°C	21.07	22.71	23.31	22.51	23.92	23.01

测点编号	WSD-YK659+040-YBQ-01	WSD-YK661+750-YBQ-01	WSD-YK664+730-YBQ-01	WSD-ZK659+250-YBQ-01	WSD-ZK661+670-YBQ-01	WSD-ZK663+880-YBQ-01
测点名称	右洞YK659+040温湿度监测	右洞YK661+750温湿度监测	右洞YK664+730温湿度监测	左洞ZK659+250温湿度监测	左洞ZK661+670温湿度监测	左洞ZK663+880温湿度监测
温度最小值/°C	3.25	15.2	6.64	6.3	15.87	8.74
温度均值/°C	12.4	19.39	17.92	16.52	20.26	15.9
温度最大值时间	2025-11-17 13:57:02	2025-11-18 12:47:15	2025-11-05 04:13:53	2025-11-19 04:26:34	2025-11-04 19:43:10	2025-11-05 01:03:21
温度最小值时间	2026-01-22 02:32:13	2026-01-31 07:02:41	2026-01-07 05:32:04	2026-01-22 02:31:42	2026-01-31 11:42:10	2026-01-31 11:02:21
湿度最大值/%	92.55	74.28	77.58	80.7	66.41	77.98
湿度最小值/%	31.53	29.32	28.07	29.08	24.38	27.3
湿度均值/%	67.25	47.91	50.08	54.94	44.86	56.91
湿度最大值时间	2025-12-12 18:52:53	2026-01-17 18:02:15	2026-01-26 21:32:43	2025-11-04 23:53:00	2026-01-18 22:11:46	2026-01-26 04:02:10
湿度最小值时间	2026-01-09 15:11:48	2026-01-08 16:11:57	2026-01-08 16:32:07	2026-01-09 15:11:17	2026-01-09 14:11:27	2026-01-09 14:31:37
温湿度相关系数	-0.2573	0.0464	-0.4681	-0.2601	0.1917	-0.17

5.3 水流量


SLL-YK658+480-BG-01 (右洞YK658+480洞口水流量监测)
水流量(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水流量 (L/s)
水流量
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


SLL-YK665+339-BG-01 (右洞YK665+339洞口水流量监测)
水流量(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水流量 (L/s)
水流量
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


SLL-YK658+480-BG-01 (右洞YK658+480洞口水流量监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


SLL-YK665+339-BG-01 (右洞YK665+339洞口水流量监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


SLL-ZK658+501-BG-01 (左洞ZK658+480洞口水流量监测)
水流量(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水流量 (L/s)
水流量
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


SLL-ZK665+342-BG-01 (左洞ZK665+342洞口水流量监测)
水流量(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
水流量 (L/s)
水流量
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月


SLL-ZK658+501-BG-01 (左洞ZK658+480洞口水流量监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间


SLL-ZK665+342-BG-01 (左洞ZK665+342洞口水流量监测)
温度(2025-11-01 ~ 2026-01-31)
温度 (°C)
温度
最大值
最小值
2025年12月
2026年1月
2026年2月
时间

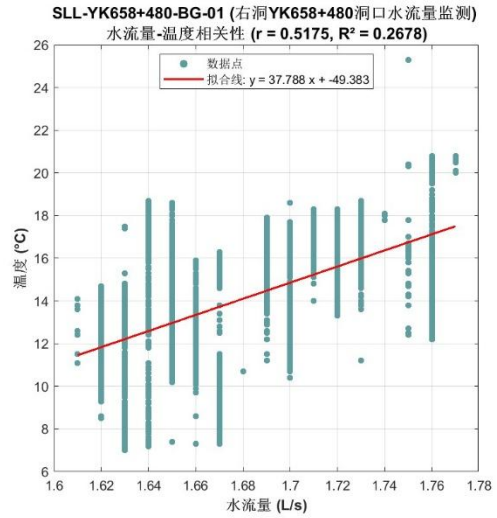
SLL-YK658+480-BG-01 (右洞YK658+480洞口水流量监测)
水流量-温度相关性 (r = 0.5175, R² = 0.2678)
数据点
拟合线: y = 37.788 x + -49.383
温度 (°C)
水流量 (L/s)

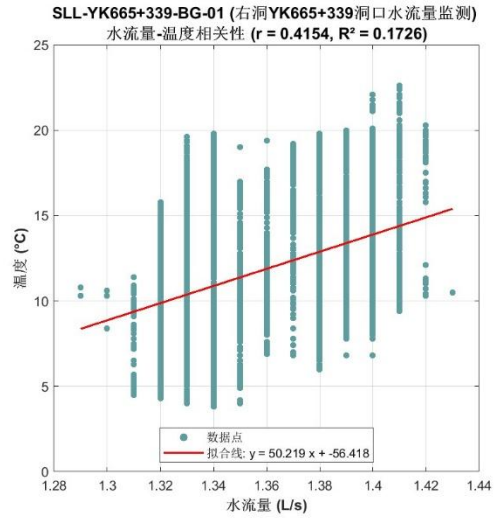
SLL-YK665+339-BG-01 (右洞YK665+339洞口水流量监测)
水流量-温度相关性 (r = 0.4154, R² = 0.1726)
数据点
拟合线: y = 50.219 x + -56.418
温度 (°C)
水流量 (L/s)

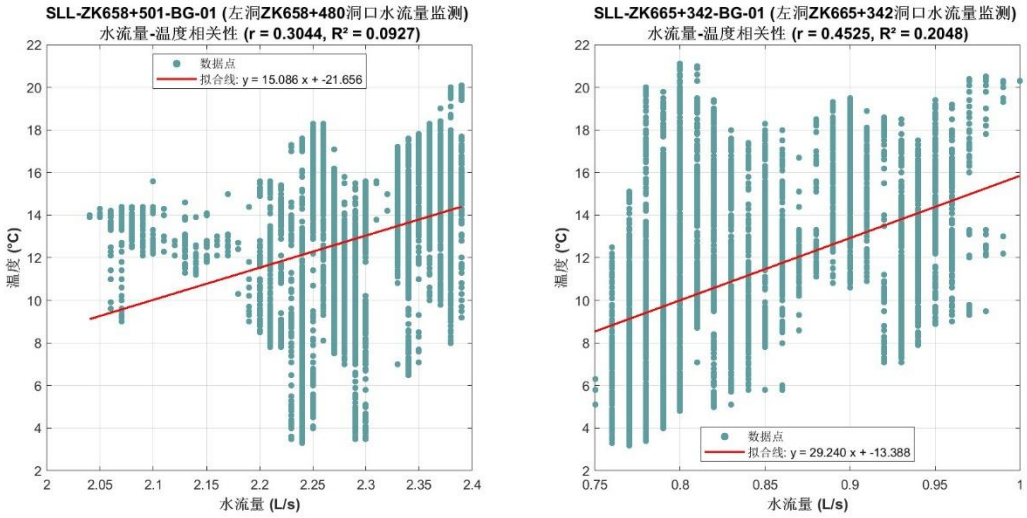

图 5.3-1 洞口水流量分析图

表 5.3-1 洞口水流量数据统计表

测点编号	SLL-YK658+480-BG-01	SLL-YK665+339-BG-01	SLL-ZK658+501-BG-01	SLL-ZK665+342-BG-01
测点名称	右洞 YK658+480 洞口水流量监测	右洞 YK665+339 洞口水流量监测	左洞 ZK658+480 洞口水流量监测	左洞 ZK665+342 洞口水流量监测
水流量最大值/L/s	1.77	1.43	2.39	1
水流量最小值/L/s	1.61	1.29	2.04	0.75
水流量极差/L/s	0.16	0.14	0.35	0.25
水流量均值/L/s	1.67	1.36	2.29	0.84
水流量最大值时间	2025-11-17 12:36:55	2025-11-18 15:57:08	2025-11-17 12:06:35	2025-11-17 15:46:45
水流量最小值时间	2026-01-31 01:12:24	2026-01-28 10:32:29	2026-01-30 22:22:03	2026-01-11 08:11:34
温度最大值/°C	25.3	22.6	20.1	21.1
温度最小值/°C	7	3.8	3.3	3.2
温度极差/°C	18.3	18.8	16.8	17.9
温度均值/°C	13.79	11.77	12.96	11.19
温度最大值时间	2025-11-04 16:53:18	2025-11-17 13:27:05	2025-11-17 16:26:35	2026-01-16 14:31:45
温度最小值时间	2026-01-23 01:52:08	2026-01-09 07:01:51	2026-01-23 02:41:48	2026-01-22 13:51:57

测点编号	SLL-YK658+480-BG-01	SLL-YK665+339-BG-01	SLL-ZK658+501-BG-01	SLL-ZK665+342-BG-01
测点名称	右洞 YK658+480 洞口水流量监测	右洞 YK665+339 洞口水流量监测	左洞 ZK658+480 洞口水流量监测	左洞 ZK665+342 洞口水流量监测
水流量-温度相关系数	0.5175	0.4154	0.3044	0.4525

5.4 pH

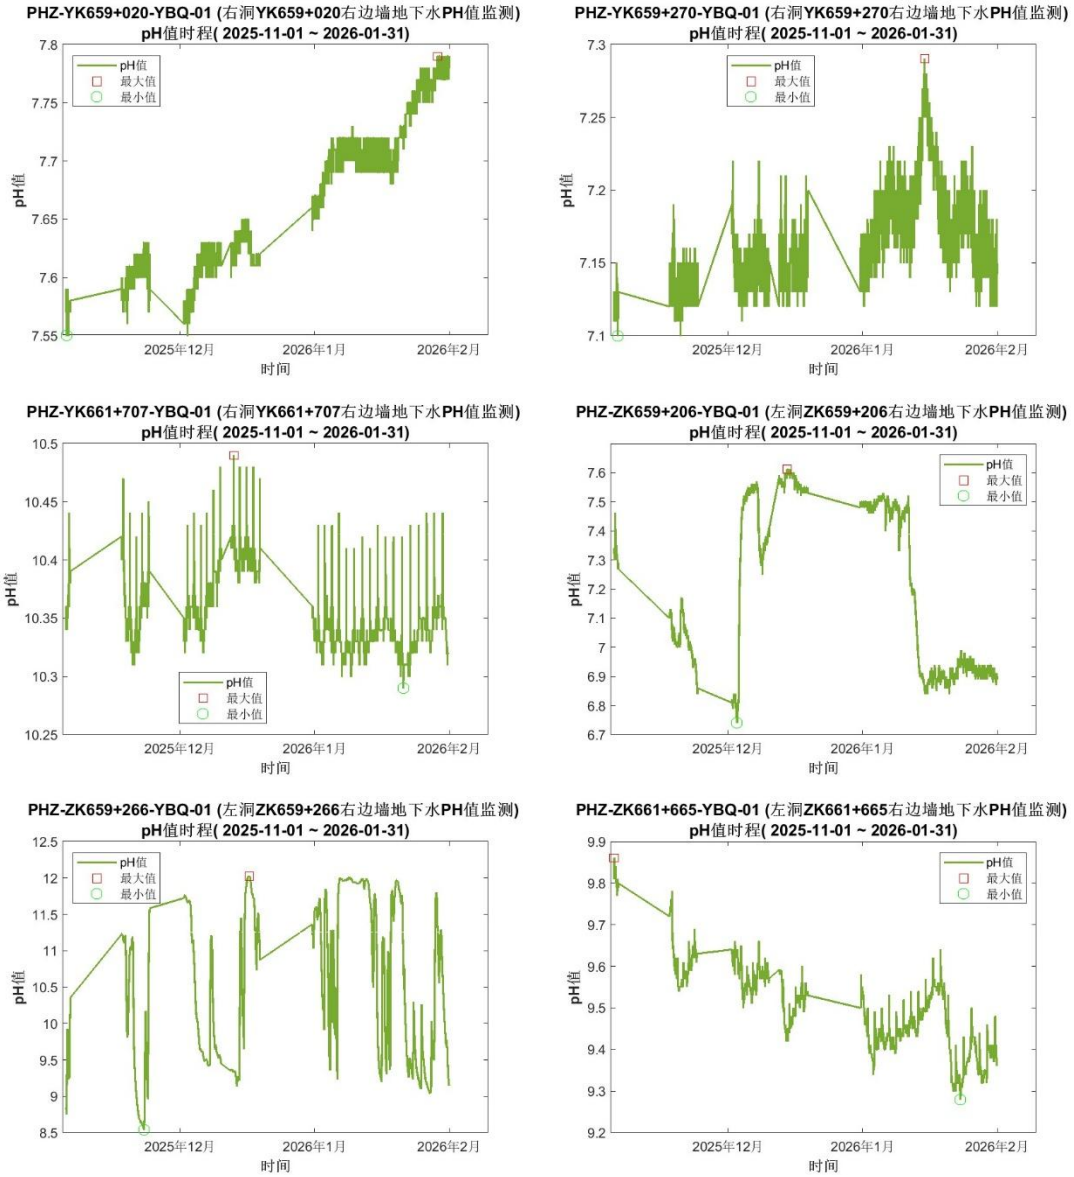

图 5.4-1 边墙地下水 pH 值分析图

表 5.4-1 边墙地下水 pH 值数据统计表

测点编号	测点名称	pH 最大值	pH 最小值	pH 极差	pH 均值	pH 标准差	pH 最大值时间	pH 最小值时间
PHZ-YK659+020-YBQ-01	右洞 YK659+020 右边墙地下水 PH 值监测	7.79	7.55	0.24	7.68	0.06	2026-01-29 06:03:03	2025-11-04 20:44:01
PHZ-YK659+270-YBQ-01	右洞 YK659+270 右边墙地下水 PH 值监测	7.29	7.1	0.19	7.17	0.03	2026-01-15 06:32:35	2025-11-05 14:14:03
PHZ-YK661+707-YBQ-01	右洞 YK661+707 右边墙地下水 PH 值监测	10.49	10.29	0.2	10.35	0.03	2025-12-13 06:13:30	2026-01-21 11:02:48
PHZ-ZK659+206-YBQ-01	左洞 ZK659+206 右边墙地下水 PH 值监测	7.61	6.74	0.87	7.2	0.28	2025-12-14 12:23:33	2025-12-03 00:27:53
PHZ-ZK659+266-YBQ-01	左洞 ZK659+266 右边墙地下水 PH 值监测	12.03	8.54	3.49	10.59	1.08	2025-12-16 19:50:52	2025-11-22 15:17:49
PHZ-ZK661+665-YBQ-01	左洞 ZK661+665 右边墙地下水 PH 值监测	9.86	9.28	0.58	9.49	0.1	2025-11-04 17:14:01	2026-01-23 13:12:52
